

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO (SEF)

RELATÓRIO TÉCNICO:

MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES – JULHO/14

USP LESTE
Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba
São Paulo/SP

Contrato nº 04/2014
Processo nº 14.1.229.82.8
Projeto Weber nº 311.1206.14-5MGS.VS.01
Julho/2014



WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

PROJETO 311.1206.14 SEF	Versão nº: 5MGS.VS.01 Data: 07/08/2014	Versão nº: Data:	Versão nº: Data:
----------------------------	---	---------------------	---------------------

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....	5
2.1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA	5
3. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO	6
4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	8
4.1. MEDIÇÃO NOS POÇOS DE MONITORAMENTO.....	8
4.2. INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE EXTRAÇÃO	34
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES.....	36
6. EQUIPE TÉCNICA	37
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	38

FIGURAS e FOTOS

FIGURA 2.1.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....	5
FIGURA 3.1 ESQUEMA DA FAIXA DE INFLAMABILIDADE DO METANO E SUA COMBUSTÃO	7
FIGURA 4.1.1 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS COM METANO (MAR/2014)	29
FIGURA 4.1.2 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS COM METANO (ABR/2014)	30
FIGURA 4.1.3 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS COM METANO (MAI/2014).....	31
FIGURA 4.1.4 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS COM METANO (JUN/2014).....	32
FIGURA 4.1.5 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS COM METANO (JUL/2014)	33

TABELAS e GRÁFICOS

TABELA 1.1 CRONOGRAMA DE AÇÕES PREVISTAS.....	4
TABELA 4.1.1 RELAÇÃO QUANTIDADE DE POÇOS X POÇOS EM CONCENTRAÇÃO IGUAL OU MAIOR QUE 75%LEL.....	9
GRÁFICOS DE POSIÇÃO EDIFÍCIOS I-1 E I-3	10
GRÁFICOS DE POSIÇÃO EDIFÍCIOS I-4 E CONJUNTO LABORATORIAL	11
GRÁFICOS DE POSIÇÃO BLOCO INICIAL E CAT	12
GRÁFICOS DE POSIÇÃO ENFERMARIA, INCUBADORA, LARANJINHA E GINÁSIO.....	13
GRÁFICOS DE TENDÊNCIA I-1 E I-3.....	14
GRÁFICOS DE TENDÊNCIA CONJUNTO LABORATORIAL.....	15
GRÁFICOS DE TENDÊNCIA BLOCO INICIAL	18
GRÁFICOS DE TENDÊNCIA I-4.....	20
GRÁFICOS DE TENDÊNCIA CAT 1	21
GRÁFICOS DE TENDÊNCIA INCUBADORA, ENFERMARIA, GINÁSIO E LARANJINHA	22
GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO I-1 E I-3.....	23
GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO CONJUNTO LABORATORIAL.....	24
GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO BLOCO INICIAL	26
GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO I-4 E CAT 1.....	27
GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO GINÁSIO, ENFERMARIA, INCUBADORA E LARANJINHA	28
TABELA 4.2.1 LOCALIZAÇÃO DOS EXAUSTORES MOBILIZADOS	35

ANEXOS

ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO
ANEXO II – TABELAS DE MEDIÇÕES DIÁRIAS MX6 (JUL/14)
ANEXO III – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS GEM 5000 (JUL/14)
ANEXO IV – TABELAS DE MEDIÇÕES NA INFRA-ESTRUTURA MX6 (JUL/14)
ANEXO V – ANOTAÇÕES DE RESTRIÇÃO DE FLUXO E PRESENÇA DE ÁGUA (ABR - JUN/14)
ANEXO VI – GRÁFICOS DE EVOLUÇÃO CH ₄ E PRESSÃO (ABR - JUL/14)

1. INTRODUÇÃO

A Weber Consultoria Ambiental Limitada foi consultada pela Universidade de São Paulo para apresentar uma proposta de plano de intervenção emergencial com base nas exigências contidas no último parecer da CETESB 006/2014/CA, de 24 de Janeiro de 2014 com o objetivo de afastar eventual risco em virtude da constatação de gás metano.

Sendo assim, foram definidas as seguintes etapas de ação durante um período de 180 dias:

- a) Implantação e Operação de Sistemas de Extração Emergencial nos drenos já existentes sob as edificações;
- b) Execução de Malha de medição de Gases em Solo (*Soil Gas*);
- c) Monitoramento de Intrusão de Gases em Ambientes Fechados;
- d) Instalação de Sistema de Extração e Tratamento de Metano;
- e) Consolidação dos Estudos Ambientais existentes.

O presente relatório técnico apresenta os serviços prévios de **Monitoramento de Intrusão de Gases em Ambientes Fechados (Jul/14)** na área do *Campus* Capital USP Leste, localizado na Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba, Município de São Paulo/SP.

O objetivo da etapa do Monitoramento Preventivo da Intrusão de Gases é a elaboração de um diagnóstico contínuo avaliando a situação das leituras nas edificações do *Campus* USP LESTE. Os resultados obtidos nesses trabalhos permitem estabelecer e monitorar a situação da área e indicar as sequências das etapas que deverão ser executadas.

Tal estudo é executado de acordo com a Proposta 311.1206.13 e Contrato nº004/2014. Os trabalhos foram realizados conforme a metodologia CETESB apresentada na “Decisão de Diretoria 103/2007 – CETESB”, bem como no “Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas” – (CETESB, 2001), além de demais normas e referências pertinentes.

Além disso, a Weber foi contratada também para a instalação de 07 sistemas de extração de gases no Módulo Inicial-Ciclo Básico (objeto de contrato específico nº 001/2014).

A **Tabela 1.1** apresenta o cronograma de ações previstas.

Tabela 1.1 Cronograma de ações previstas

Cronograma Físico							
311.1206.13 - SEF - USP Leste							
Ações	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE EXTRAÇÃO EMERGENCIAL							
02 Conjuntos no Edifício I1							
01 Conjunto no Auditório							
01 Conjunto na Administração							
03 Conjuntos no Laboratório							
01 Conjunto na Central de Serviços I-4							
01 Conjunto na Enfermaria							
01 Conjunto na Portaria 2							
01 Conjunto na Portaria 3 (Estação Trem)							
01 Conjunto no Grupo de Pesquisas							
01 Conjunto no CAT							
01 Conjunto no Serviço de Transporte							
01 Conjunto na base da Guarda Universitária							
01 Conjunto no Ginásio							
MALHA DE MEDIÇÃO DE VAPORES EM SOLO (Soil gas)							
Medição de gases em 650 pontos (0,5" x 0,9m) na área de 260.000,m ² numa malha com espaçamento de 20x20m.							
MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES							
Campanhas diárias de monitoramento de intrusão de gases em 117 poços de gases							
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE METANO							
01 Conjunto no Edifício I1							
CONSOLIDAÇÃO ESTUDOS AMBIENTAIS							
Elaboração de Modelo Conceitual Atualizado							
Recomendações							
INSTALAÇÃO SISTEMAS DE EXTRAÇÃO CICLO BÁSICO							
7 Sistemas (contrato específico)							

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA

A área objeto de estudo está inserida no Município de São Paulo/SP na Zona Leste, Subprefeitura da Penha, bairro Vila Guaraciaba, registrada na Rua Armando Bettio, 1000. Existem três portarias principais, a P1 situada na Rodovia Parque (na margem da Rodovia Ayrton Senna), a P2 situada na Rua Arlindo Bettio e a P3 na Estação da CPTM USP Leste.

A **Figura 2.1.1** Indica a localização da área.

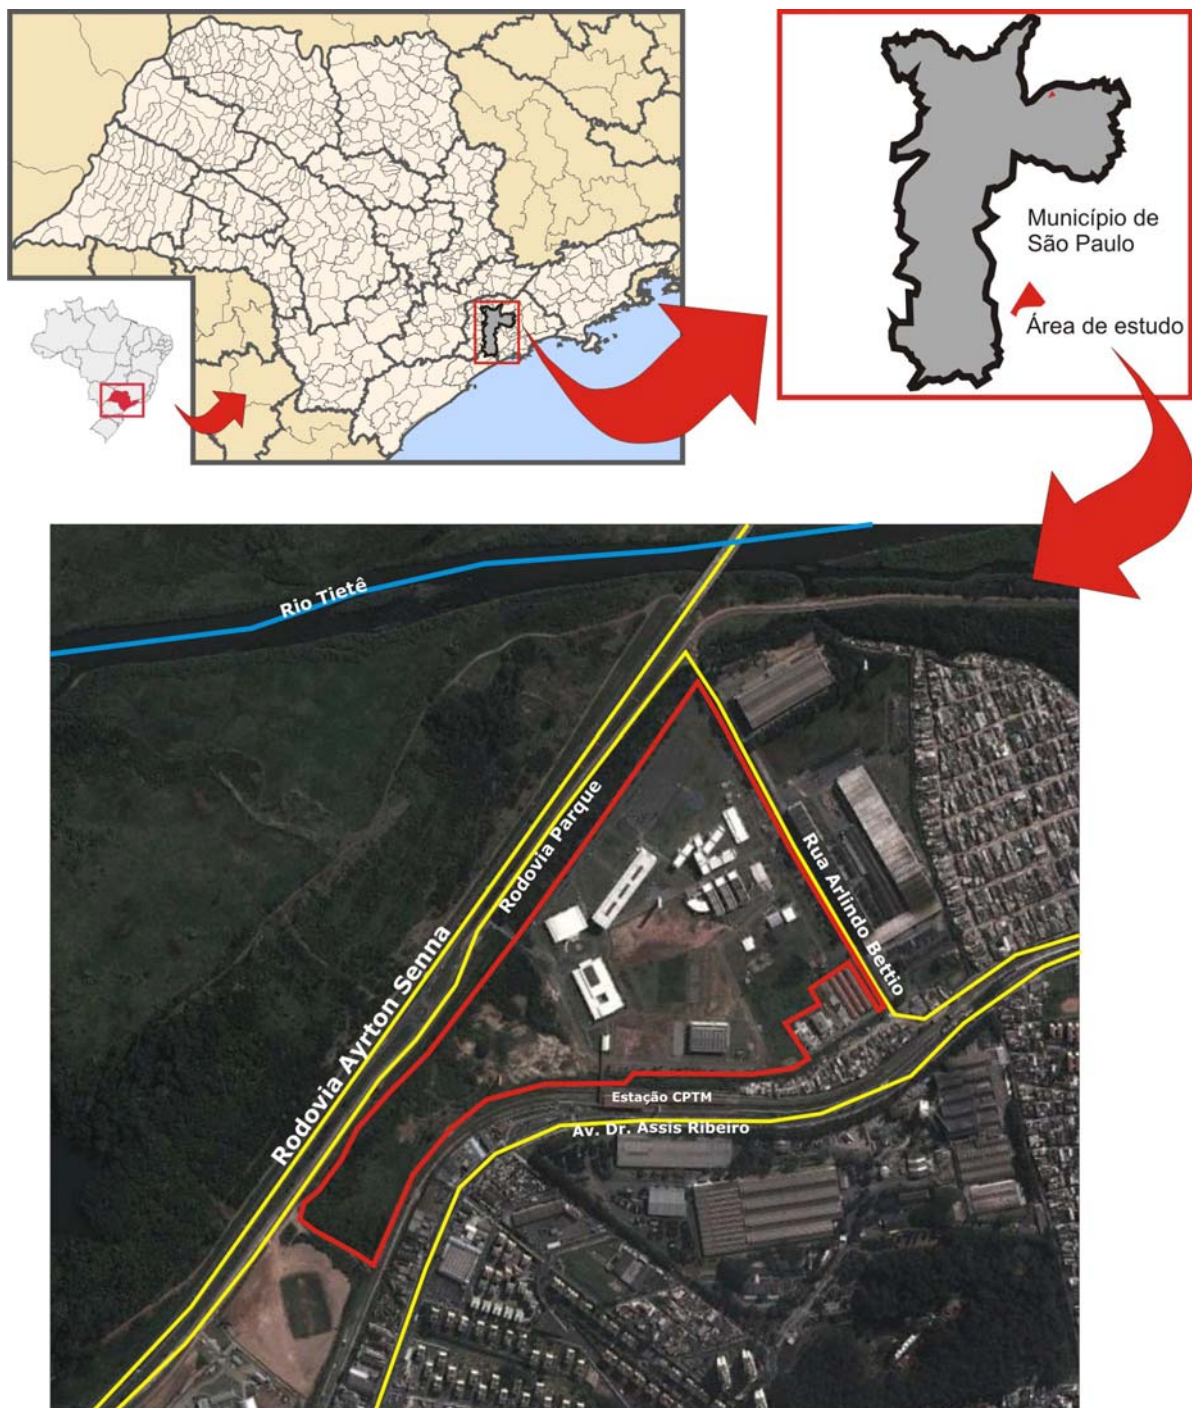


Figura 2.1.1 Localização da área de estudo
Fonte: Adaptado de Google Earth, 2012.

3. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO

As leituras em campo foram realizadas diariamente por meio de equipamentos da marca Industrial Scientific, modelo *MX6 iBrid*, para gás Metano (CH_4 em %LEL) e compostos orgânicos voláteis (VOC em ppm), bem como semanalmente com o equipamento da marca Landtec, modelo *GEM 5000*, para Metano, Oxigênio, Dióxido de Carbono (CH_4 , O_2 , CO_2 em %Volume), pressão (mbar), Sulfeto de Hidrogênio e Monóxido de Carbono (H_2S , CO em ppm). No **Anexo I** apresentam-se os certificados de calibração dos equipamentos utilizados.

O MX6 iBrid é um instrumento portátil utilizado em avaliações de passivos para detectar compostos voláteis. Ele é composto de um sensor PID para medição de VOC em PPM e de um sensor catalítico para medição de *LEL* (Low Explosivity Level ou Limite Inferior de Inflamabilidade-LII) de Gás Metano (CH_4) em porcentagem.

O GEM 5000 é um equipamento portátil especificamente utilizado para monitoramento da migração de gases (por exemplo, em aterros). Ele é composto de célula infravermelha de comprimento de onda duplo com canal de referência para leitura de Metano e Dióxido de Carbono e de célula eletroquímica para medição de Oxigênio, Monóxido de Carbono e Sulfeto de Hidrogênio.

O Metano nº CAS 74-82-8 é um gás inflamável, comumente encontrado em material orgânico devido à presença de bactérias decompositoras, apresenta faixa de inflamabilidade entre 5% a 15%, isto é, concentrações do gás/vapor que em contato com o ar forma uma mistura inflamável na presença de uma fonte de ignição (mistura ideal). As concentrações abaixo ou acima dessa faixa não propagam chama, uma vez, que a quantidade de gás/vapor é muito pequena (mistura pobre) ou muito elevada (mistura rica) para queimar ou explodir, conforme descrito no manual de produtos químicos (CETESB, 2003).

As medições executadas com os equipamentos MX6 foram ajustadas para leitura em %LEL visando avaliar de forma quantitativa o risco de explosividade, sendo assim, a interpretação desses dados será baseada em 100% de LEL (ou seja, 5% de volume). Já as medições com o equipamento GEM 5000 foram realizadas em %Volume, permitindo quantificar a presença de metano, além do início da faixa de inflamabilidade.

Para que ocorra a inflamabilidade, seria necessária a concentração do gás, em sua mistura ideal com oxigênio em um ambiente confinado, e um meio de ignição. Observou-se em vistoria que, em geral, o perfil construtivo das edificações apresenta ventilação fixa, o que dificulta o acúmulo do gás nesses ambientes. A **Figura 3.1** ilustra a faixa de inflamabilidade do Gás Metano, bem como a faixa de medição do equipamento utilizado, e o esquema de combustão.

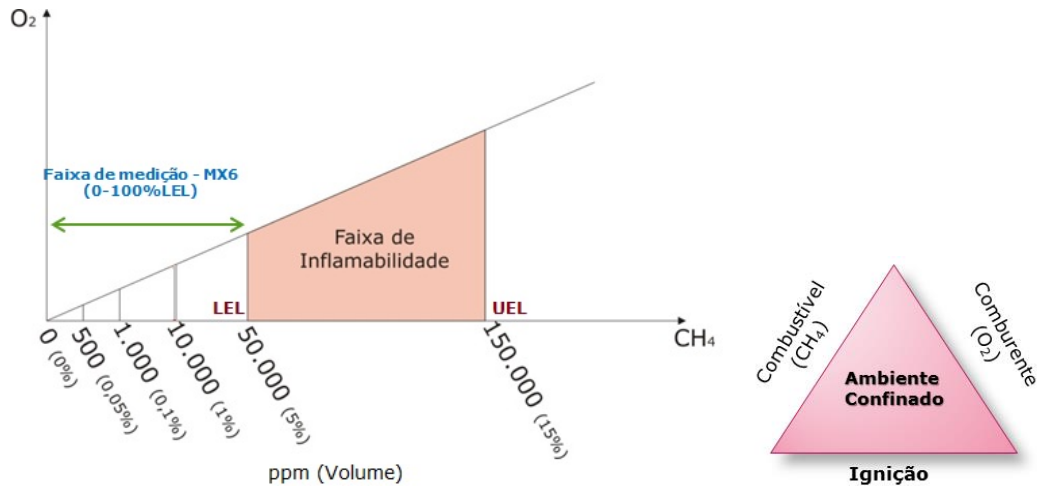


Figura 3.1 Esquema da faixa de inflamabilidade do metano e sua combustão

As leituras de campo no *Campus* USP Leste serão realizadas diariamente (dias úteis) nos 115 poços de monitoramento de gases previamente instalados pela empresa Servmar Ambiental distribuídos nos Edifícios I-1 (Titanic), I-3 (Auditórios e Biblioteca), I-4 (Serviços), Conjunto Laboratorial, Bloco Inicial (Conjunto Didático), Enfermaria, CAT, Incubadora e Ginásio (havia 3 poços instalados no Edifício Laranja, no entanto este foi demolido).

Os poços de monitoramento existentes apresentam-se aos pares em profundidades distintas (A: aprox. 0,30m e B: aprox. 1,00m). Além dos poços de monitoramento, foi realizado o levantamento dos ralos, tomadas e grelhas, a fim de incluí-los nas medições e assim avaliar a intrusão dos gases nas construções. E definiu-se o monitoramento em ralo e caixas de passagem numerados e cadastrados em cada prédio.

As tomadas não tem contato direto com o solo. Durante a construção dos edifícios a presença de gás foi detectada e por isso, como forma de prevenção, o sistema elétrico foi instalado em tubulações aéreas, chegando às salas via canaletas.

O nível d'água no local apresenta-se raso, muitas vezes cobrindo os poços com profundidade de 1,0m e algumas vezes os de 0,30m, impedindo assim a medição nesses pontos. Nos pontos que se detectou a presença de água, foi realizada a retirada da mesma com a utilização de uma bomba peristáltica, promovendo-se posteriormente a isto as medições nesses poços. Além disso, alguns poços por vezes entopem, não permitindo o fluxo da bomba do equipamento de medição.

O monitoramento realizado com o equipamento GEM 5000 foi priorizado naqueles poços que rotineiramente costumam apresentar concentrações de metano, em dias em que houve a instalação de sistemas de extração, priorizando esta atividade. Na semana em que houve a vistoria da CETESB, as medições não foram realizadas por parte da Weber, para que houve as medições do órgão.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

4.1. MEDIÇÃO NOS POÇOS DE MONITORAMENTO

Os serviços de monitoramento de gases foram executados entre os dias 24 de Junho e 25 de Julho de 2014.

As medições realizadas nesse período indicaram que as concentrações acima de 100%LEL, estão localizadas em pontos específicos, e não abrangem toda a extensão dos edifícios, além de estarem localizadas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m), não alcançando os poços subslab, imediatamente abaixo das edificações (0,30m), exceto o PMG-95A situado no CAT.

Com as medidas de metano em %Volume, também se observa o mesmo comportamento, ou seja, as concentrações se apresentam nos poços mais profundos. Nessas medições é possível quantificar a concentração de metano naqueles poços que apresentam valores acima de 100%LEL.

Quanto às medições de VOC, H₂S e CO, não foram detectadas concentrações significativas em nenhum dos poços monitorados, sendo de até 2,0ppm, 4ppm e 8ppm, respectivamente.

Além das medições em poços de monitoramento foi realizada medições em ralos e caixas de passagem em todas as edificações. Não foi encontrada nenhuma concentração de metano nesses pontos e observou-se concentrações muito pequenas de VOC até 1,3ppm.

Sobre as medidas de pressão, os valores entre -0,2 a 0,2 mbar são considerados com a faixa de variação do equipamento. Foi observada pressão em alguns poços de monitoramento, positiva de até 0,31mbar e negativa de até -17,53mbar.

De forma a facilitar a visualização dos resultados obtidos, foram destacados os poços que apresentaram pelo menos uma vez concentração de metano igual ou maior a 75%LEL e/ou 5% em volume. Os dados serão apresentados em tabelas e em gráficos.

Sendo assim, a **Tabela 4.1.1** apresenta a relação entre a quantidade de poços em cada edifício, com os poços que apresentaram concentração, pelo menos uma vez de 75%LEL ou maior e na sequência os gráficos ilustram as informações sobre cada prédio.

Nos **Anexos II, III e IV** seguem as planilhas de monitoramento individual e diário/semanal em cada poço de monitoramento e na Infra-estrutura. No **Anexo V** apresentam-se as anotações de restrição de fluxo e presença de água em poços de monitoramento de gases entre os meses de Abril a Junho, as anotações de Julho apresentam-se no Anexo III.

No **Anexo VI** apresentam-se os gráficos de evolução semanal de CH₄ e Pressão de Abril a Julho.

As **Figuras 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5** apresentam croquis com a localização dos poços com concentração maior ou igual a 75%LEL em Março, Abril, Maio, Junho e Julho, respectivamente.

Tabela 4.1.1 Relação Quantidade de poços x Poços em concentração igual ou maior que 75%LEL


Distribuição dos Gases nos Edifícios			
311.1206.13/4MGS - SEF - USP Leste - Jul/2014			
EDIFÍCIO	Total de Poços	Poços >75%LEL	Posição
I-1	17 pares	2	PMG-11 Profunda (1,0m)
			PMG-114 Profunda (1,0m)
I-3	21 pares	Nenhum	-
I-4	12 pares	2	PMG-64 Profunda (1,0m)
			PMG-66 Profunda (1,0m)
Conjunto Laboratorial	17 pares	12	PMG-48 Profunda (1,0m)
			PMG-49 Profunda (1,0m)
			PMG-50 Profunda (1,0m)
			PMG-51 Profunda (1,0m)
			PMG-53 Profunda (1,0m)
			PMG-54 Profunda (1,0m)
			PMG-55 Profunda (1,0m)
			PMG-57 Profunda (1,0m)
			PMG-59 Profunda (1,0m)
			PMG-60 Profunda (1,0m)
			PMG-61 Profunda (1,0m)
Bloco Inicial	14 pares	8	PMG-01 Profunda (1,0m)
			PMG-02 Profundo (1,0m)
			PMG-03 Profundo (1,0m)
			PMG-05 Profundo (1,0m)
			PMG-06 Profundo (1,0m)
			PMG-08 Profundo (1,0m)
			PMG-09 Profundo (1,0m)
			PMG-85 Profundo (1,0m)
CAT	7 pares	2	PMG-95 Raso (1,0m)
			PMG-97 Profunda (1,0m)
Enfermaria	7 pares	Nenhum	-
Incubadora	6 pares	Nenhum	-
Ginásio	11 pares	Nenhum	-
Laranjinha	3 pares	Prédio Demolido	

Fonte: Trabalhos em Campo – Weber, Jul/2014

EDIFÍCIO I-1

Referência:	I-1 Parte 1 e I-1 Parte 2	
Quantidade total de Poços:	17 Pares	9 Parte 1 8 Parte 2
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	2	PMG-11 PMG-114

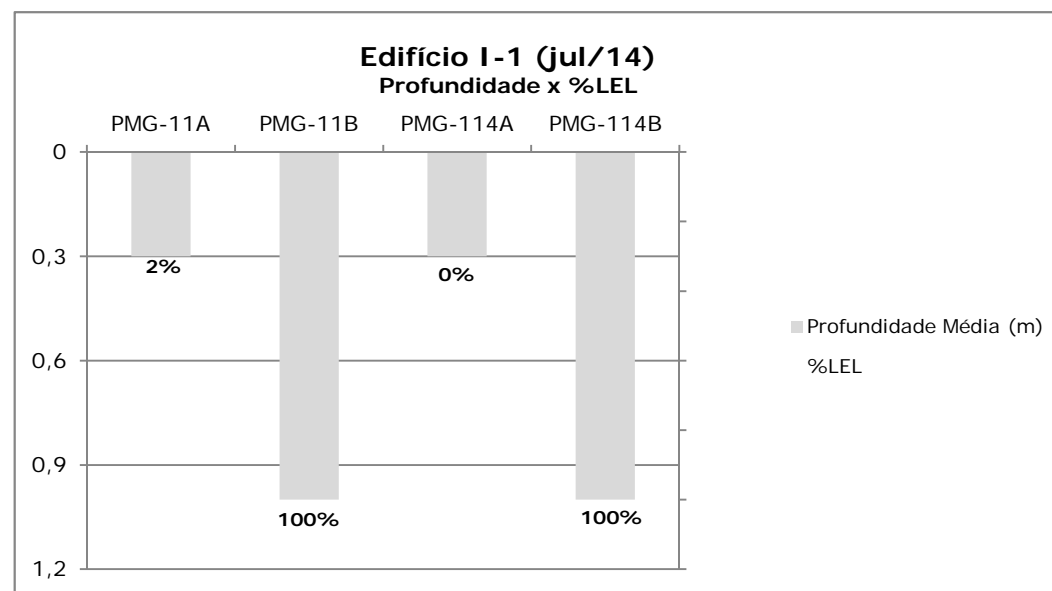Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)




EDIFÍCIO I-3

Referência:	Auditórios e Biblioteca	
Quantidade total de Poços:	21 Pares	7 Auditórios 14 Biblioteca
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	0	

Observações: Nenhum poço apresentou concentração de igual ou acima de 75%LEL em Jul/14


EDIFÍCIO I-4

Referência:	Serviços	
Quantidade total de Poços:	12 Pares	
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	2	PMG-64 PMG-66
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)	

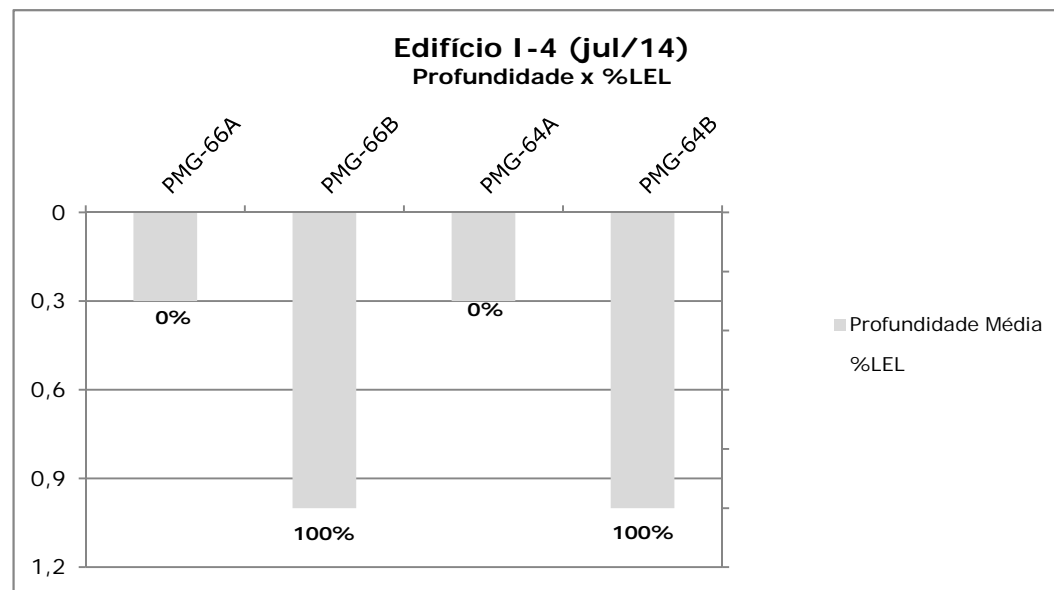


Conjunto Laboratorial

Referência:	Laboratórios	
Quantidade total de Poços:	17 Pares	
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	12 Pares	PMG-48 PMG-55 PMG-49 PMG-57 PMG-50 PMG-59 PMG-51 PMG-60 PMG-53 PMG-61 PMG-54 PMG-62
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)	

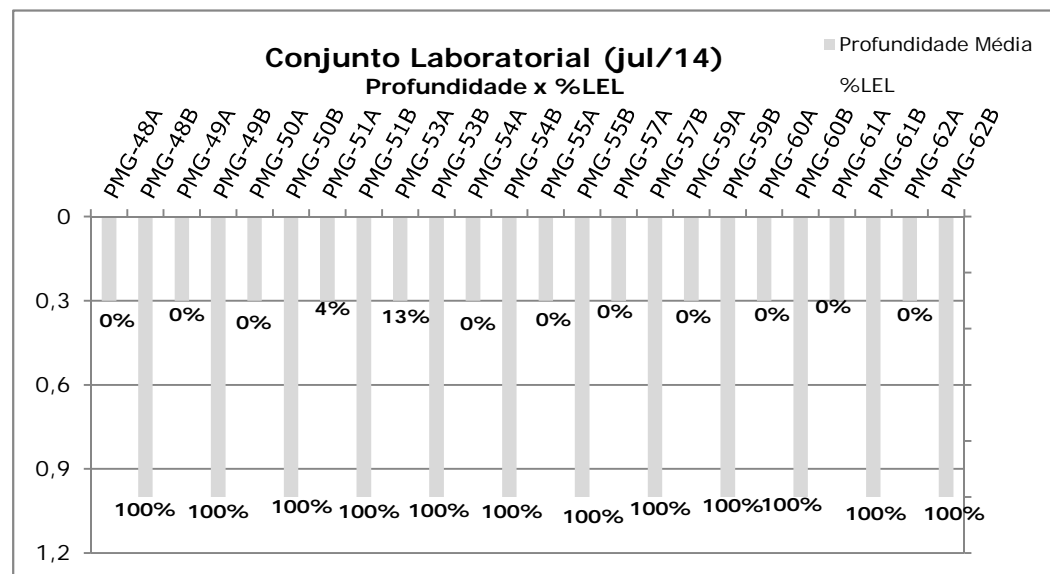


Bloco Inicial

Referência:	Conjunto Didático									
Quantidade total de Poços:	14 Pares									
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	8 Pares	<table border="0"> <tr><td>PMG-01</td><td>PMG-06</td></tr> <tr><td>PMG-02</td><td>PMG-08</td></tr> <tr><td>PMG-03</td><td>PMG-09</td></tr> <tr><td>PMG-05</td><td>PMG-85</td></tr> </table>	PMG-01	PMG-06	PMG-02	PMG-08	PMG-03	PMG-09	PMG-05	PMG-85
PMG-01	PMG-06									
PMG-02	PMG-08									
PMG-03	PMG-09									
PMG-05	PMG-85									
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)									

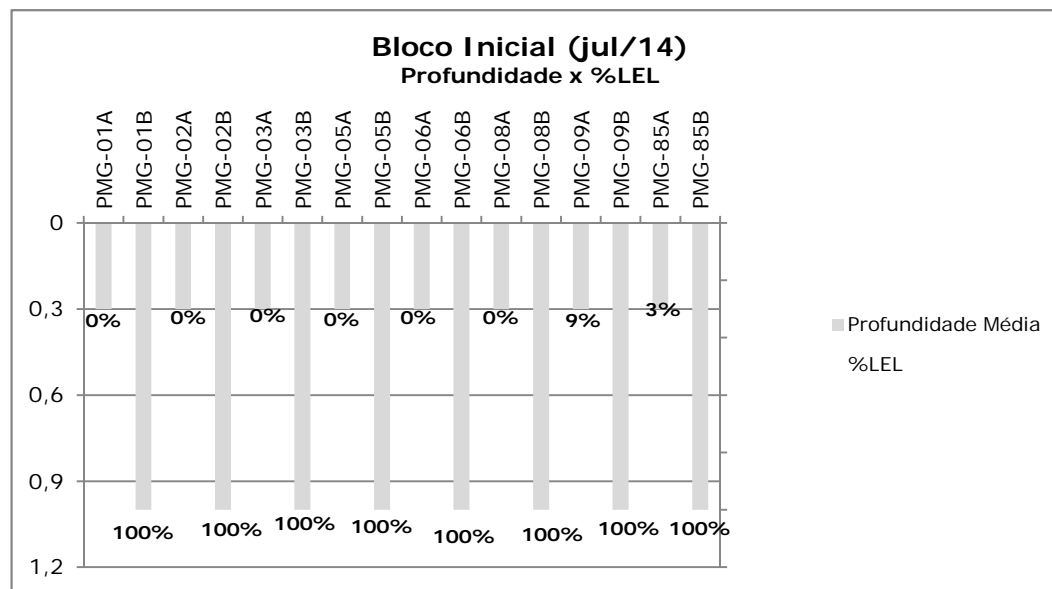

CAT

Referência:	CAT			
Quantidade total de Poços:	07 Pares			
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	2	<table border="0"> <tr><td>PMG-95</td></tr> <tr><td>PMG-97</td></tr> </table>	PMG-95	PMG-97
PMG-95				
PMG-97				
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)			

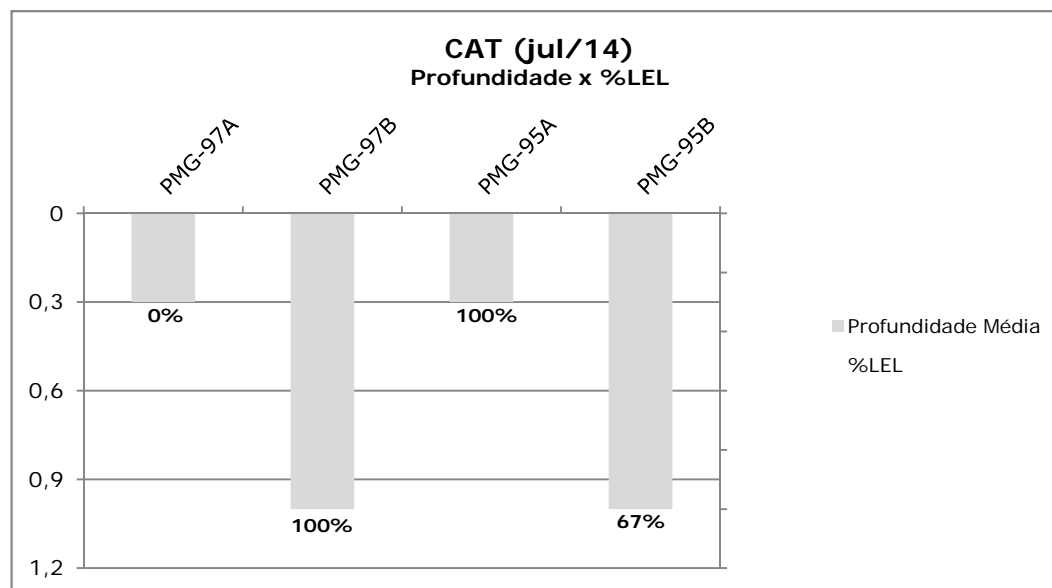

Enfermaria

Referência:	Enfermaria
Quantidade total de Poços:	7 Pares
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	0

Observações: Nenhum poço apresentou concentração de igual ou acima de 75%LEL em Jul/14

Ginásio Poliesportivo

Referência:	Ginásio
Quantidade total de Poços:	11 Pares
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	0

Observações: Nenhum poço apresentou concentração de igual ou acima de 75%LEL em Jul/14

Incubadora

Referência:	Incubadora
Quantidade total de Poços:	6 Pares
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	0

Observações: Nenhum poço apresentou concentração de igual ou acima de 75%LEL em Jul/14

Laranjinha

Referência:	Jaranjinha
Quantidade total de Poços:	3 Pares
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	x

Observações: Prédio Demolido



EDIFÍCIO I-1

Quantidade total de Poços: 17 Pares sendo 9 na Parte 1 e 8 na Parte 2

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75%LEL: 2 Pares
 PMG-114 Parte 1
 PMG-11 Parte 2

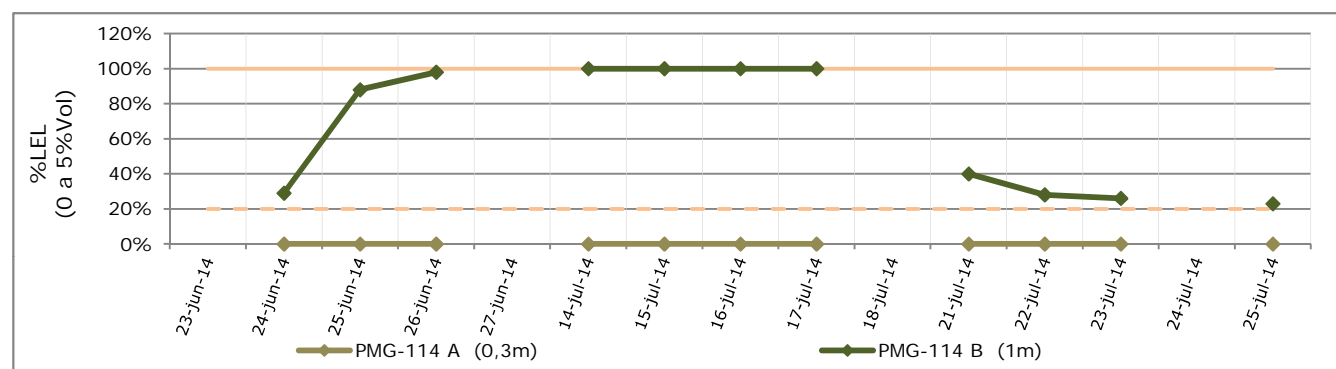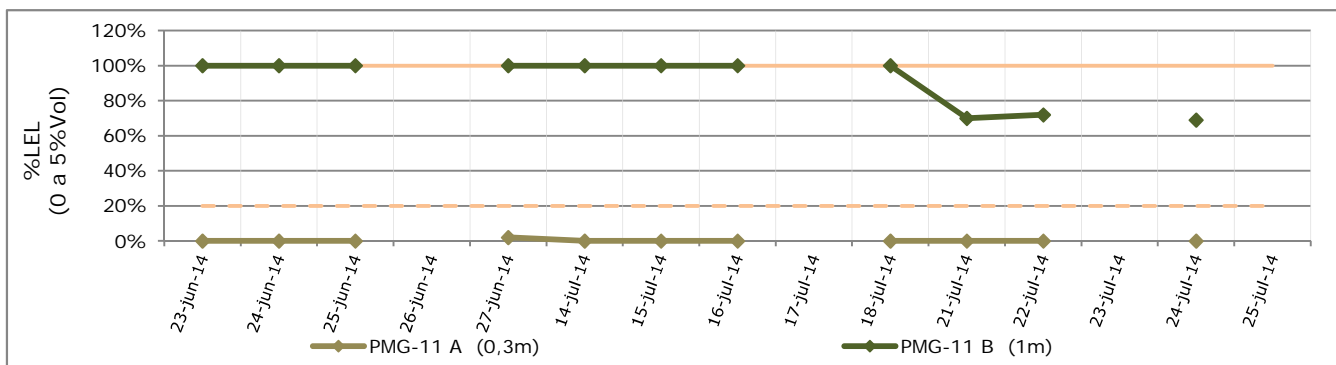Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



EDIFÍCIO I-3

Quantidade total de Poços: 21 Pares sendo 7 nos Auditórios e 14 na Biblioteca

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75%LEL: 0

CONJUNTO LABORATORIAL





Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75%LEL: 12 Pares

PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61
PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62

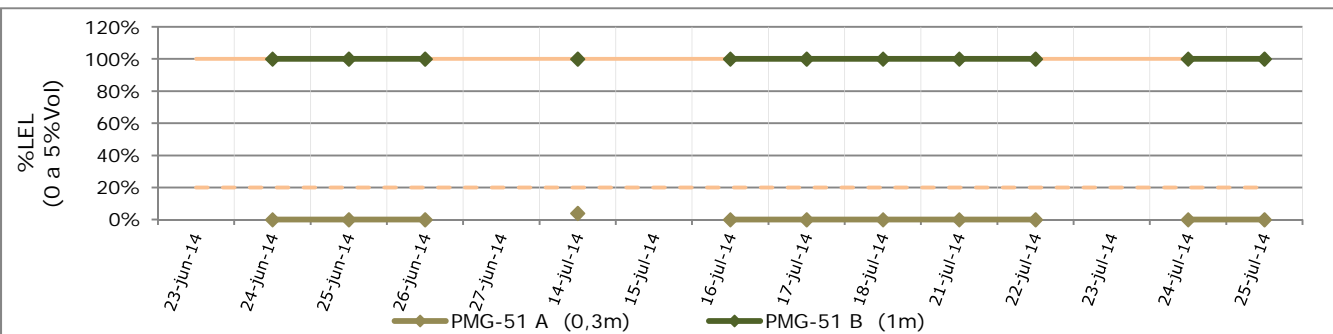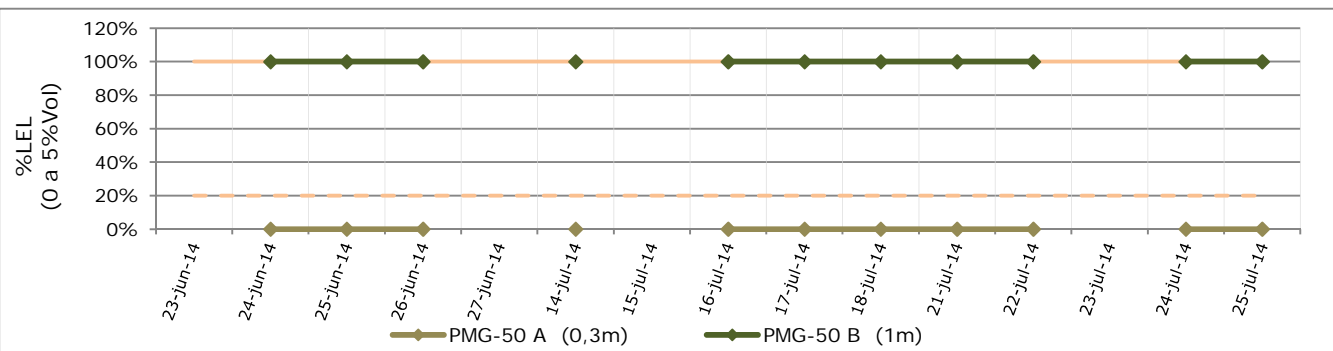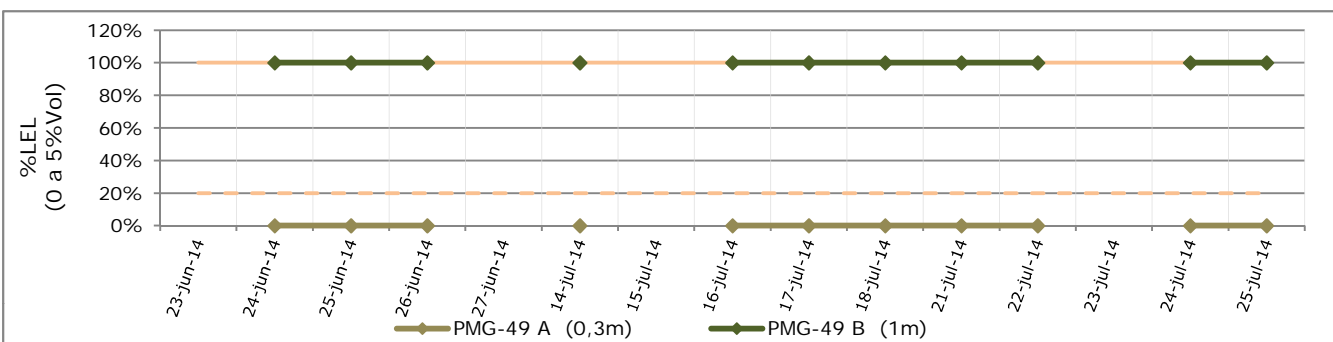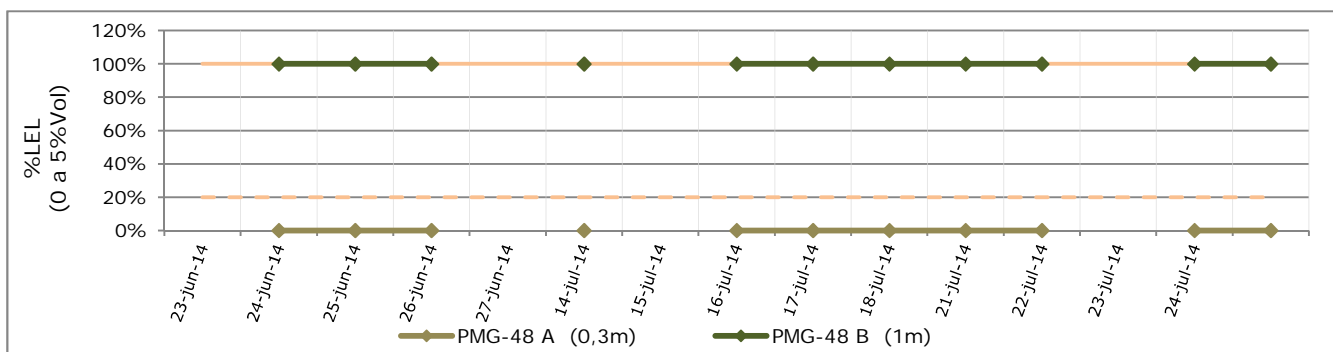Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



CONJUNTO LABORATORIAL





Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75%LEL: 12 Pares

PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61
PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62

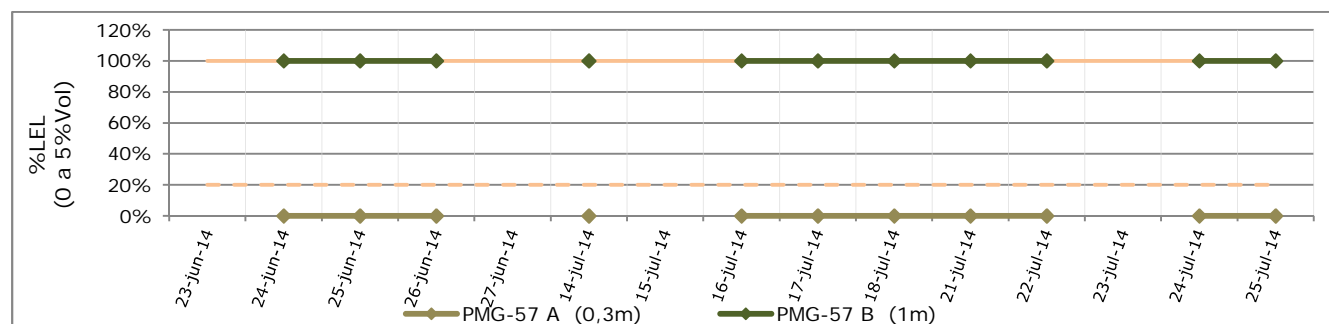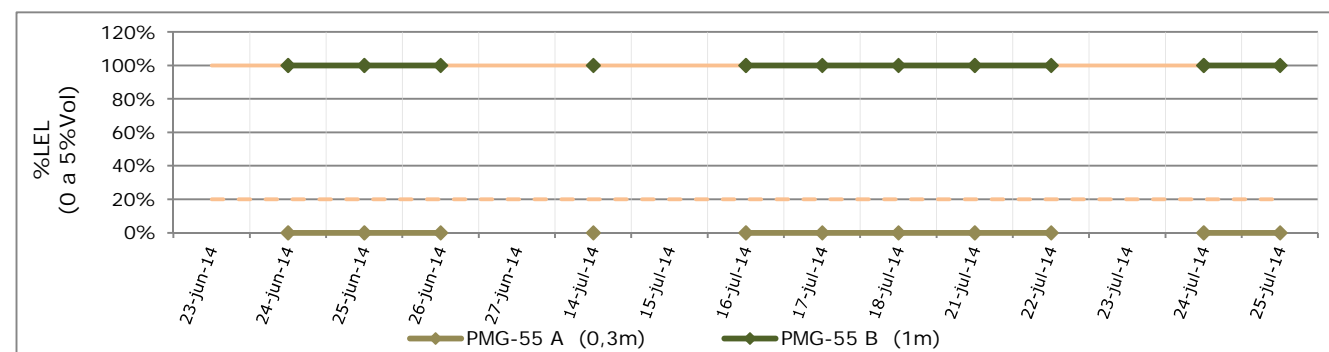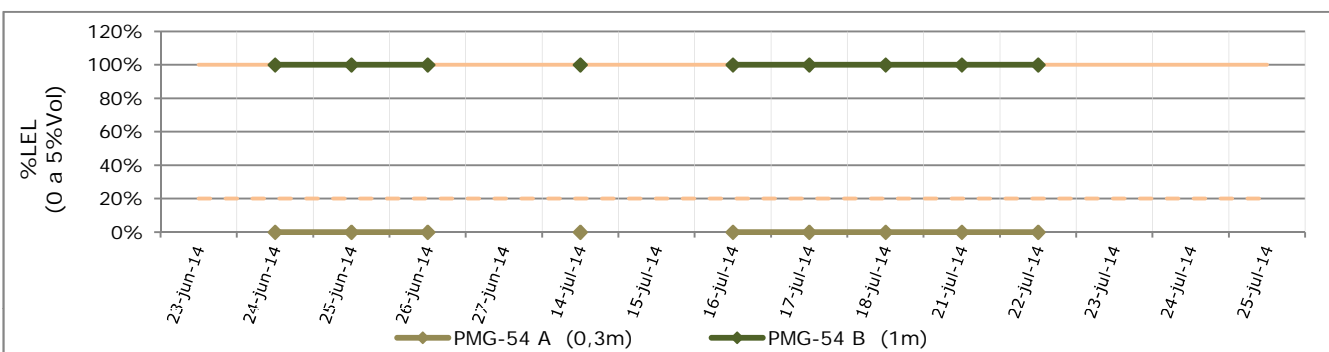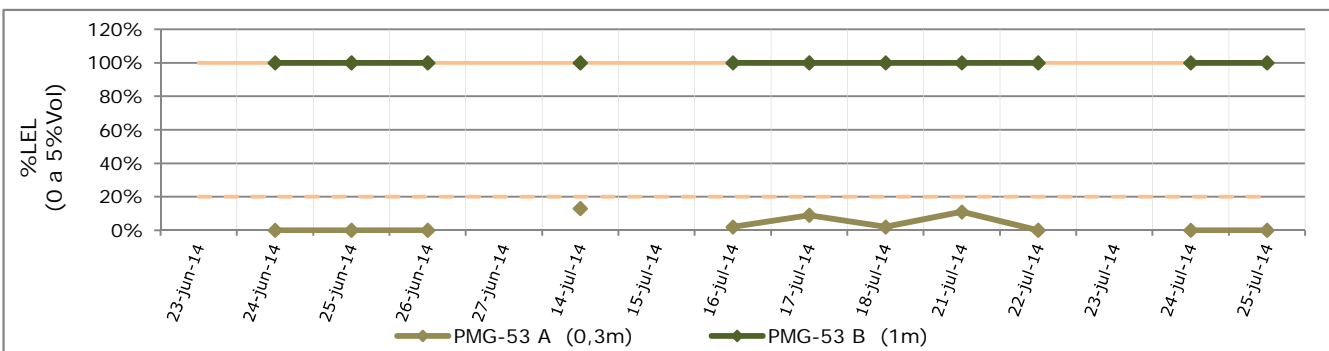Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



CONJUNTO LABORATORIAL





Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75%LEL: 12 Pares

PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61
PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62

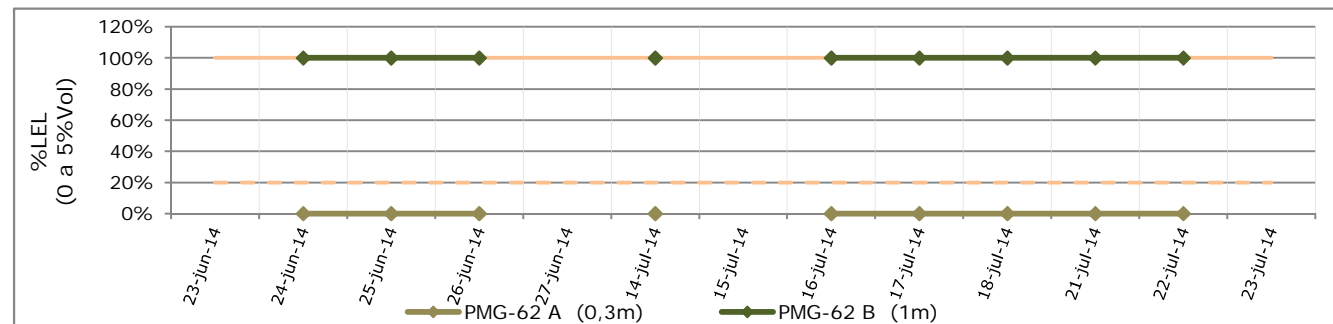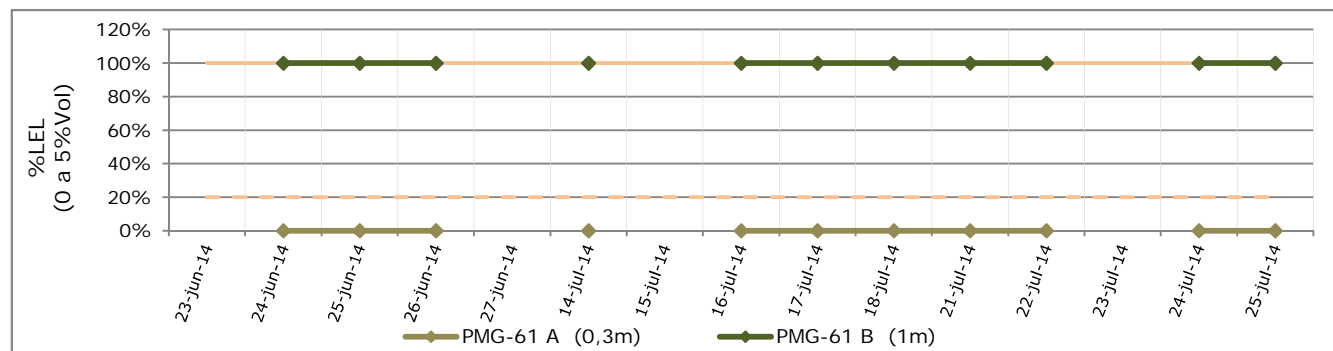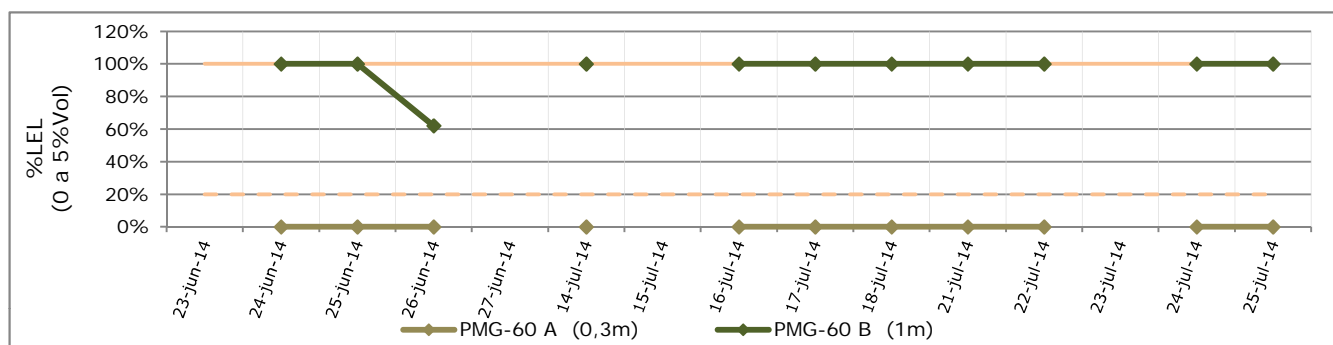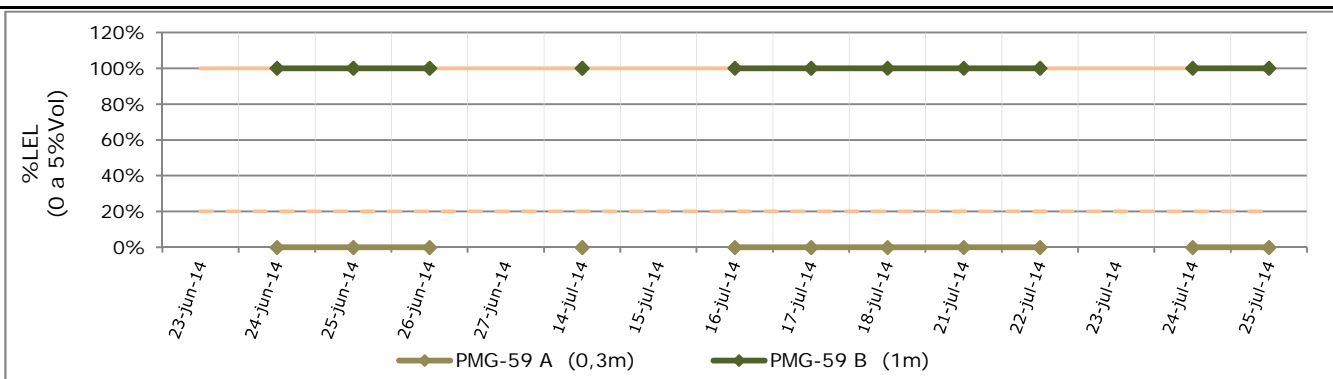Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

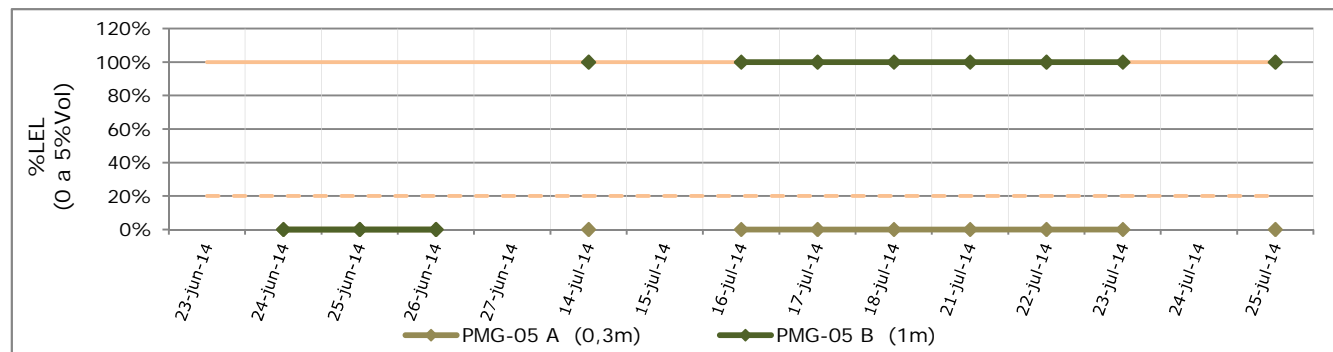
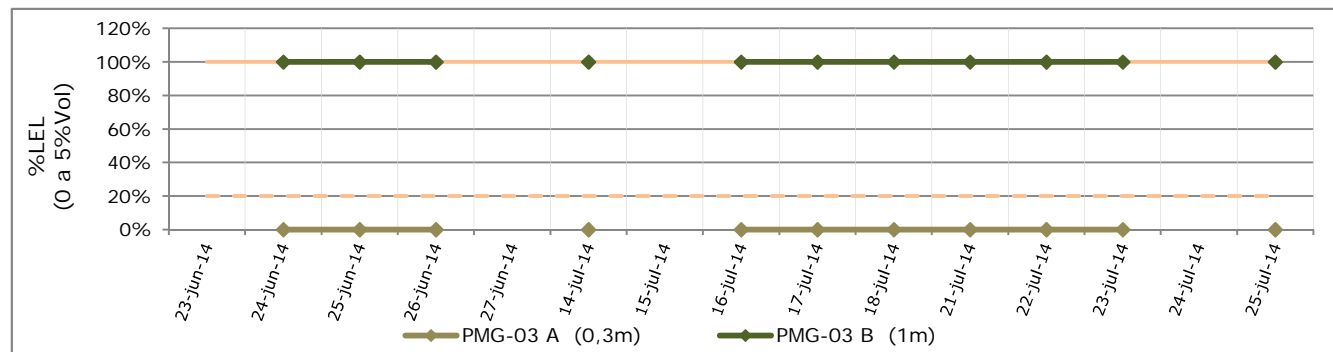
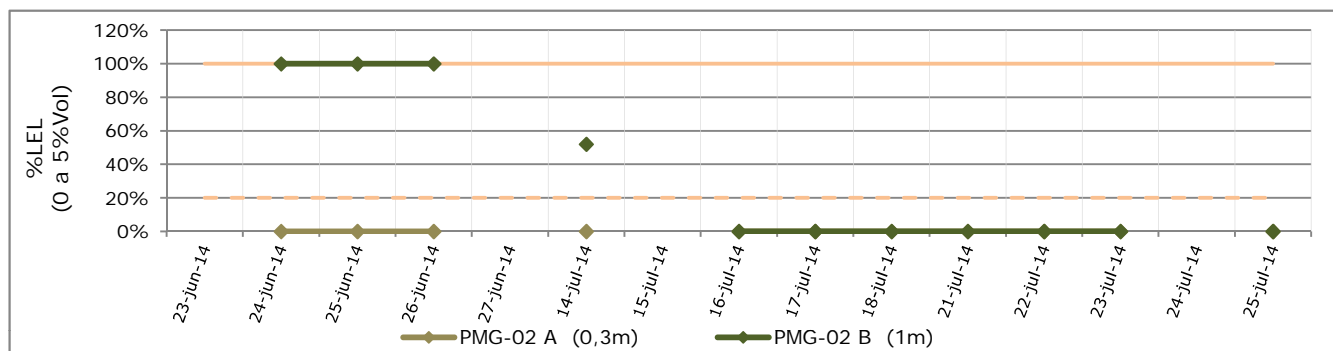
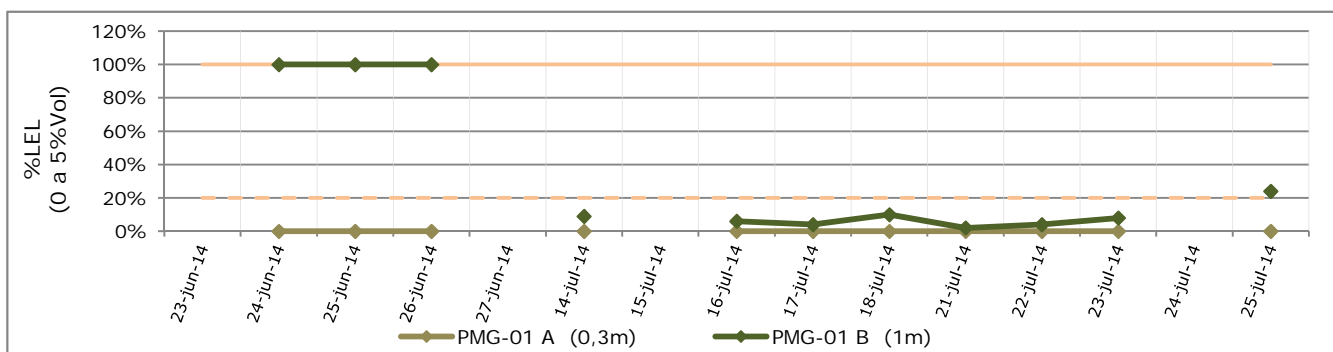
Quantidade total de Poços: 14 Pares

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75%LEL: 8 Pares

PMG-01 PMG-03 PMG-06 PMG-09
PMG-02 PMG-05 PMG-08 PMG-85

Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)





Quantidade total de Poços: 14 Pares

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75%LEL: 8 Pares

PMG-01	PMG-03	PMG-06	PMG-09
PMG-02	PMG-05	PMG-08	PMG-85

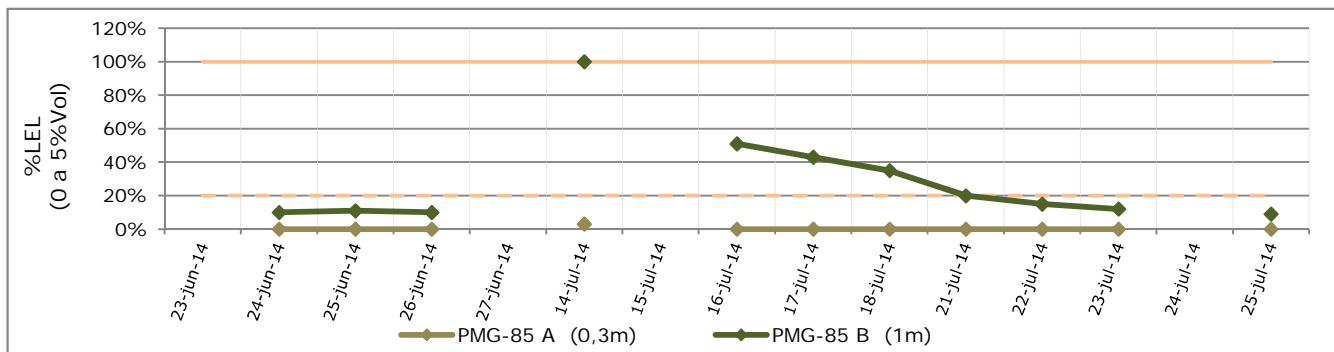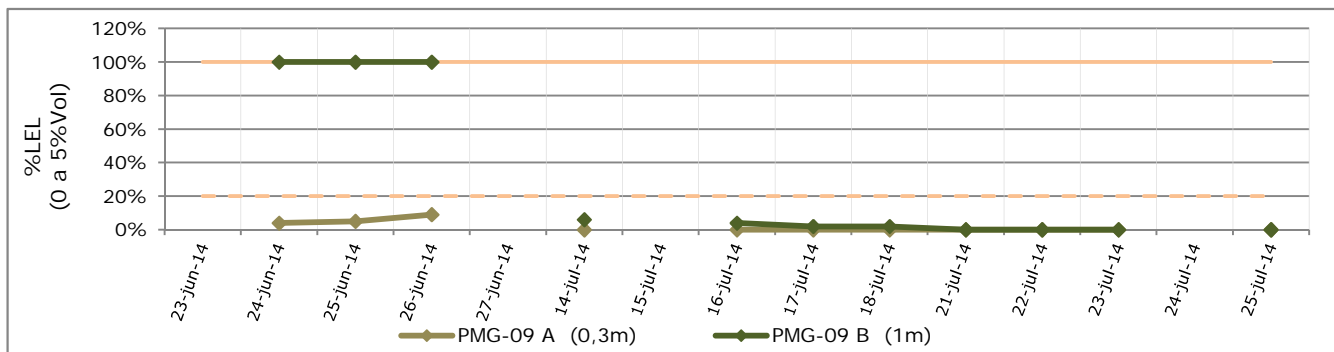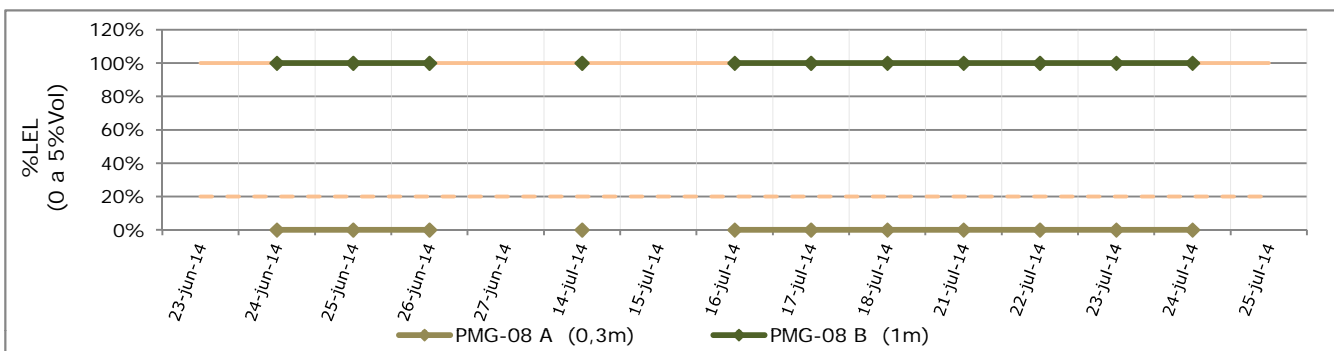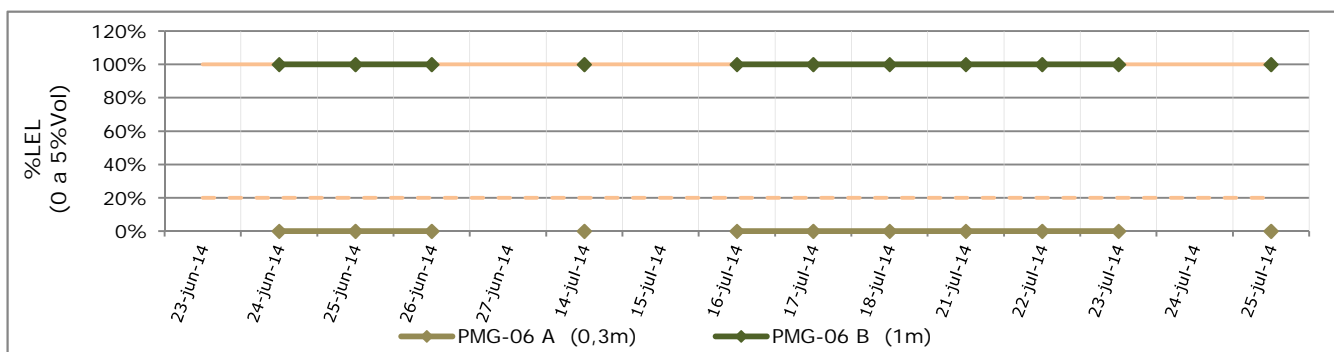Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)





EDIFÍCIO I-4

Quantidade total de Poços: 12 Pares

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75%LEL: 2 Pares
 PMG-66
 PMG-64

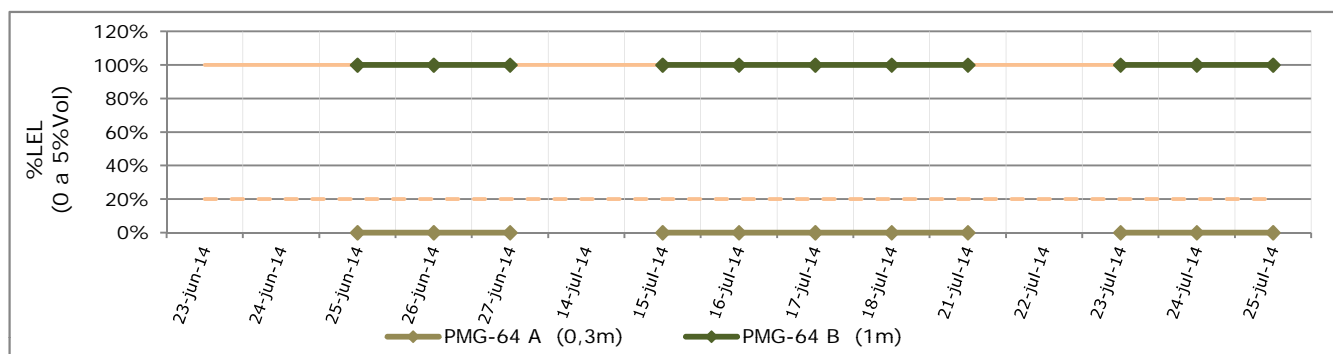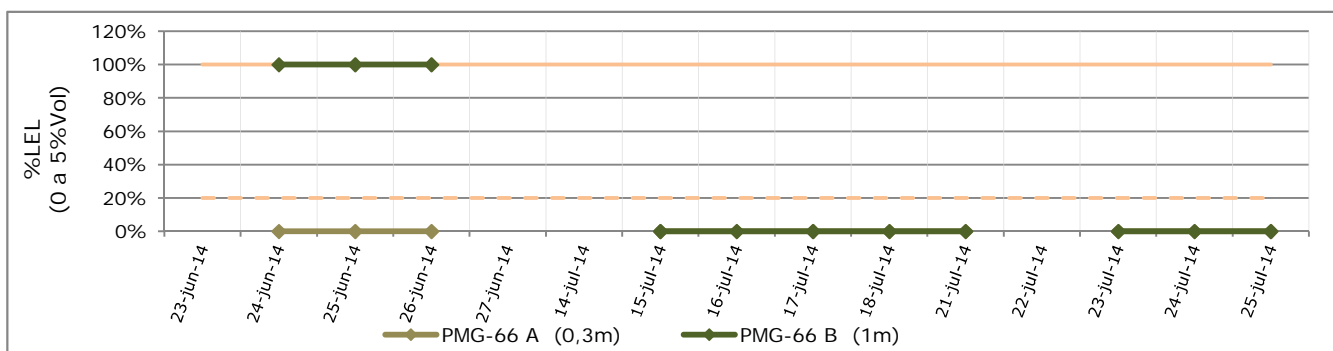Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)





CAT 1

Quantidade total de Poços: 7 Pares

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou acima 75%LEL: 2 Pares
 PMG-95
 PMG-97

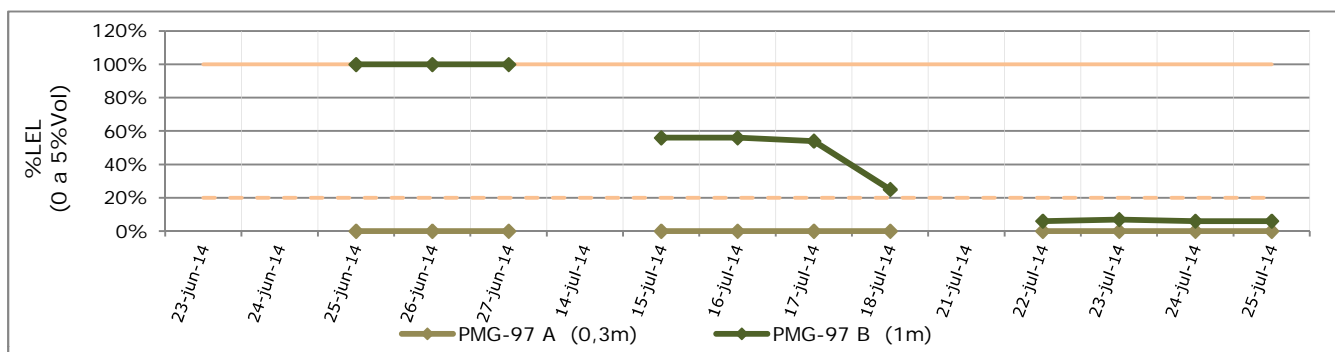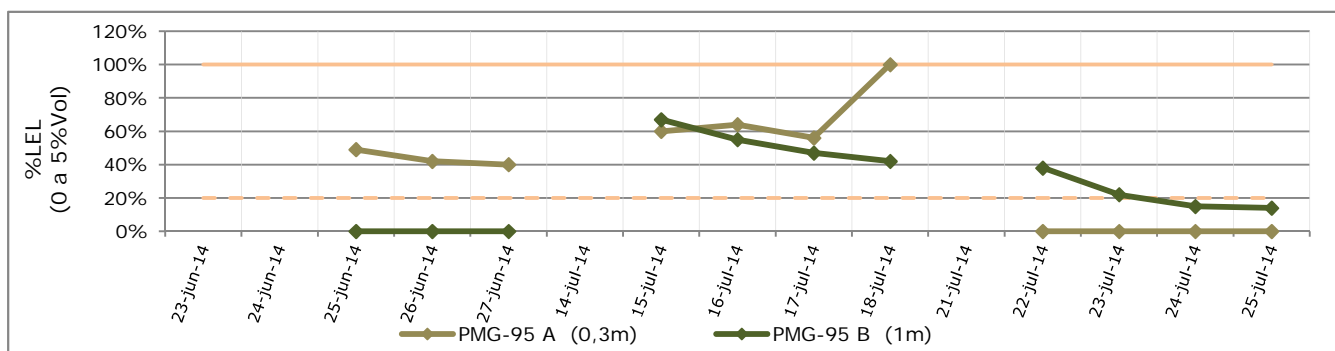Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



INCUBADORA (CAT 2)	
Quantidade total de Poços:	6 Pares
Período de Medição:	23 de junho a 25 de Julho de 2014
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	0

ENFERMARIA	
Quantidade total de Poços:	7 Pares
Período de Medição:	23 de junho a 25 de Julho de 2014
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	0

GINÁSIO POLIESPORTIVO	
Quantidade total de Poços:	11 Pares
Período de Medição:	23 de junho a 25 de Julho de 2014
Pares com concentração igual ou acima 75%LEL:	0

LARANJINHA	
Quantidade total de Poços:	3 Pares
Período de Medição:	Prédio Demolido



EDIFÍCIO I-1

Quantidade total de Poços: 17 Pares sendo 9 na Parte 1 e 8 na Parte 2

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5%Vol: 2 Pares
 PMG-114 Parte 1
 PMG-11 Parte 2

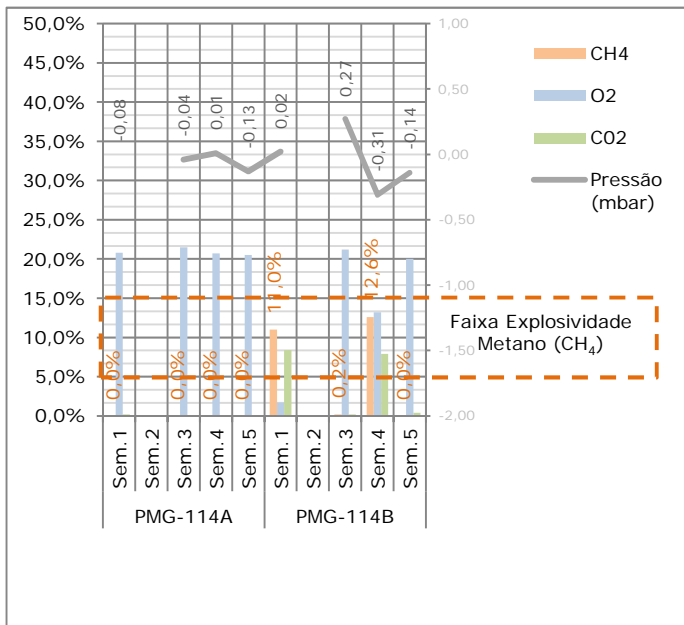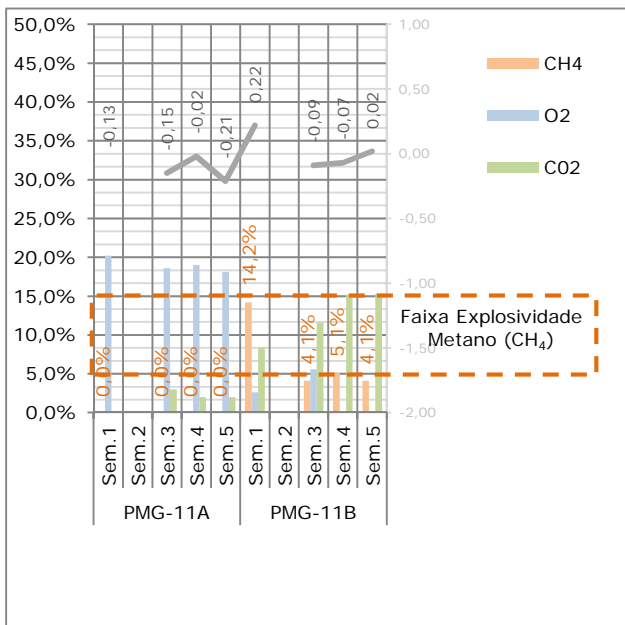Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)




EDIFÍCIO I-3

Quantidade total de Poços: 21 Pares sendo 7 nos Auditórios e 14 na Biblioteca

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5%Vol: 1 Par
 PMG-31 Biblioteca

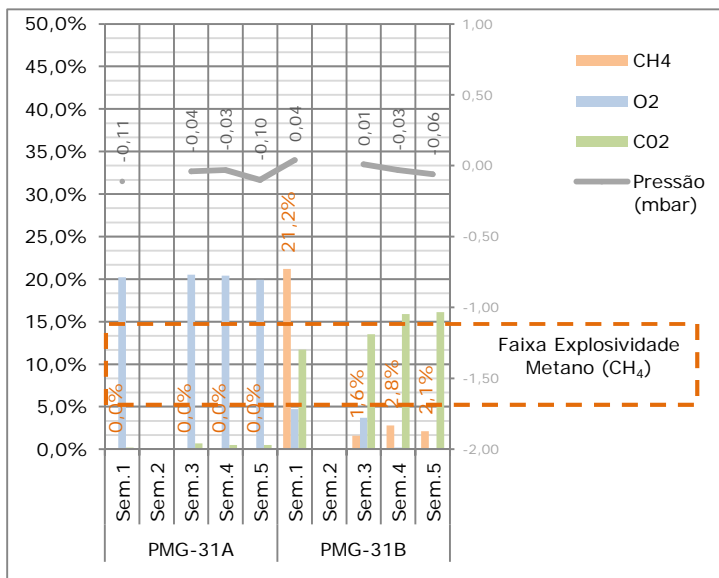Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços: 17 Pares


Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5%Vol: 12 Pares

	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61
	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62

Observações:

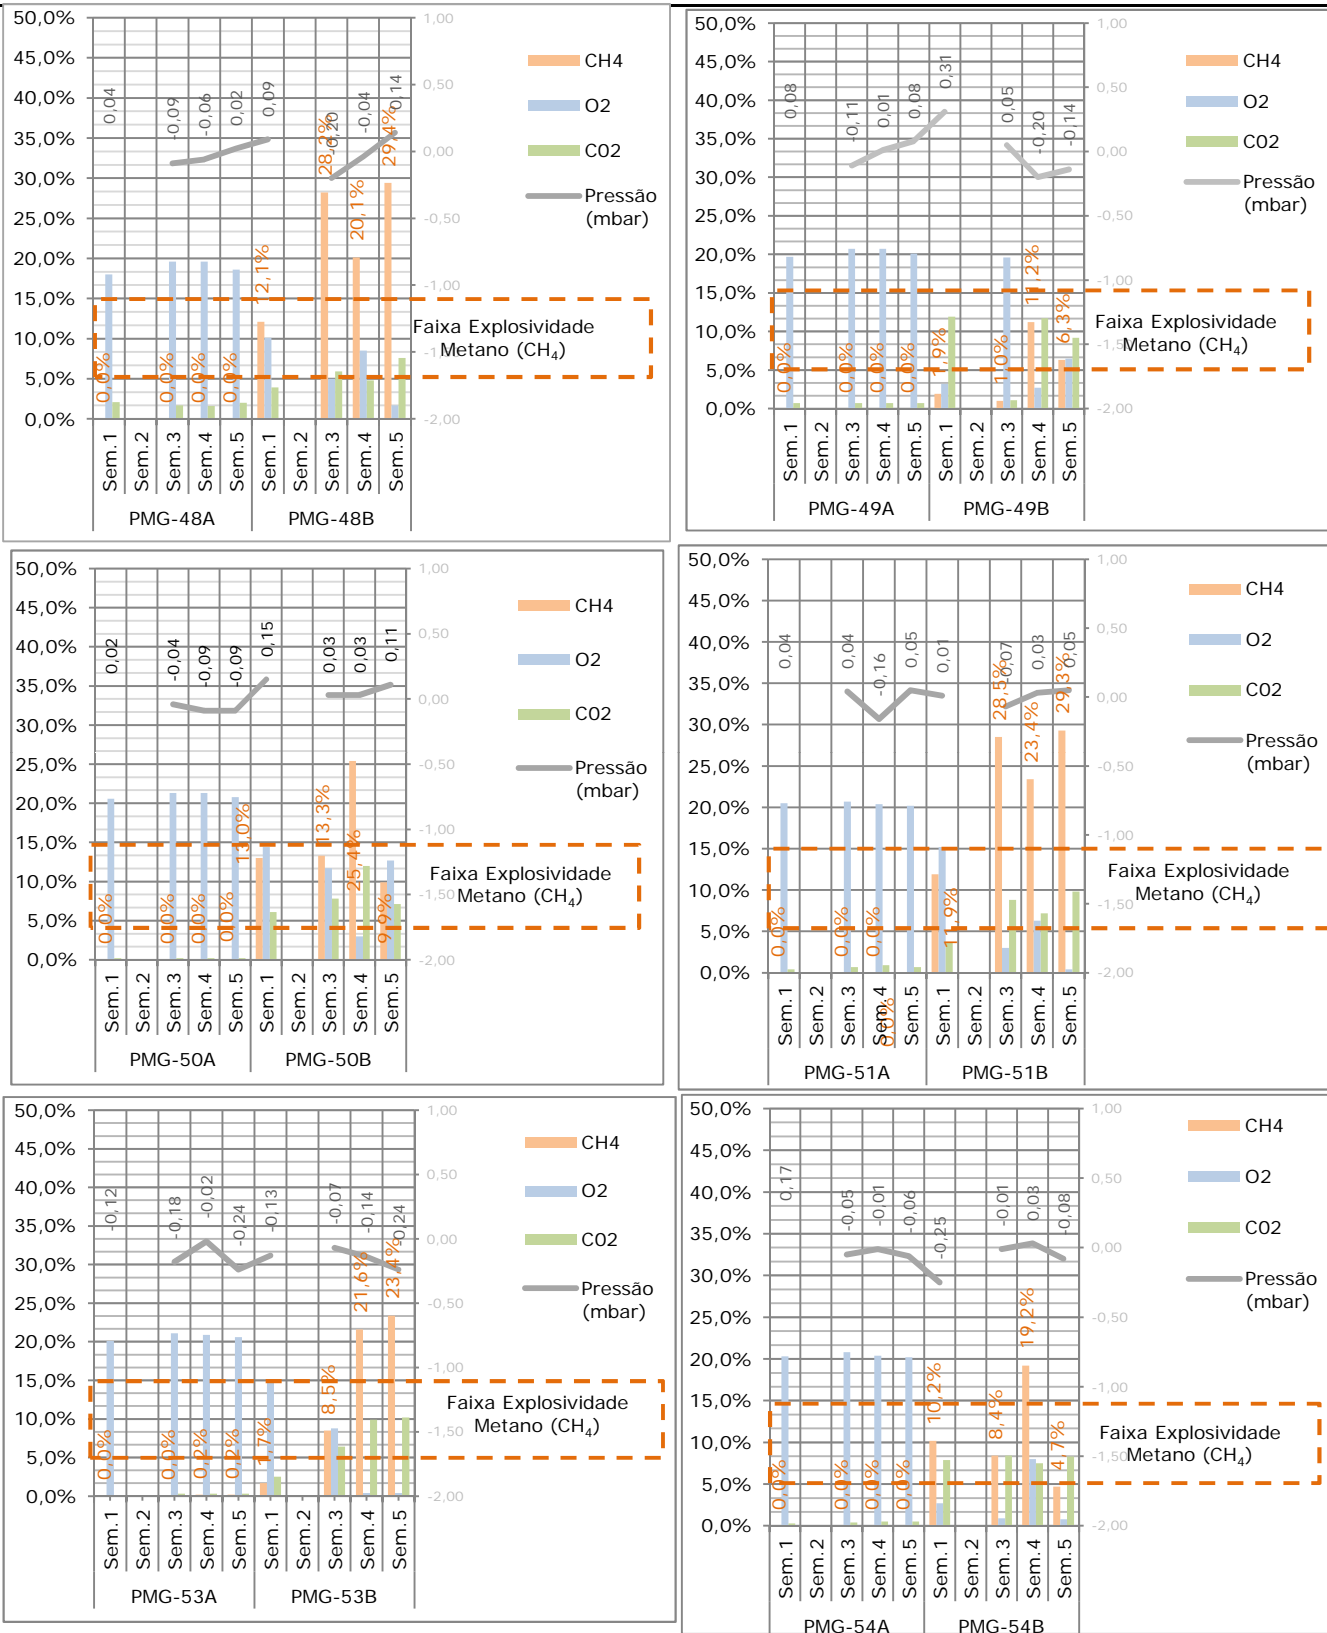As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



CONJUNTO LABORATORIAL







Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5%Vol: 12 Pares

PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61
PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62

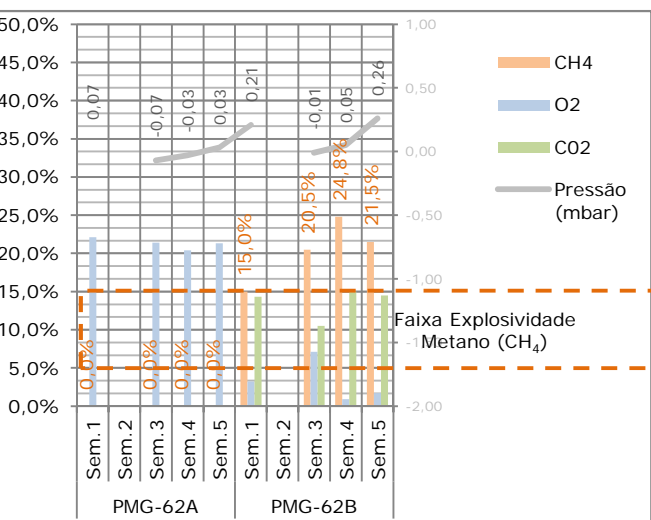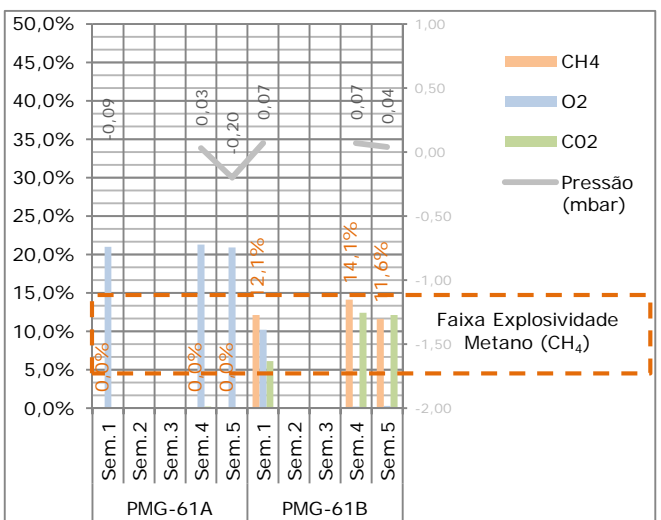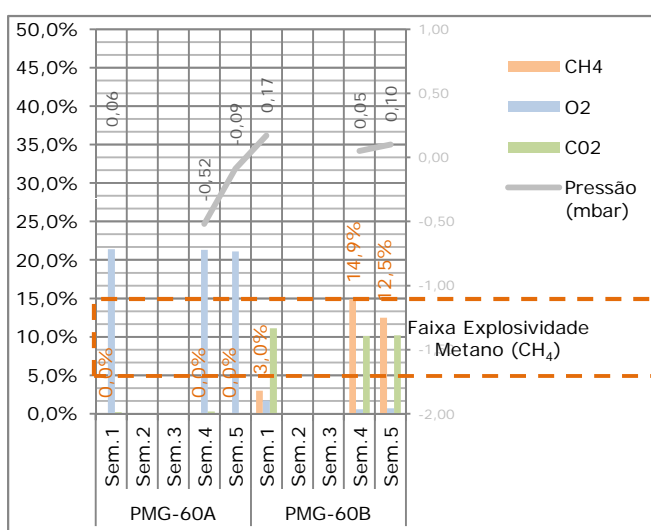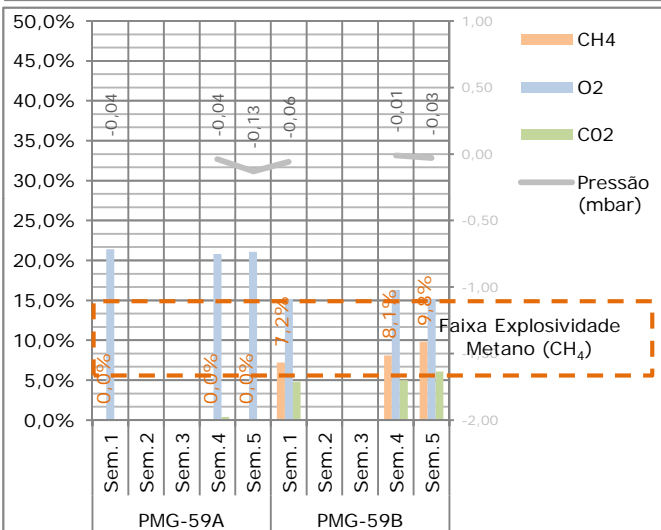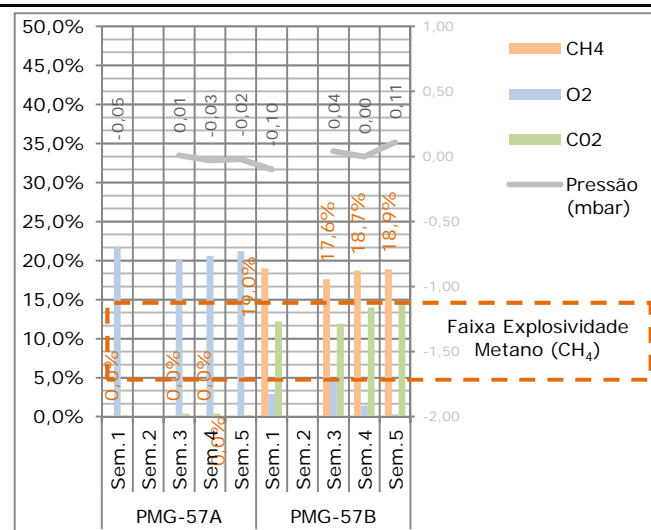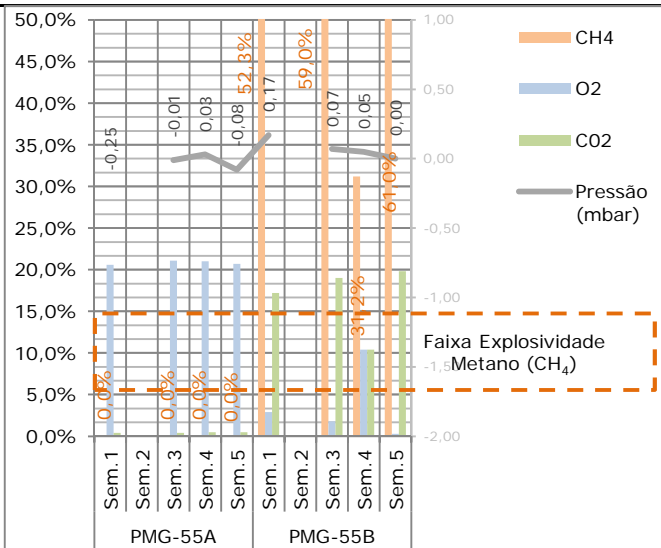Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

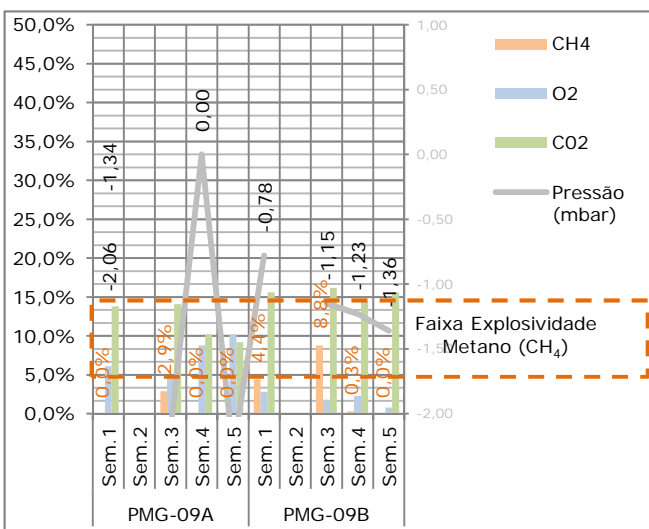
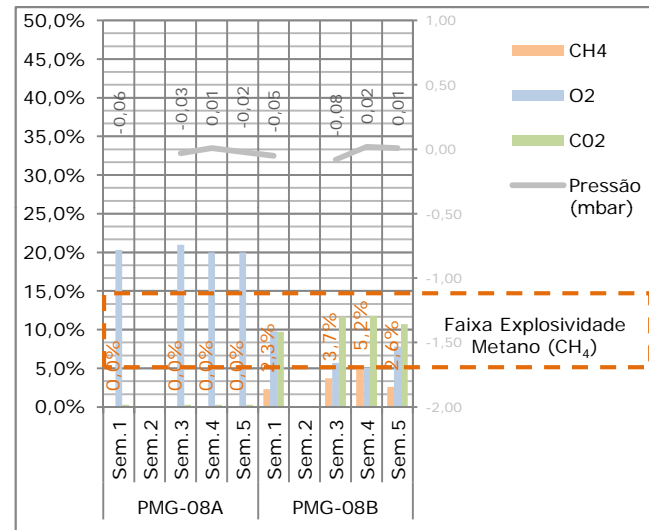
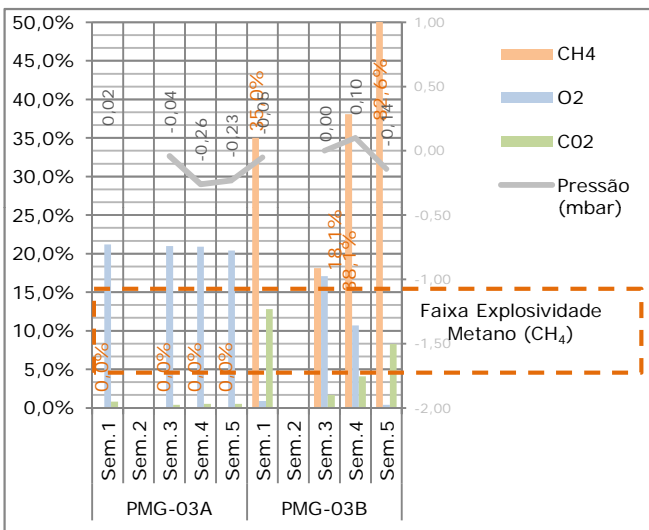
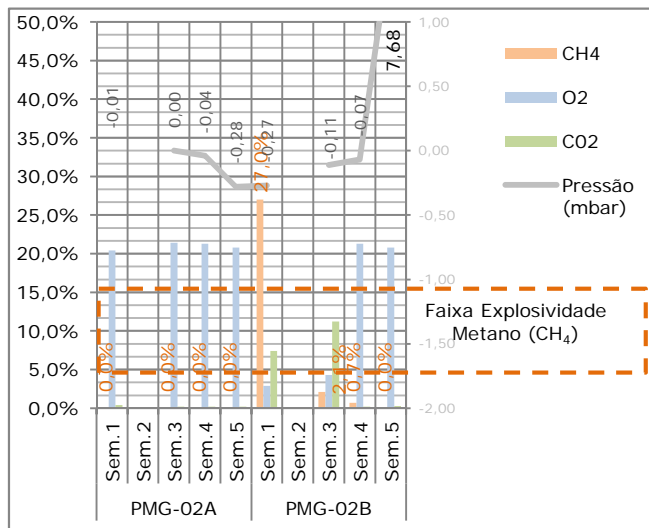
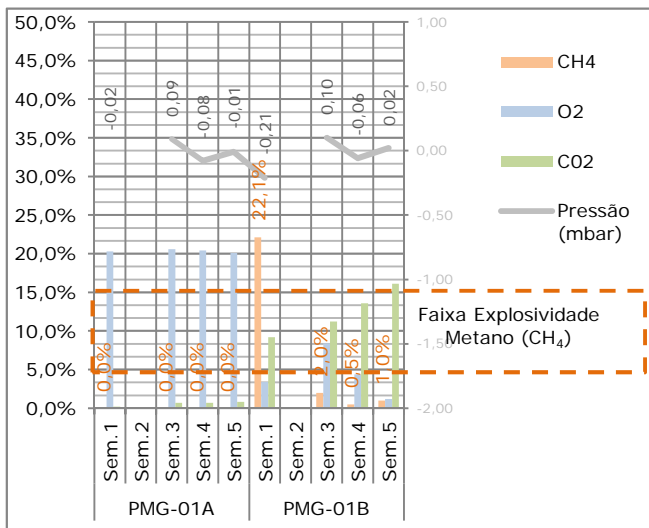
Quantidade total de Poços: 14 Pares

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5%Vol: 5 Pares

PMG-01 PMG-03 PMG-09
PMG-02 PMG-08

Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)




EDIFÍCIO I-4

Quantidade total de Poços: 12 Pares

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5%Vol: 1 Par PMG-64

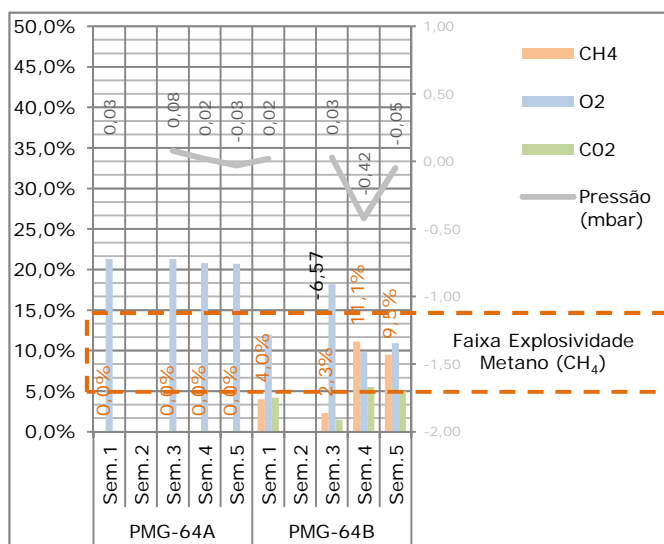Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)





CAT

Quantidade total de Poços: 7 Pares

Período de Medição: 23 de junho a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 5%Vol: 1 Par PMG-95, PMG-97

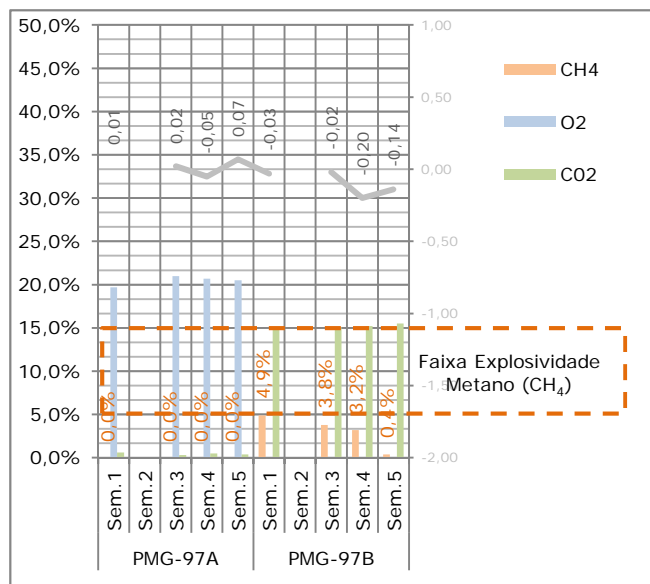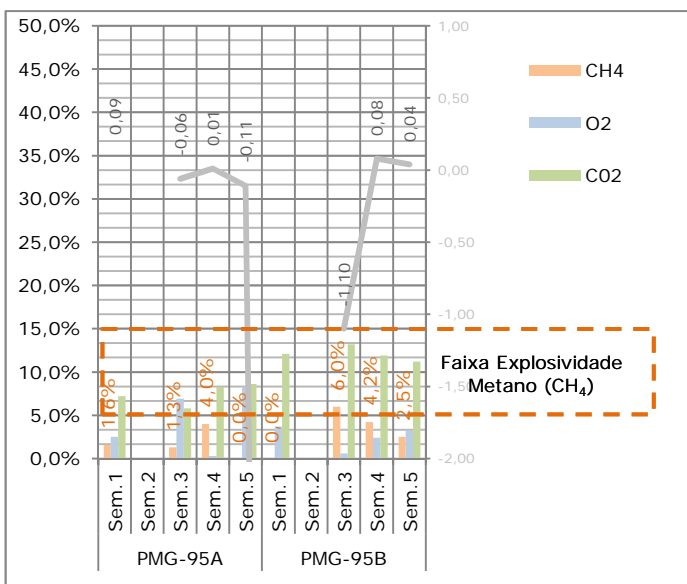Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)




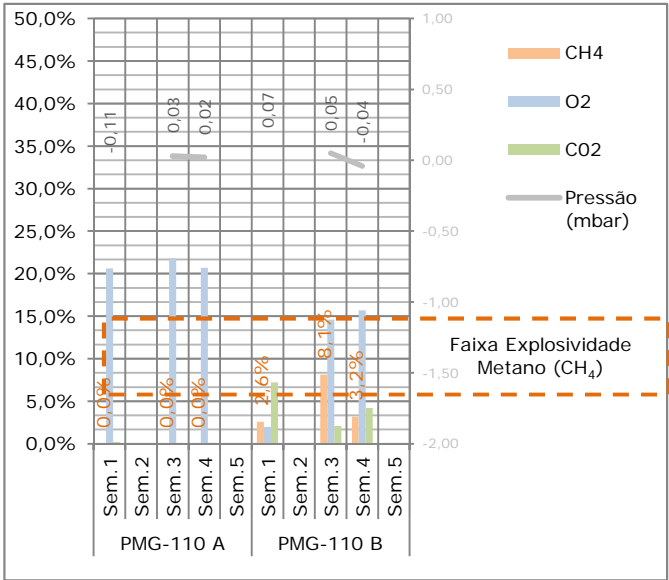
GINÁSIO POLIESPORTIVO		
Quantidade total de Poços:	11 Pares	
Período de Medição:	23 de junho a 25 de Julho de 2014	
Pares com concentração igual ou maior que 5%Vol:	1 Par	PMG-110
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)	
		
ENFERMARIA		
Quantidade total de Poços:	7 Pares	
Período de Medição:	23 de junho a 25 de Julho de 2014	
Pares com concentração igual ou maior que 5%Vol:	Nenhum	
INCUBADORA		
Quantidade total de Poços:	6 Pares	
Período de Medição:	23 de junho a 25 de Julho de 2014	
Pares com concentração igual ou maior que 5%Vol:	Nenhum	
LARANJINHA		
Quantidade total de Poços:	3 Pares	
Período de Medição:	Prédio Demolido	

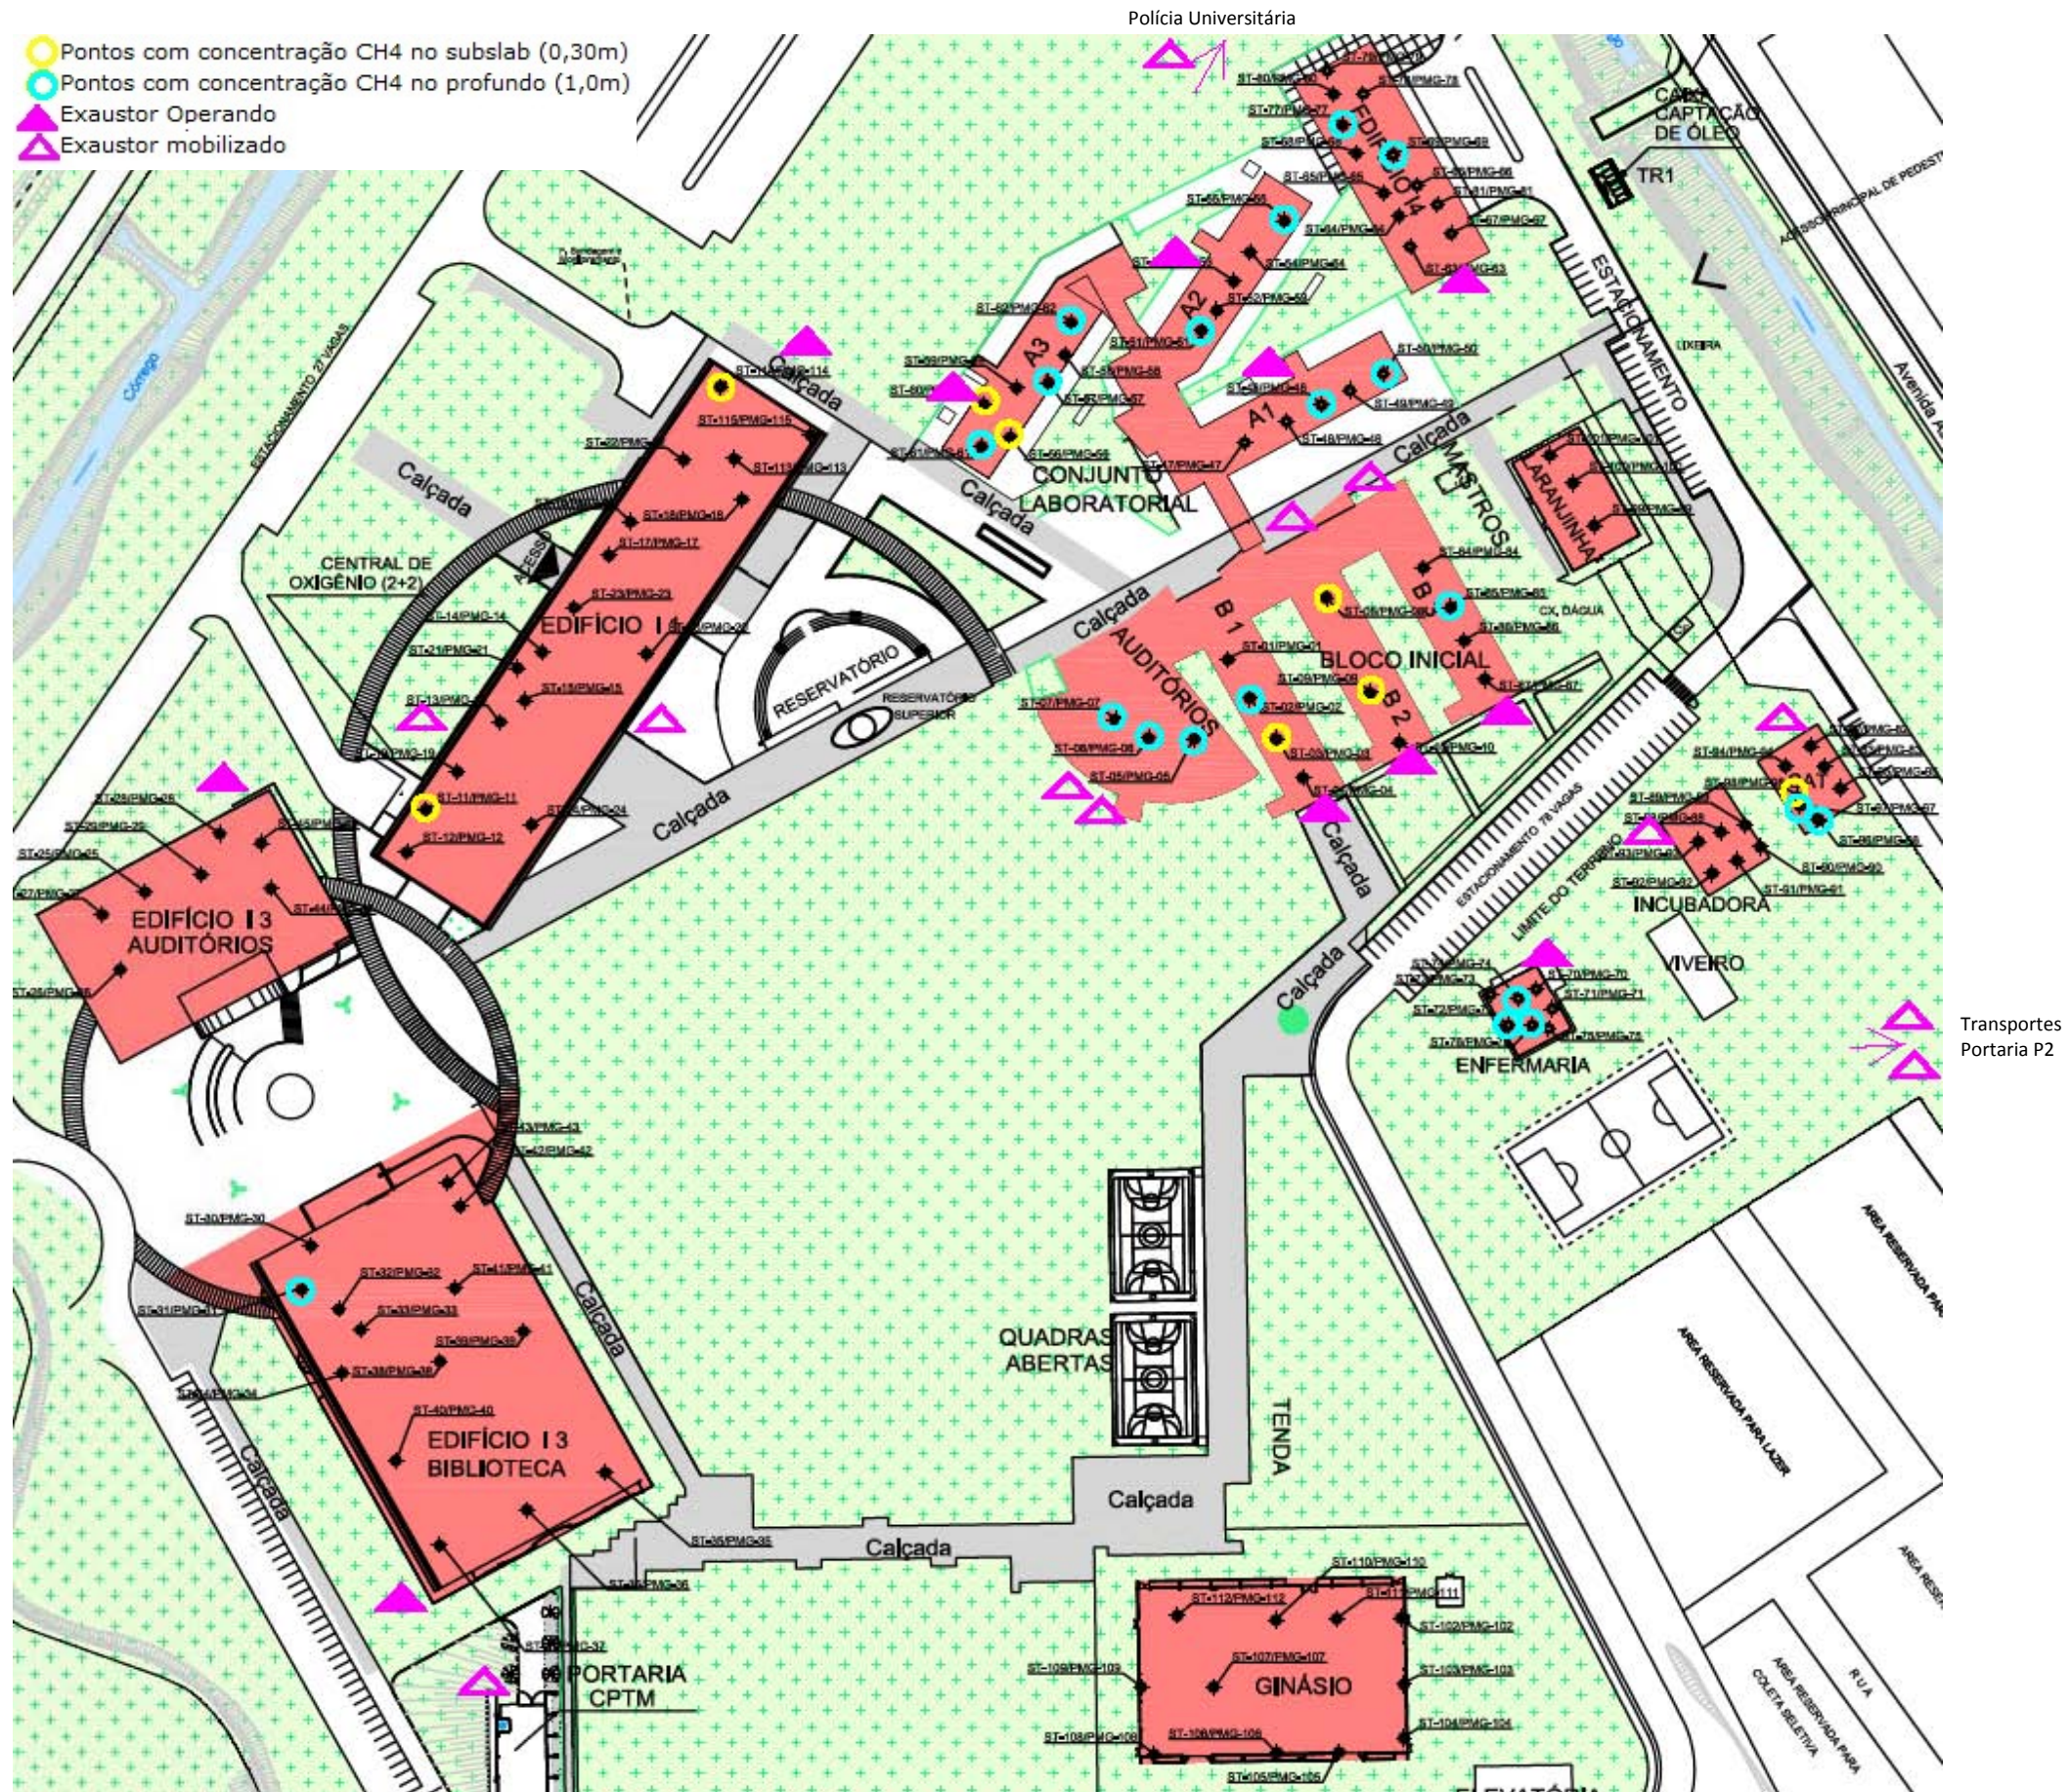Figura 4.1.1 Croqui de localização dos poços com Metano (Mar/2014)



Transportes
Portaria P2

Figura 4.1.2 Croqui de localização dos poços com Metano (Abr/2014)


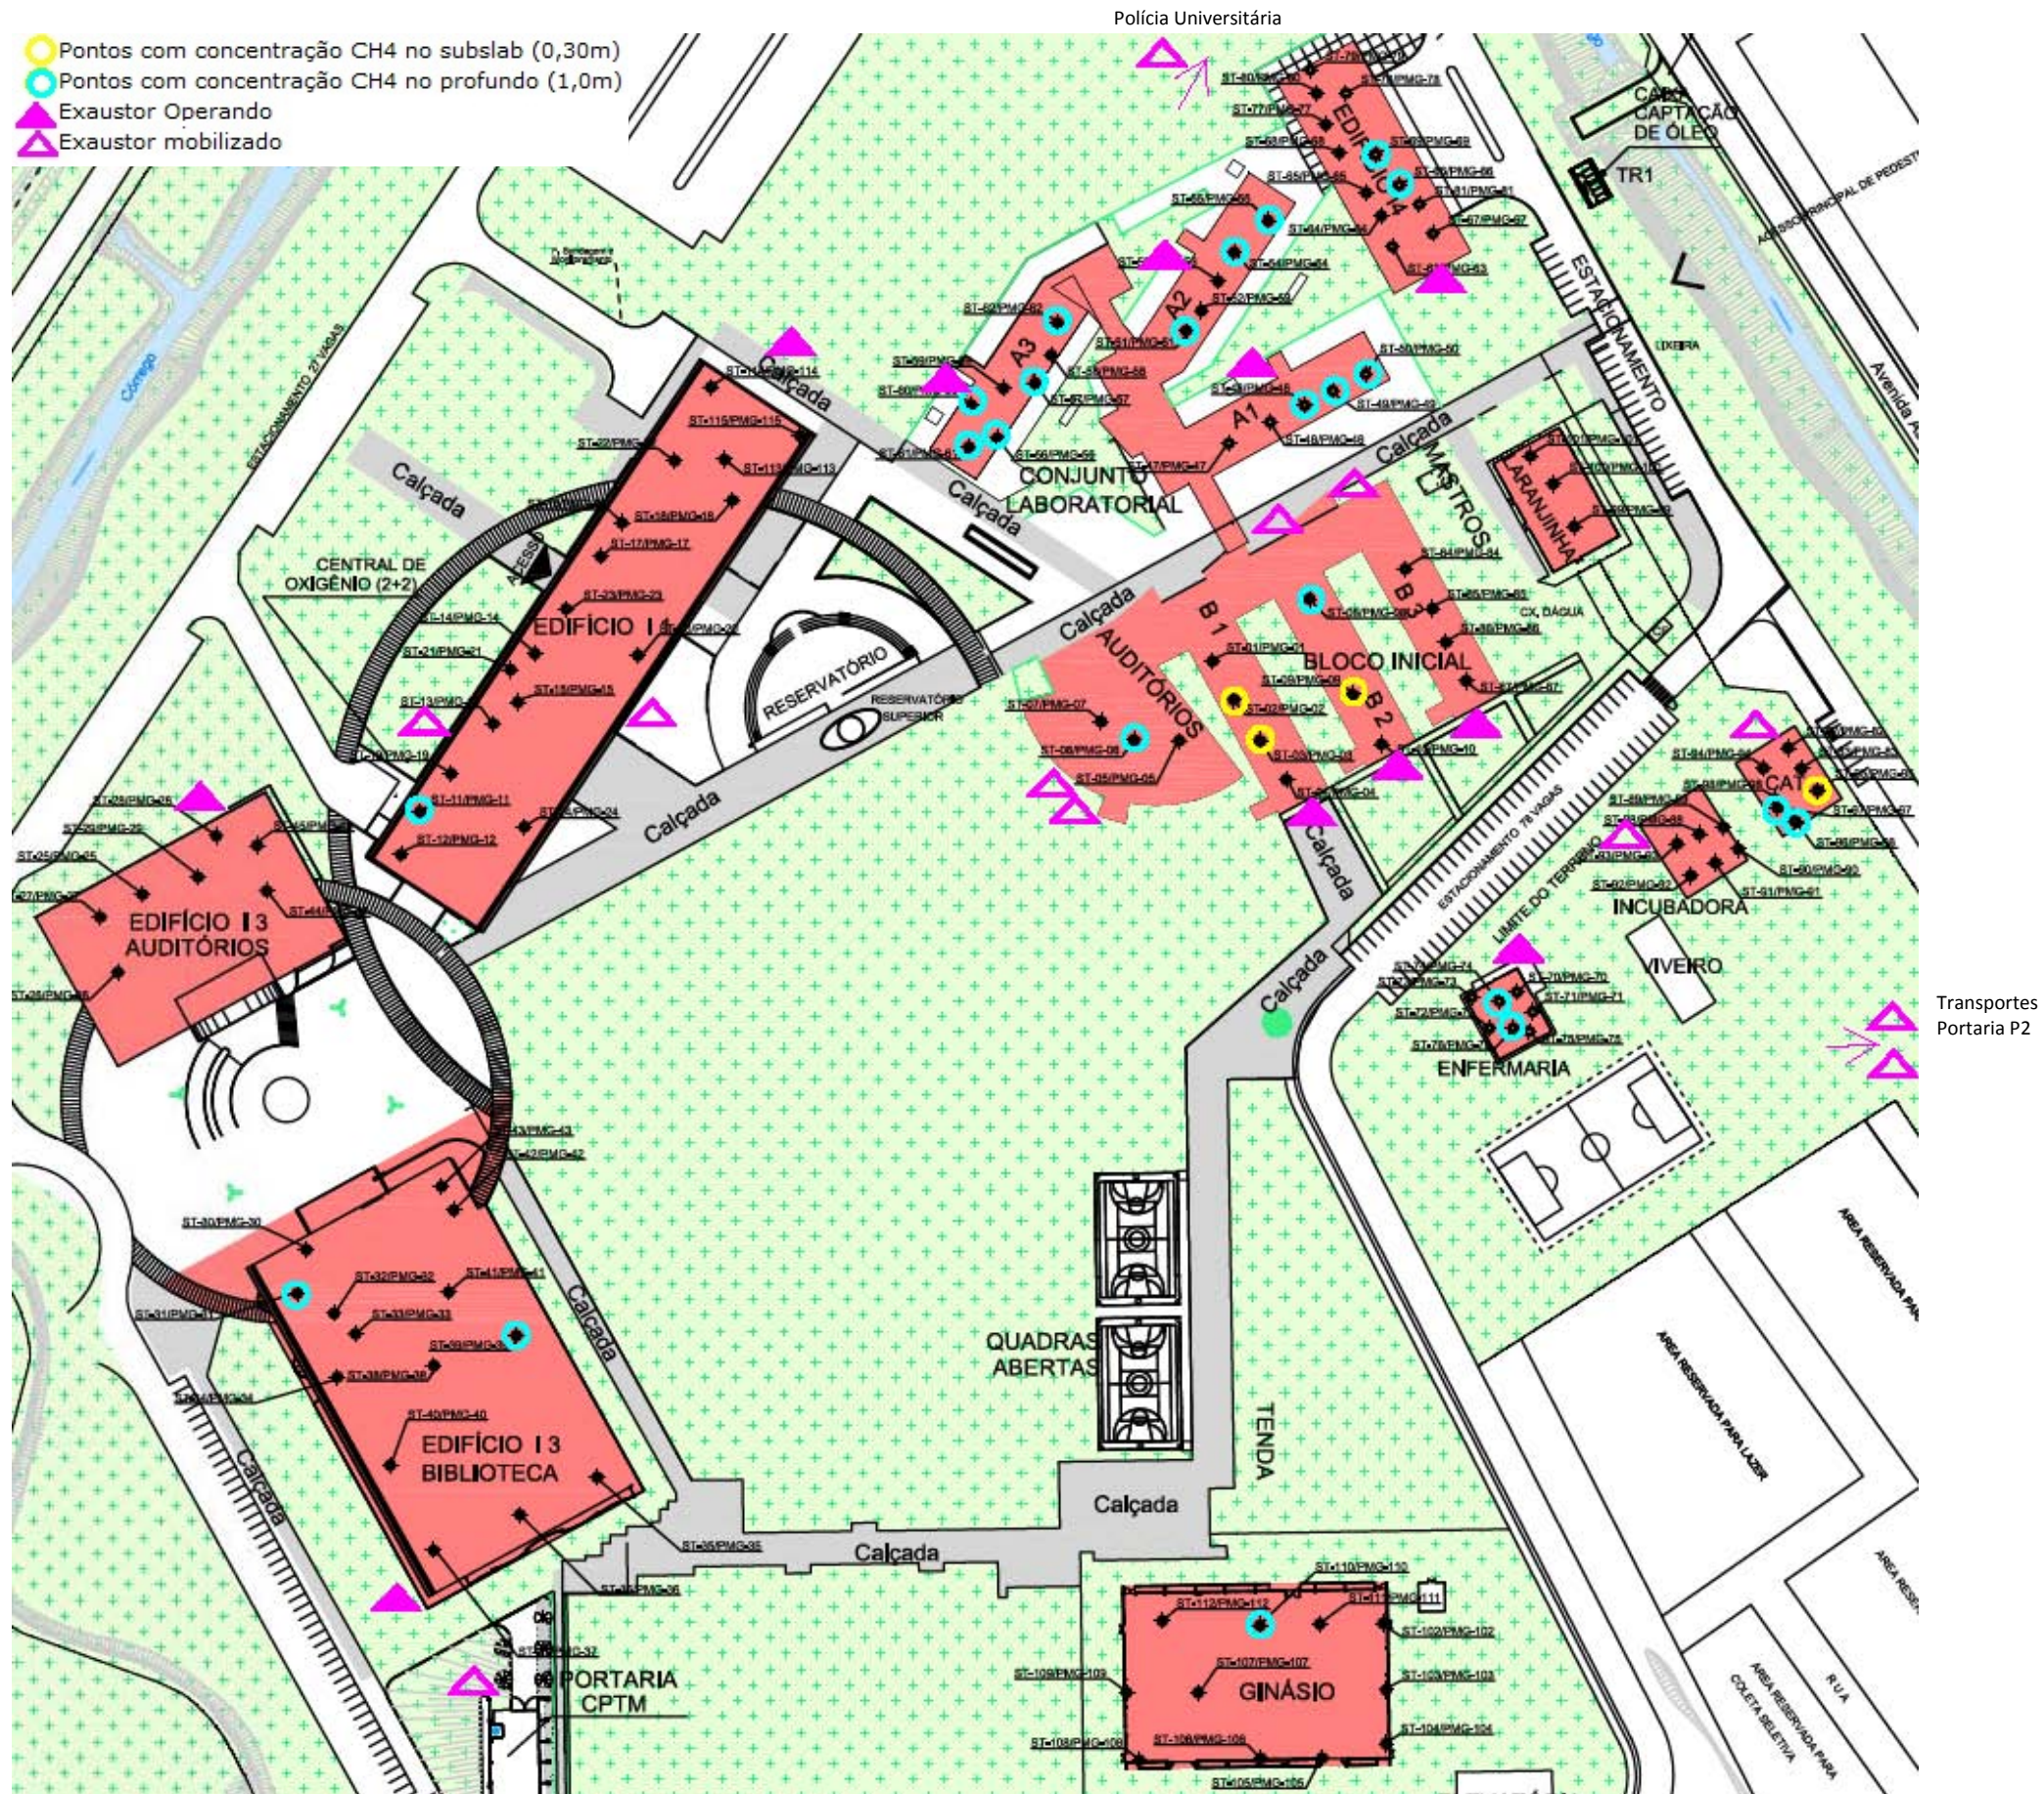


Figura 4.1.3 Croqui de localização dos poços com Metano (Mai/2014)

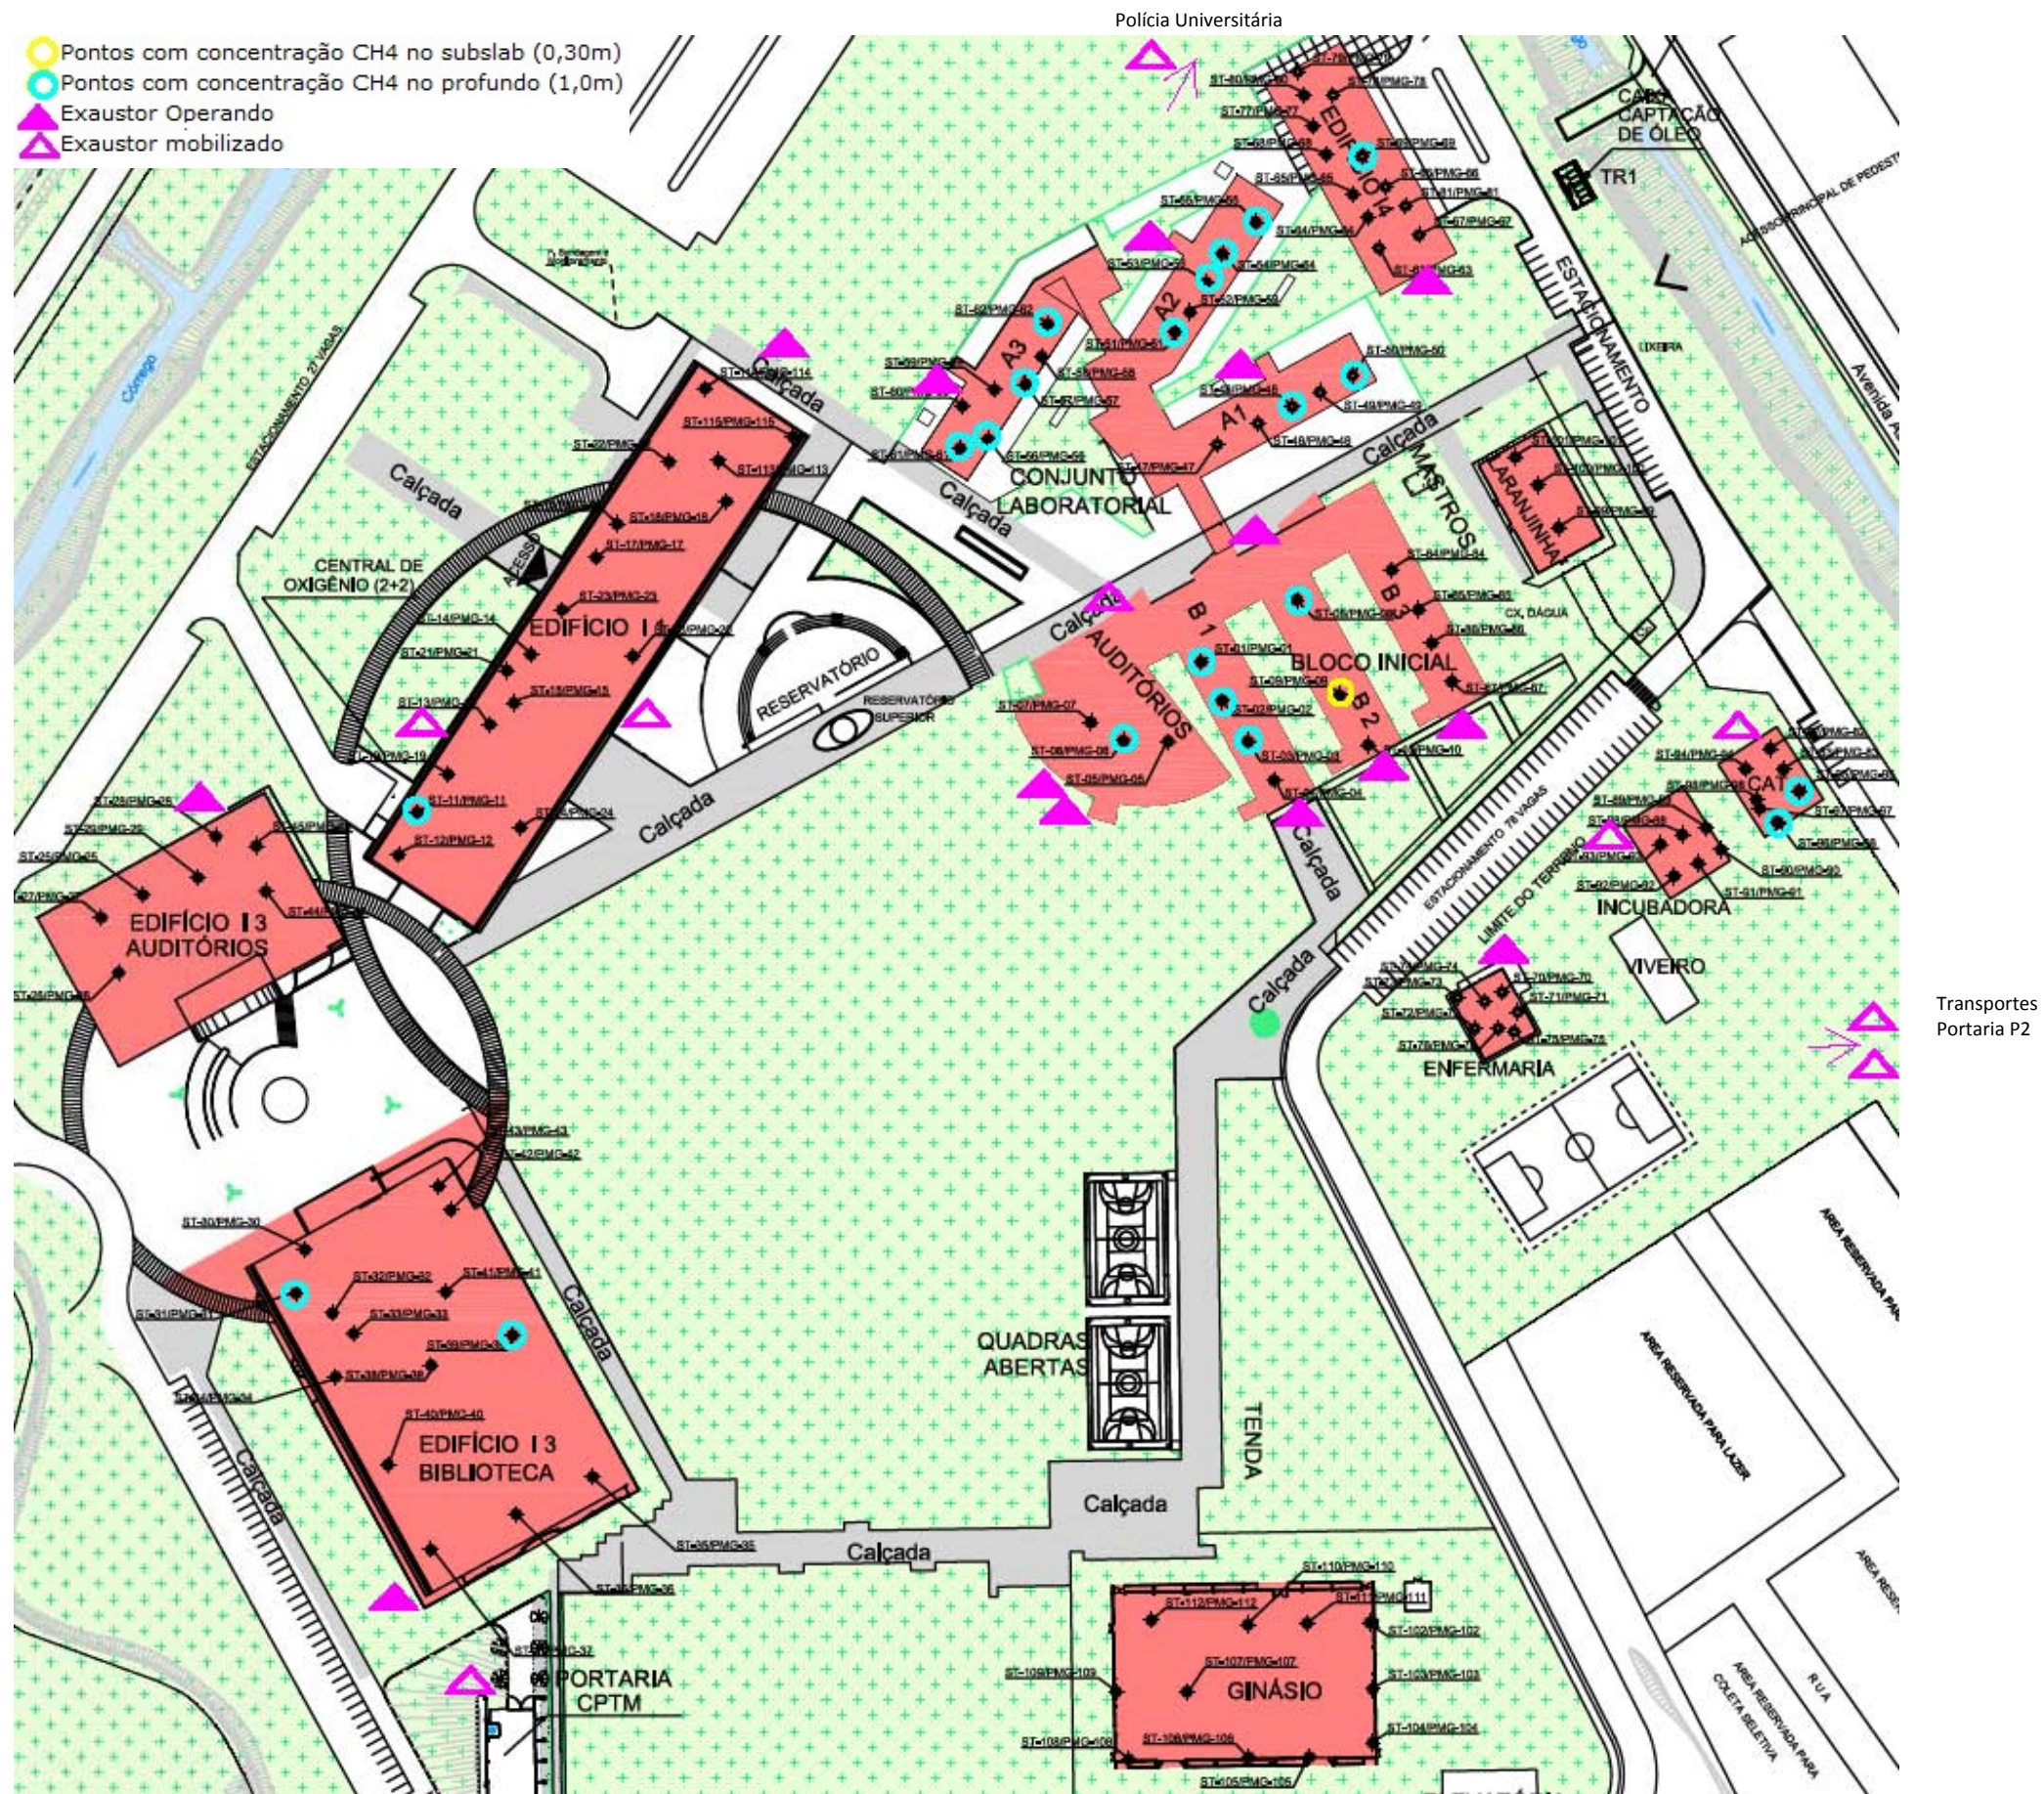

Transportes
Portaria P2

Figura 4.1.4 Croqui de localização dos poços com Metano (Jun/2014)


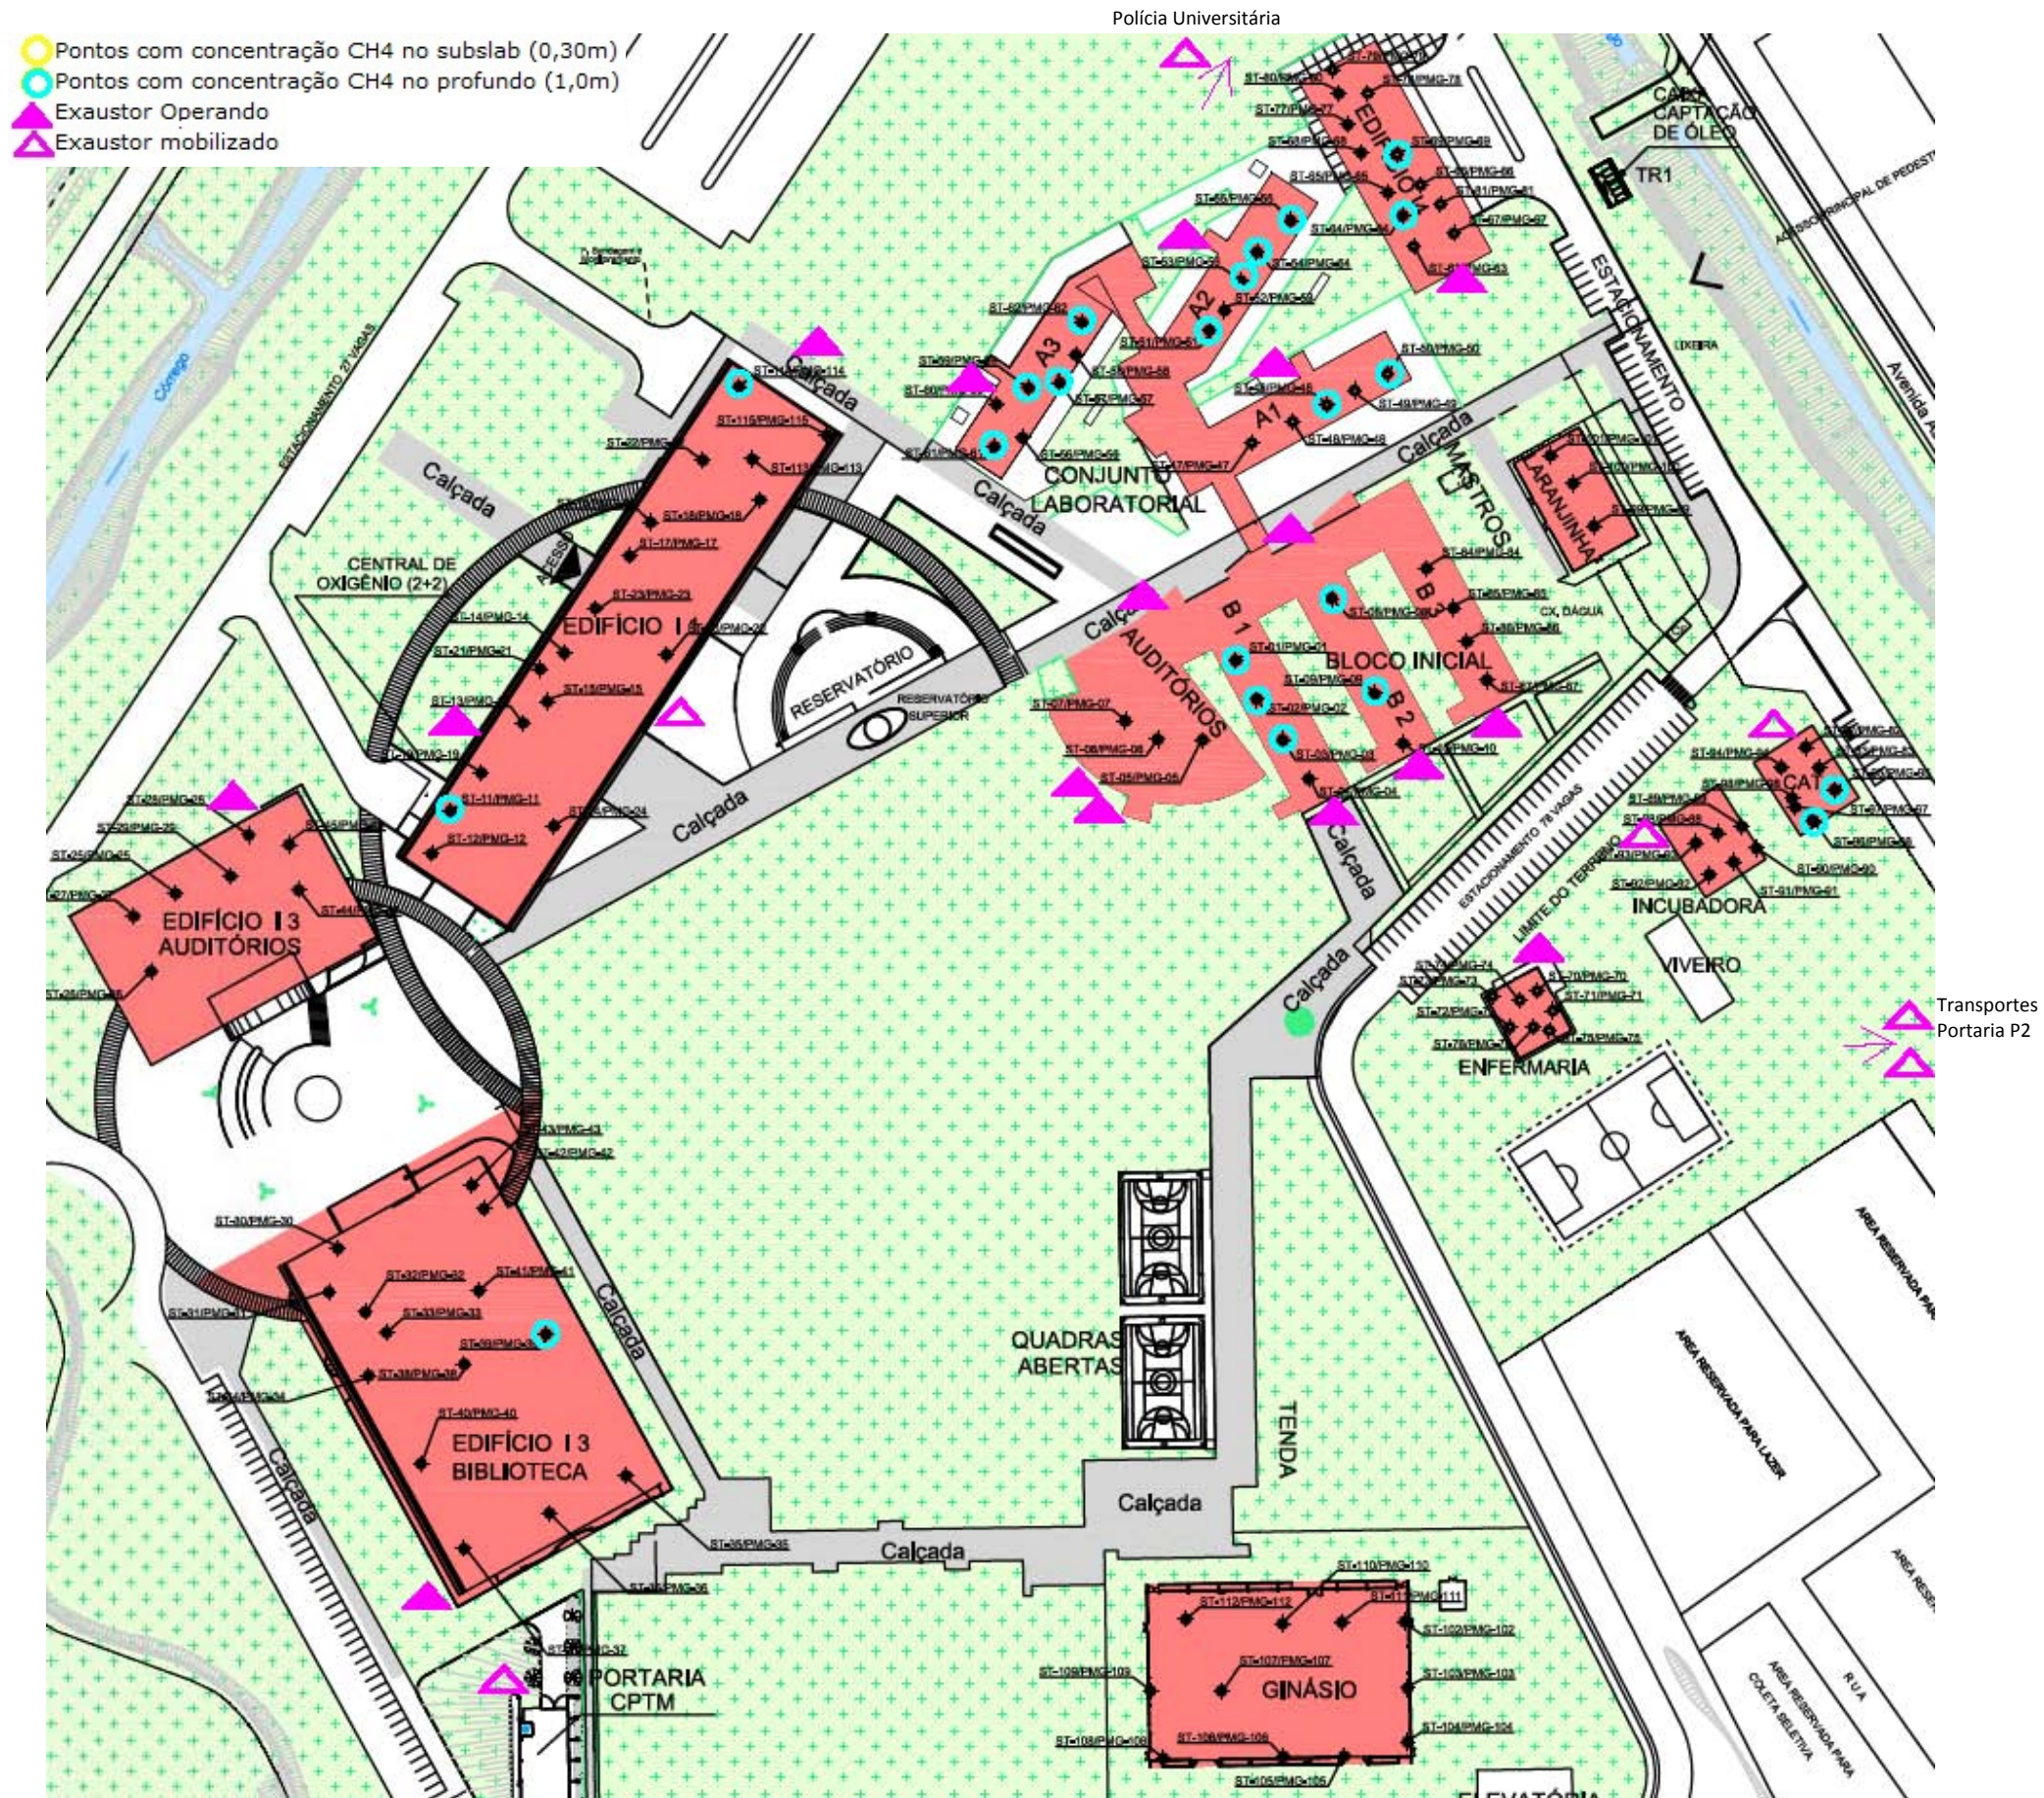


Figura 4.1.5 Croqui de localização dos poços com Metano (Jul/2014)

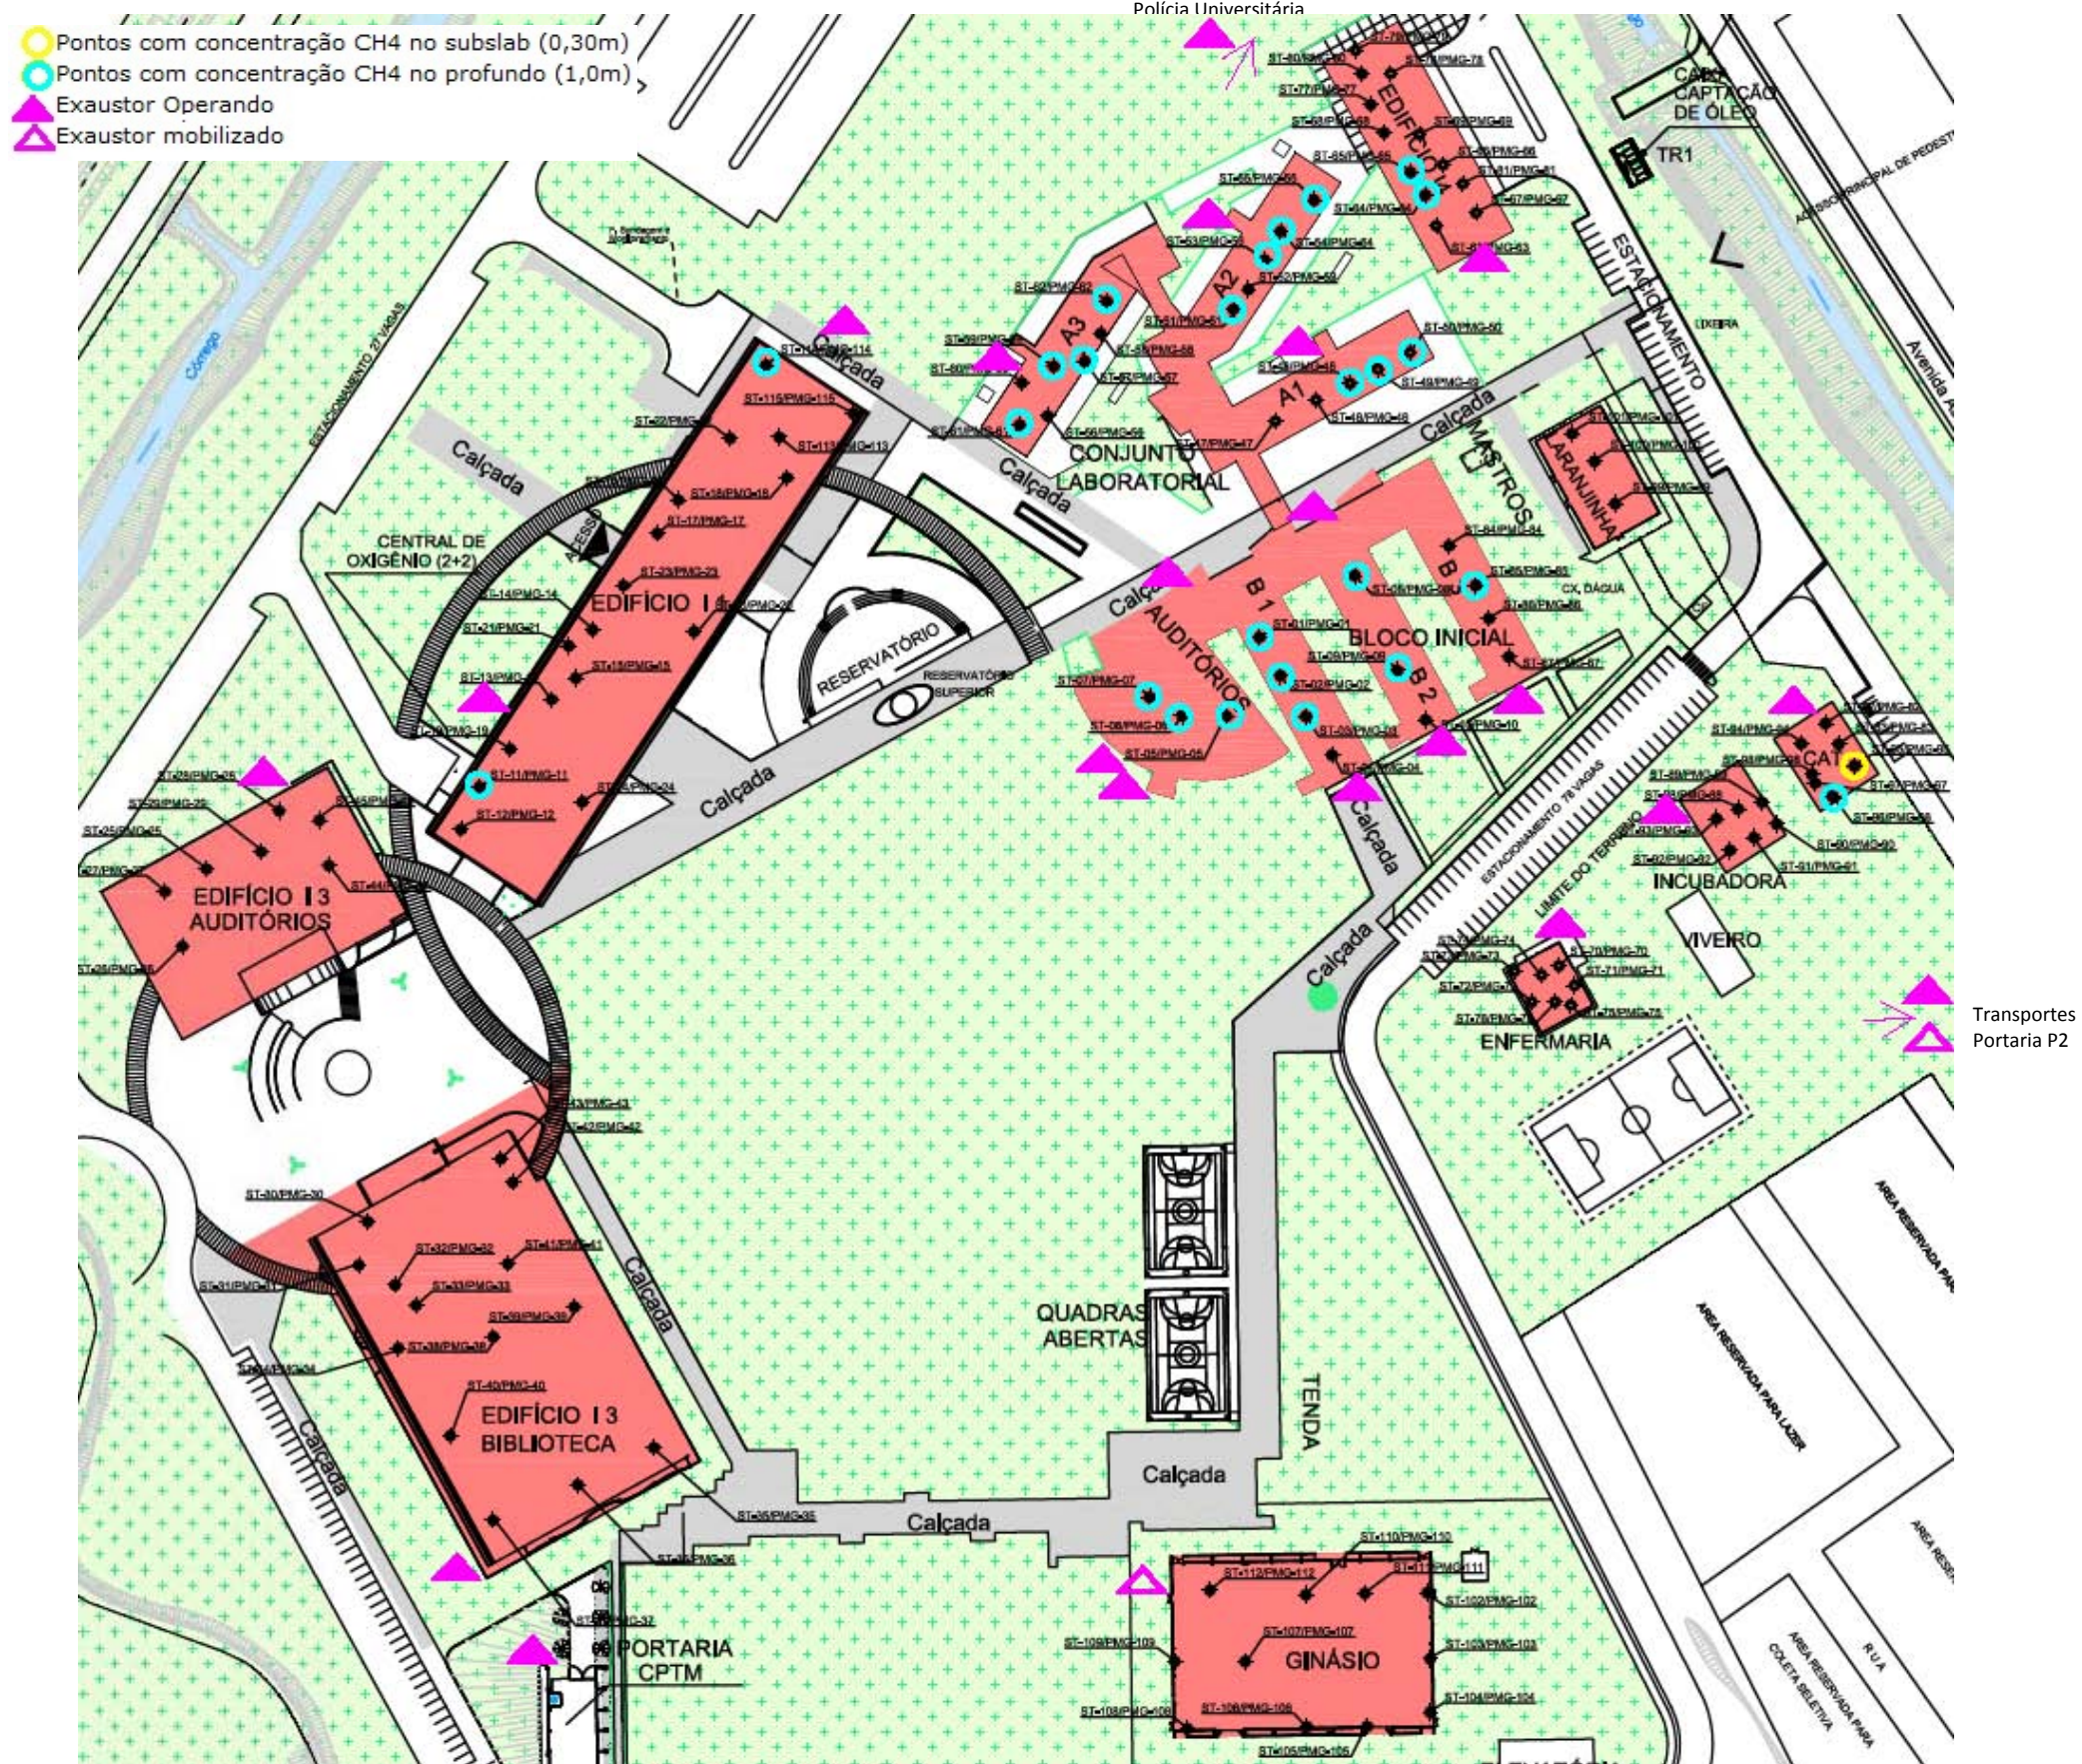

4.2. INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE EXTRAÇÃO

Nos meses de Março e Abril foram deslocados os sistemas de extração para o *campus* e conectados aos drenos existentes nos edifícios.

Ao longo dos meses de Maio e Julho foram realizadas as adequações propostas e apresentadas nos relatórios do IPT, de forma a melhorar a eficiência de alguns sistemas e viabilizar a de outros.

O conceito estabelecido pelo IPT, 2007 é a implantação de Sistema de ventilação (circulação de ar) nos tapetes de brita, logo abaixo da laje dos prédios, não propriamente visando a remediação do solo, mas sim mantendo o tapete ventilado impedindo a concentração e intrusão de gases nas edificações.

“Os gases e vapores que eventualmente adentrem o tapete drenante de brita serão coletados em um fluxo contínuo de ar limpo da atmosfera e conduzidos a sistema adequado de tratamento na superfície. Mantendo-se ventilado o tapete de brita, garante-se que os gases e vapores que eventualmente emanem do subsolo não atingirão o edifício pela sua base.

Tal sistema de ventilação deve prever em seu projeto, vias de saída e vias de entrada para o fluxo, fisicamente bem definidas, para que se possa determinar com clareza qual o volume ou estrutura que será ventilada.” (IPT, 2007)

A proposta inicial do sistema de ventilação preconizava que em cada prédio, antes de sua construção, deveriam ser instalados tubos geomecânicos drenantes na camada de brita, para que posteriormente fossem conectados a um sistema de exaustão (chaminés).

No entanto, alguns prédios foram construídos sem essa linha de tubos, ou alguns tubos permaneciam submergidos eventualmente pelo nível d'água alto da região. Outro ponto foi a utilização de chaminés que se tornariam inviável devido à grande quantidade de unidades necessárias para efetivação do processo.

Sendo assim, o projeto foi revisto pelo próprio IPT de Março a Julho/2013.

Cada edifício apresentará uma característica específica, mas em geral optou-se por um processo ativo de ventilação forçada. Dessa forma substituindo as chaminés por exaustores em regime contínuo e com aferição programada, bem como realizar furos nas lajes do edifício (4") e interliga-los com tubulação (4") para entrada ar atmosférico e extração do ar do colchão de brita.

Quanto aos tubos geomecânicos drenantes, em alguns prédios eles devem ser completamente inutilizados, enquanto que em outros devem ser utilizados em conjunto com o sistema de furos na laje.

A descrição detalhada de cada sistema, bem como plantas e projetos serão apresentados em relatório específico da instalação em cada prédio, com *As-Built*.

Os exaustores estão mobilizados nos pontos, conforme apresentado na **Tabela 4.2.1**.

Tabela 4.2.1 Localização dos exaustores mobilizados

Instalação de Exaustores				
Identificação Inicial	Local	Mobilizado	Ligado a drenos existentes (IPT)	Ligado a solução readequada (IPT)
SE.01	CAT	26/03/2014	-	17/07/2014
SE.02	CAT-2 Incubadora	31/03/2014	-	27/06/2014
SE.03	Conjunto Laboratorial A1	10/03/2014	10/03/2014	Não há necessidade de readequação
SE.04	Conjunto Laboratorial A2	27/02/2014	28/02/2014	Não há necessidade de readequação
SE.05	Conjunto Laboratorial A3	14/03/2014	17/03/2014	Não há necessidade de readequação
SE.07	Edifício I-1 estacionamento	26/03/2014	-	02/07/2014
SE.08	Edifício I-1 lateral	31/03/2014	-	02/07/2014
SE.09	Edifício I-3 - Auditórios	18/03/2014	20/03/2014	Não há necessidade de readequação
SE.10	Edifício I-3 - Biblioteca	17/03/2014	18/03/2014	23/06/2014
SE.11	Edifício I-4	20/03/2014	24/03/2014	29/05/2014
SE.12	Enfermaria	24/03/2014	26/03/2014	17/06/2014
SE.13	Guarda Universitária	31/03/2014	-	11/07/2014
SE.14	Módulo Inicial Auditório	16/04/2014	-	22/05/2014
SE.15	Módulo Inicial Auditório	16/04/2014	-	22/05/2014
SE.16	Módulo Inicial B1	26/03/2014	-	16/04/2014
SE.17	Módulo Inicial B2	26/03/2014	-	16/04/2014
SE.18	Módulo Inicial B3	20/03/2014	-	01/04/2014
SE.19	Módulo Inicial Cantina	16/04/2014	-	27/05/2014
SE.20	Módulo Inicial Corredor	16/04/2014	-	06/05/2014
SE.21	Portaria CPTM	16/04/2014	-	27/06/2014
SE.22	Portaria P2	16/04/2014	-	A guarita será suspensa não havendo contato com o solo
SE.23	Transportes	16/04/2014	-	18/07/2014
SE.06	Ginásio		-	Aguardando finalização da reforma e liberação para início

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O foco principal do trabalho é o monitoramento preventivo de intrusão de gás/vapores nos ambientes confinados, através da execução de leituras de gases em todos os poços de monitoramento.

Foram detectadas concentrações em 100% do Limite Inferior de Inflamabilidade (5% em volume) em 26 dos 112 pares de poços de gases monitorados. Sendo que destes apenas um (PMG-95A) apresentou essa concentração na profundidade imediatamente abaixo das edificações (subslab 0,3m).

Também foram realizadas medidas de VOC, H₂S e CO nos poços de monitoramento e não foram detectadas concentrações, ou concentrações muito pequenas.

Além disso, as medições realizadas em ralos e caixas de passagem em todas as edificações não apresentaram nenhuma concentração de metano, e muito baixas de VOC.

Com os resultados obtidos nessa campanha de monitoramento, observa-se que não está havendo a intrusão de gases nos ambientes fechados, uma vez que o gás concentra-se na porção inferior não alcançando a porção superior e não há concentração nos ralos.

Além disso, comparando-se essas informações com os dados dos meses anteriores, é possível observar que os sistemas instalados vêm sendo eficientes, de forma a não permitir o acúmulo de gases no tapete de brita (poços a 0,3m), bem como diminuindo até mesmo as concentrações no solo imediatamente abaixo do tapete de brita (poços a 1,0m).

O nível d'água raso existente na área tende a dificultar essa migração vertical do gás, bem como as medidas já adotadas ao longo do tempo (construções com ventilação fixa, colchão de brita em subsuperfície, drenos geomecânicos) podem ter minimizado a possibilidade de adensamento de gás nesses ambientes fechados.

6. EQUIPE TÉCNICA

Carlos Frederico Egli
Eng. Civil
CREA 600493705

Alessandro Perencin
Advogado
OAB 170030

Paula Ramos da Silva
Engenheira Ambiental
CRQ 67239 / CREA 5083314530

Ariane Mantovani
Engenheira Ambiental
CREA 5063299002

Luciana Barbieri Trevisan
Engenheira Ambiental
CREA 5063657086

Tasso Slongo Trindade
Geólogo
CREA 1400005160

São Paulo, 07 de Agosto de 2014.

Carlos Egli
Engenheiro Civil
CREA 600493705
WEBER Consultoria Ambiental LTDA

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CETESB-GTZ. *Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas*. 2.ed; São Paulo: CETESB, 2001.
- CETESB. *Decisão de Diretoria CETESB nº 103/2007 de Junho de 2007*.
- CETESB. *Manual de Produtos Químicos. Constituído de um Guia Técnico e 879 Fichas de Informação de Produto Químico*. 2003.
- IPT. *Relatório Técnico 130991-205-Final - Detalhamento do sistema de ventilação do subsolo de edifícios do campus da EACH/USP*. São Paulo: IPT, 29 de julho de 2013.
- IPT. *Relatório Técnico 130990-205-Parcial III - Detalhamento do sistema de ventilação do subsolo de edifícios do campus da EACH/USP – Posto de Enfermagem,, Portaria P3 e modificação nos I-1 e I-3-Biblioteca*. São Paulo: IPT, 24 de junho de 2013.
- IPT. *Relatório Técnico 130989-205-Parcial II - Detalhamento do sistema de ventilação do subsolo de edifícios do campus da EACH/USP*. São Paulo: IPT, 22 de março de 2013.
- IPT. *Relatório Técnico 125011-205 - Detalhamento do sistema de ventilação do subsolo do edifício 'Módulo Inicial'*. São Paulo: IPT, 28 de outubro de 2011.
- IPT. *Relatório Técnico 92353-205 - Avaliação e sugestões de aperfeiçoamento para alguns dos sistemas de ventilação de gás e vapor do subsolo de edifícios do campus da USP Leste - resultados preliminares*. São Paulo: IPT, 02 de abril de 2007.
- SERVMAR. *Relatório de Investigação Detalhada, Avaliação de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção na AI-01 e Investigação Detalhada de Gases*. São Paulo: SERVMAR, 01 de Fevereiro de 2014.
- USP. *Relatório Ambiental Preliminar*. São Paulo: USP, 01 de março de 2004.

ANEXOS

ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

Certificado de Calibração nº.: RBC.0231.14.rev.00

Controle Interno: 0401/14


Dados do Cliente

 Nome: Weber Consultoria Ambiental Ltda.
 Endereço: Avenida Vereador José Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

Local de realização do serviço de calibração

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil.

Dados do Instrumento Calibrado:

 Identificação: Monitor de Gás Portátil, Industrial Scientific, IBRID MX6
 Nº. Serie: 13051LY-001
 Nº. Patrimonio: Não Consta (204)
 Ident. Adicional: Não Consta
 Características:

Faixas de Medição	Sensor	Alarme 1	Alarme 2	STEL	TWA
LEL(CH4) - 0 a 100%LEL	130300B032	10%	20%	xxx	xxx
O2 - 0 a 30% vol	0	xxx	xxx	xxx	xxx
H2S - 0 a 500 ppm	0	xxx	xxx	xxx	xxx
CO - 0 a 999 ppm	0	xxx	xxx	xxx	xxx
PID - 0 a 2000 ppm	01001580	50	100	100	50

Data da Calibração: 24/02/2014

Método Utilizado: Procedimento 12.04.01.32-04

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 24,05°C ±0,96 Umidade: 46%Rh ±4,63

Informações do Termohigrômetro:

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-003 calibrado sob o número de certificado CAL-91793/12 pela empresa ABSI Service (RBC).

Material de Referência:

Material	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Mistura 4 gases	3417/13	Linde Gases Ltda.	30/09/14
Mistura 4 gases	3416/13	Linde Gases Ltda.	30/09/14
Mistura Isobutileno	40775666	White Martins - CLF	09/08/16
Mistura Isobutileno	40820873	White Martins - CLF	02/12/16

Certificado de Calibração n°.: RBC.0231.14.rev.00

Controle Interno: 0401/14

Resultados da Calibração:

Sensor %LEL (CH4)	Gás de Ref. Aplicado %LEL	Medição antes do Ajuste %LEL	Média das Medições %LEL	Erro de Medição %LEL	U ₉₅ (±) %LEL	k
		50	NA	50	0	2
	10	NA	10	0	1	2,00

Sensor O2 (Oxigênio)	Gás de Ref. Aplicado %mol/mol	Medição antes do Ajuste %mol/mol	Média das Medições %mol/mol	Erro de Medição %mol/mol	U ₉₅ (±) %mol/mol	k
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nota: unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol.

Sensor H2S (Gás Sulfídrico)	Gás de Ref. Aplicado ppm	Medição antes do Ajuste ppm	Média das Medições ppm	Erro de Medição ppm	U ₉₅ (±) ppm	k
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Sensor CO (Monóxido de Carbono)	Gás de Ref. Aplicado ppm	Medição antes do Ajuste ppm	Média das Medições ppm	Erro de Medição ppm	U ₉₅ (±) ppm	k
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Sensor PID (VOC's)	Gás de Ref. Aplicado ppm	Medição antes do Ajuste ppm	Média das Medições ppm	Erro de Medição ppm	U ₉₅ (±) ppm	k
		10,0	NA	11,5	1,5	0,4
	501,0	NA	502,6	1,6	10,4	2,87

Certificado de Calibração nº.: RBC.0231.14.rev.00

Controle Interno: 0401/14



Notas:

- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca chancelada.
- 5 - A definição de Incerteza de Medição descrita neste certificado se encontra na norma NIT-DICLA-021.


Legendas:

- STEL:** *Short Term Exposure Limit* (Média ponderada de tempo de exposição durante 15 minutos de trabalho);
- TWA:** *Time Weighted Average* (Média ponderada de tempo de exposição durante 8 horas de trabalho);
- %LEL:** *Lower Explosive Limit* (Limite Inferior de Explosividade);
- ppm:** Partes Por Milhão;
- U₉₅ (±):** Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mesurado;
- K:** Fator de abrangência.


Observações:

Nenhuma.

Data da Emissão: 24/02/2014



Técnico Executante
William Oliveira



Responsável Técnico
Clean Environment Brasil
Jonas Luiz Fortti
RG 36.191.227-4
Supervisor Técnico

Acesse www.clean.com.br e conheça nossas redes sociais!

Certificado de Calibração nº.: RBC.0232.14.rev.00

Controle Interno: 0401/14

Dados do Cliente

 Nome: Weber Consultoria Ambiental Ltda.
 Endereço: Avenida Vereador José Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

Local de realização do serviço de calibração

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil.

Dados do Instrumento Calibrado:

 Identificação: Monitor de Gás Portátil, Industrial Scientific, IBRID MX6
 Nº. Serie: 1303372-001
 Nº. Patrimonio: Não Consta (205)
 Ident. Adicional: Não Consta
 Características:

Faixas de Medição	Sensor	Alarme 1	Alarme 2	STEL	TWA
LEL(CH4) - 0 a 100%LEL	13013MX085	10%	20%	xxx	xxx
O2 - 0 a 30% vol	Sem sensor	xxx	xxx	xxx	xxx
H2S - 0 a 500 ppm	Sem sensor	xxx	xxx	xxx	xxx
CO - 0 a 999 ppm	Sem sensor	xxx	xxx	xxx	xxx
PID - 0 a 2000 ppm	01001515	50	100	100	50

Data da Calibração: 24/02/2014

Método Utilizado: Procedimento 12.04.01.32-04

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 24,4°C ±0,96 Umidade: 46%Rh ±4,63

Informações do Termohigrômetro:

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-003 calibrado sob o número de certificado CAL-91793/12 pela empresa ABSI Service (RBC).

Material de Referência:

Material	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Mistura 4 gases	3417/13	Linde Gases Ltda.	30/09/14
Mistura 4 gases	3416/13	Linde Gases Ltda.	30/09/14
Mistura Isobutileno	40775666	White Martins - CLF	09/08/16
Mistura Isobutileno	40820873	White Martins - CLF	02/12/16

Certificado de Calibração nº.: RBC.0232.14.rev.00

Controle Interno: 0401/14

Resultados da Calibração:

Sensor %LEL (CH4)	Gás de Ref. Aplicado	Medição antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	$U_{95} (\pm)$	k
	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	
	50	NA	50	0	2	2,00
	10	NA	11	1	1	2,00

Sensor O2 (Oxigênio)	Gás de Ref. Aplicado	Medição antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	$U_{95} (\pm)$	k
	%mol/mol	%mol/mol	%mol/mol	%mol/mol	%mol/mol	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nota: unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol.

Sensor H2S (Gás Sulfídrico)	Gás de Ref. Aplicado	Medição antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	$U_{95} (\pm)$	k
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Sensor CO (Monóxido de Carbono)	Gás de Ref. Aplicado	Medição antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	$U_{95} (\pm)$	k
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Sensor PID (VOC's)	Gás de Ref. Aplicado	Medição antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	$U_{95} (\pm)$	k
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
	10,0	NA	11,4	1,4	0,4	2,65
	501,0	NA	502,1	1,1	10,4	2,00

Certificado de Calibração nº.: RBC.0232.14.rev.00

Controle Interno: 0401/14



Notas:

- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca chancelada.
- 5 - A definição de Incerteza de Medição descrita neste certificado se encontra na norma NIT-DICLA-021.

Legendas:

- STEL:** *Short Term Exposure Limit* (Média ponderada de tempo de exposição durante 15 minutos de trabalho);
- TWA:** *Time Weighted Average* (Média ponderada de tempo de exposição durante 8 horas de trabalho);
- %LEL:** *Lower Explosive Limit* (Limite Inferior de Explosividade);
- ppm:** Partes Por Milhão;
- U₉₅ (±):** Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mesurado;
- K:** Fator de abrangência.

Observações:

Nenhuma.

Data da Emissão: 24/02/2014


Técnico Executante
William Oliveira

Responsável Técnico
Clean Environment Brasil
Jonas Luiz Fortti
RG 36.191.227-4
Supervisor Técnico

Acesse www.clean.com.br e conheça nossas redes sociais!

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

EXECUTADO POR: LANDTEC Produtos E Serviços Ambientais, Ltda.
Data de Calibração: 02 abril 2014
Número do Certificado: G501733_5/2193



Página 1 de 2



LANDTEC Produtos E Serviços Ambientais, Ltda.
Rua Pedroso de Camargo, 237 – Chácara Santo Antonio
São Paulo / SP Brasil, 04717-010

www.landtecsa.com

Aprovado por Assinatura
LANDTEC BRASIL
TÉCNICO RESPONSÁVEL
Marcus Vinicius Cunha
Marcus Vinicius
Técnico Responsável

Cliente: Weber Consultoria Ambiental LTDA

Av. Vereador Jose Diniz, 3725 - 7^Andar
Campo Belo - SP -SP
04603-020
Brasil

Descrição: GEM5000

Modelo: GEM5000

Número de Série: G501733

Accredited Results:

Metano (CH4)		
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)	Incerteza (%)
50.0	49.5	1.03
15.1	15.1	0.66
5.0	4.9	0.42

Dióxido de Carbono (CO2)		
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)	Incerteza (%)
50.0	49.9	1.19
15.2	15.2	0.71
5.0	5.0	0.43

Oxigênio (O2)		
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)	Incerteza (%)
20.9	21.0	0.25

Gas cylinders are traceable and details can be provided if requested.

Como recebidas, Leituras de CH4, CO2 registradas a: 33.6 °C/92.5 °F
como recebidas, Leitura de O2 registrada a: 24.2 °C/75.6 °F

Pressão Barométrica: 27.10 "Hg

Método de teste: O analisador é calibrado em uma câmara usando temperatura controlada e gases de referência. Todos os analisadores são calibrados de acordo com os nossos procedimentos ISP-17 usando gás de alto padrão de pureza

Todas as calibrações são executadas de acordo com ISO 17025 na Landtec uma ISO 17025:2005 - serviço de assistência credenciado através PJLA

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor of k=2, providing a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with NIST requirements.

The calibration results published in this certificate were obtained using equipment capable of producing results that are traceable to NIST and through NIST to the International System of Units (SI). Certification only applies to results shown. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

PJLA ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY NO. 76758

Número do Certificado

G501733_5/2193

Página 2 de 2

Non Accredited results:

Pressão dos Transdutores (polegadas por coluna d'água)					
Transdutor	Certificado(Baixo)	Leitura (Baixo)	Certificado (Alto)	Leitura (Alto)	Precisão
Static	0"	0,0"	40"	39,9"	2.0"
Differential	0"	0,0"	4"	4,0"	0.7"

Barômetro (mbar)	
Referência	Leitura do Instrumento
0918 mbar / 27.10 "Hg	0920 mbar / 27.16 "Hg

Células de Gás Adicional		
Gás	Gás Certificado (ppm)	Leitura do Instrumento (ppm)
CO	500	497
H2S	190,2	189

Adicional Informações: Vencimento: 2 Abril, 2015

Fim do Certificado

ANEXO II – TABELAS DE MEDIÇÕES DIÁRIAS MX6 (JUL/14)

DATA		23-jun-14		24-jun-14		25-jun-14		26-jun-14		27-jun-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75%LEL											
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-16 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-17 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-17 B	-	-	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-18 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-18 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-20 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-20 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-22 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-22 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-23 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-23 B	-	-	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-113 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-113 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-114 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-114 B	-	-	0,0	29%	0,0	88%	0,0	98%	GEM	GEM
PMG-115 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-115 B	-	-	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-14 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-21 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-21 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-15 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-15 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-13 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-13 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-19 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-19 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-11 A	-	-	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-11 B	-	-	1,4	100%	1,6	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-12 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-12 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-24 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-24 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
I-3 Auditórios	PMG-25 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-25 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-26 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-26 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%
	PMG-27 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-27 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-28 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-28 B	-	-	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-29 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-29 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-44 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%
	PMG-44 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,8	0%	0,0	0%
PMG-45 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-45 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	

DATA		23-jun-14		24-jun-14		25-jun-14		26-jun-14		27-jun-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75%LEL											
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-30 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-31 A	-	-	0,0	0%	0,8	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-31 B	-	-	0,0	42%	1,4	43%	0,0	47%	GEM	GEM
	PMG-32 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-32 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-33 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-33 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-34 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-34 B	-	-	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-35 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-35 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-36 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-36 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-37 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-37 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-38 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-38 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-39 A	-	-	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-39 B	-	-	0,4	60%	1,0	63%	0,0	59%	GEM	GEM
	PMG-40 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-40 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-41 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-41 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-42 A	-	-	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-42 B	-	-	0,5	4%	0,8	4%	0,0	4%	GEM	GEM
	PMG-43 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-43 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Edifício I-4	PMG-63 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-63 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-64 A	-	-	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-64 B	-	-	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-65 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-65 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-66 A	-	-	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-66 B	-	-	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-67 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-67 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-68 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-68 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-69 A	-	-	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-69 B	-	-	GEM	GEM	1,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-77 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-77 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-78 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-78 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-79 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-79 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
PMG-80 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-80 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-81 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-81 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	

DATA		23-jun-14		24-jun-14		25-jun-14		26-jun-14		27-jun-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75%LEL											
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	-	-	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0
	PMG-46 B	-	-	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0
	PMG-47 A	-	-	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0
	PMG-47 B	-	-	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0
	PMG-48 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-48 B	-	-	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-49 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-49 B	-	-	0,0	100%	0,0	100%	0,4	100%	GEM	GEM
	PMG-50 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-50 B	-	-	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-51 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-51 B	-	-	0,2	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-52 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-52 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-53 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-53 B	-	-	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-54 A	-	-	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-54 B	-	-	0,8	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-55 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-55 B	-	-	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-56 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0
	PMG-56 B	-	-	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0,0
	PMG-57 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-57 B	-	-	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-58 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0
	PMG-58 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0
	PMG-59 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-59 B	-	-	0,3	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-60 A	-	-	0,0	0%	1,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-60 B	-	-	1,0	100%	1,3	100%	0,0	62%	GEM	GEM
PMG-61 A	-	-	0,0	0%	0,3	0%	0,4	0%	GEM	GEM	
PMG-61 B	-	-	0,0	100%	0,8	100%	0,7	100%	GEM	GEM	
PMG-62 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
PMG-62 B	-	-	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-01 B	-	-	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-02 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-02 B	-	-	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-03 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-03 B	-	-	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-04 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-04 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-05 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-05 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-06 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-06 B	-	-	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-07 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-07 B	-	-	0,0	7%	0,0	3%	0,0	4%	GEM	GEM
	PMG-08 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-08 B	-	-	0,2	100%	0,0	100%	0,4	100%	GEM	GEM

DATA	23-jun-14		24-jun-14		25-jun-14		26-jun-14		27-jun-14		
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000: maior ou igual 75%LEL											
Enfermaria	PMG-09 A	-	-	0,0	4%	0,0	5%	0,3	9%	GEM	GEM
	PMG-09 B	-	-	0,0	100%	0,0	100%	0,8	100%	GEM	GEM
	PMG-10 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-10 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-84 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-84 B	-	-	0,0	51%	0,0	52%	0,0	48%	GEM	GEM
	PMG-85 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-85 B	-	-	0,0	10%	0,0	11%	0,0	10%	GEM	GEM
	PMG-86 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-86 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-87 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-87 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-70 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-70 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-71 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-71 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-72 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-72 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-73 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-73 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-74 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-74 B	-	-	0,0	24%	0,0	22%	GEM	GEM	0,2	17%
PMG-75 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	
PMG-75 B	-	-	0,0	4%	0,0	4%	GEM	GEM	0,0	3%	
PMG-76 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	
PMG-76 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	
CAT	PMG-82 A	-	-	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-82 B	-	-	GEM	GEM	0,0	12%	0,0	10%	0,0	9%
	PMG-83 A	-	-	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-83 B	-	-	GEM	GEM	0,0	7%	0,0	5%	0,0	4%
	PMG-94 A	-	-	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-94 B	-	-	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-95 A	-	-	GEM	GEM	0,0	49%	0,0	42%	0,0	40%
	PMG-95 B	-	-	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-96 A	-	-	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-96 B	-	-	GEM	GEM	0,0	59%	0,0	55%	0,4	52%
PMG-97 A	-	-	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	
PMG-97 B	-	-	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,8	100%	
PMG-98 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-98 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	

DATA		23-jun-14		24-jun-14		25-jun-14		26-jun-14		27-jun-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75%LEL											
Incubadora	PMG-88 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-88 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%
	PMG-89 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-89 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-90 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-90 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-91 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-91 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-92 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-92 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-93 A	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
PMG-93 B	-	-	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
Laranjeira	PMG-99	Prédio Demolido									
	PMG-100										
	PMG-101										
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-104	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-105	-	-	0,0	3%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-106	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-107	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-108	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-109 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-109 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-110 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-110 B	-	-	0,0	19%	0,0	10%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-111 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
PMG-111 B	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-112 A	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	

DATA		14-jul-14		15-jul-14		16-jul-14		17-jul-14		18-jul-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000: maior ou igual 75%LEL											
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-16 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-17 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-17 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-18 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-18 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-20 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-20 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-22 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-22 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-23 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-23 B	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-113 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-113 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-114 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
PMG-114 B	0,0	100%	0,5	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	
PMG-115 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
PMG-115 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-14 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-21 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-21 B	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-15 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-15 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-13 A	0,0	0%	Obstruido		0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-13 B	0,0	0%			0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-19 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-19 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-11 A	0,0	2%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-11 B	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM
	PMG-12 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-12 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-24 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
PMG-24 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-25 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-26 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-26 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-27 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-27 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-28 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-28 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-29 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-29 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-44 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-44 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
PMG-45 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
PMG-45 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	

DATA		14-jul-14		15-jul-14		16-jul-14		17-jul-14		18-jul-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000: maior ou igual 75%LEL											
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-30 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-31 A	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-31 B	0,0	52%	0,8	47%	0,0	45%	0,0	46%	GEM	GEM
	PMG-32 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-32 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-33 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-33 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-34 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-34 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-35 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-35 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-36 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-36 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-37 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-37 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-38 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-38 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-39 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-39 B	0,5	47%	0,0	46%	0,0	42%	0,0	49%	GEM	GEM
	PMG-40 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-40 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-41 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-41 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-42 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-42 B	0,0	4%	0,8	4%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-43 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-43 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
Edifício I-4	PMG-63 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-63 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-64 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-64 B	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-65 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-65 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-66 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-66 B	GEM	GEM	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-67 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-67 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-68 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-68 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-69 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-69 B	GEM	GEM	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-77 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-77 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-78 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-78 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-79 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-79 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%
PMG-80 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-80 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-81 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-81 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	

DATA		14-jul-14		15-jul-14		16-jul-14		17-jul-14		18-jul-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000: maior ou igual 75%LEL											
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-46 B	0,0	2%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-47 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-47 B	0,0	2%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-48 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-48 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-49 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-49 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,3	100%
	PMG-50 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-50 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-51 A	0,0	4%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-51 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-52 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-52 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-53 A	0,0	13%	GEM	GEM	0,0	2%	0,0	9%	0,0	2%
	PMG-53 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-54 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-54 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-55 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-55 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-56 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-56 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-57 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-57 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,6	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-58 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-58 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-59 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-59 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-60 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-60 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-61 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-61 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,5	100%	0,0	100%	0,0	100%
PMG-62 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-62 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-01 B	0,5	9%	GEM	GEM	0,0	6%	0,0	4%	1,5	10%
	PMG-02 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-02 B	0,0	52%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%
	PMG-03 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-03 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,5	100%	0,0	100%
	PMG-04 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-04 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-05 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-05 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-06 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-06 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-07 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-07 B	0,0	8%	GEM	GEM	0,0	6%	0,0	5%	0,0	4%
	PMG-08 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-08 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%

DATA		14-jul-14		15-jul-14		16-jul-14		17-jul-14		18-jul-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000: maior ou igual 75%LEL											
Enfermaria	PMG-09 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%
	PMG-09 B	0,0	6%	GEM	GEM	0,0	4%	0,0	2%	0,8	2%
	PMG-10 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-10 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-84 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-84 B	0,0	35%	GEM	GEM	0,0	25%	0,0	21%	0,0	29%
	PMG-85 A	0,0	3%	GEM	GEM	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%
	PMG-85 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	51%	1,3	43%	0,7	35%
	PMG-86 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-86 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-87 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
PMG-87 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-70 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-71 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-71 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-72 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-72 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-73 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-73 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-74 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-74 B	0,6	12%	0,0	11%	0,0	12%	GEM	GEM	0,0	11%
	PMG-75 A	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	GEM	GEM	0,0	0%
PMG-75 B	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	GEM	GEM	0,0	0%	
PMG-76 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	
PMG-76 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	
CAT	PMG-82 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	15%
	PMG-82 B	GEM	GEM	0,0	4%	0,0	4%	0,0	5%	0,4	25%
	PMG-83 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	4%
	PMG-83 B	GEM	GEM	0,0	6%	0,5	3%	0,0	3%	0,7	17%
	PMG-94 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-94 B	GEM	GEM	0,0	2%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-95 A	GEM	GEM	0,0	60%	0,7	64%	0,0	56%	0,0	100%
	PMG-95 B	GEM	GEM	0,0	67%	0,0	55%	0,0	47%	0,0	42%
	PMG-96 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-96 B	GEM	GEM	0,4	36%	0,0	37%	0,0	36%	0,0	41%
	PMG-97 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
PMG-97 B	GEM	GEM	0,5	56%	0,0	56%	0,0	54%	0,0	25%	
PMG-98 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-98 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	

DATA		14-jul-14		15-jul-14		16-jul-14		17-jul-14		18-jul-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75%LEL											
Incubadora	PMG-88 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-88 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-89 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-89 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-90 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-90 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-91 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-91 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-92 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-92 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-93 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
PMG-93 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	
Laranjinh a	PMG-99	Prédio Demolido									
	PMG-100										
	PMG-101										
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-103			0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-104	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-105	0,8	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-106	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-107	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-108	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-109 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-109 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-110 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-110 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	2%	GEM	GEM
	PMG-111 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-111 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
PMG-112 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	

DATA		21-jul-14		22-jul-14		23-jul-14		24-jul-14		25-jul-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75%LEL											
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-16 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-17 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-17 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-18 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-18 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-20 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-20 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-22 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-22 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-23 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-23 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-113 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-113 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-114 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
PMG-114 B	0,0	40%	0,0	28%	0,0	26%	GEM	GEM	0,0	23%	
PMG-115 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	
PMG-115 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-14 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-21 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-21 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-15 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-15 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-13 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-13 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-19 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-19 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-11 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-11 B	0,0	100%	0,0	70%	0,6	72%	GEM	GEM	1,4	69%
	PMG-12 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-12 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
PMG-24 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	
PMG-24 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-25 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-26 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-26 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-27 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-27 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-28 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-28 B	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-29 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-29 B	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-44 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-44 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
PMG-45 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
PMG-45 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	

DATA		21-jul-14		22-jul-14		23-jul-14		24-jul-14		25-jul-14		
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-30 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-31 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-31 B	0,0	45%	0,0	45%	0,0	44%	0,0	35%	GEM	GEM	
	PMG-32 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-32 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-33 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-33 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-34 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-34 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-35 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-35 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-36 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-36 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-37 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-37 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-38 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-38 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-39 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-39 B	0,0	35%	0,3	38%	0,0	31%	0,0	32%	GEM	GEM	
	PMG-40 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-40 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-41 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-41 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
PMG-42 A	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM		
PMG-42 B	1,3	3%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	3%	GEM	GEM		
PMG-43 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM		
PMG-43 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-63 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
	PMG-64 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-64 B	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	
	PMG-65 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-65 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-66 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-66 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-67 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-67 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-68 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-68 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-69 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-69 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-77 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-77 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-78 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-78 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-79 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	PMG-79 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-80 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-80 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-81 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
PMG-81 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		

DATA		21-jul-14		22-jul-14		23-jul-14		24-jul-14		25-jul-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75%LEL											
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-46 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-47 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-47 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-48 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,2	0%
	PMG-48 B	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-49 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-49 B	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,4	100%
	PMG-50 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-50 B	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-51 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-51 B	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-52 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-52 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-53 A	0,0	11%	0,0	0%	GEM	GEM	2,0	0%	0,0	0%
	PMG-53 B	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-54 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-54 B	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-55 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-55 B	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-56 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-56 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-57 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-57 B	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-58 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-58 B	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-59 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-59 B	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-60 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-60 B	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%
	PMG-61 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-61 B	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,2	100%
PMG-62 A	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-62 B	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%	0,0	100%	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-01 B	0,0	2%	0,0	4%	0,0	8%	GEM	GEM	1,1	24%
	PMG-02 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-02 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,3	0%
	PMG-03 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-03 B	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%
	PMG-04 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-04 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-05 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-05 B	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%
	PMG-06 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-06 B	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%
	PMG-07 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-07 B	0,0	6%	0,0	2%	0,0	7%	GEM	GEM	0,2	6%
	PMG-08 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-08 B	0,0	100%	0,0	100%	0,0	100%	GEM	GEM	0,0	100%

DATA	21-jul-14		22-jul-14		23-jul-14		24-jul-14		25-jul-14		
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75%LEL											
Enfermaria	PMG-09 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-09 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-10 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-10 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-84 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,5	0%
	PMG-84 B	0,0	35%	0,0	36%	0,0	35%	GEM	GEM	0,7	10%
	PMG-85 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,2	0%
	PMG-85 B	0,0	20%	0,0	15%	0,0	12%	GEM	GEM	1,3	9%
	PMG-86 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-86 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-87 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-87 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%
	PMG-70 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-70 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-71 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-71 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-72 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-72 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-73 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-73 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
PMG-74 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-74 B	0,0	9%	GEM	GEM	0,0	7%	0,0	6%	0,7	5%	
PMG-75 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-75 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-76 A	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-76 B	0,0	0%	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
CAT	PMG-82 A	GEM	GEM	0,0	7%	0,0	6%	0,0	6%	0,0	6%
	PMG-82 B	GEM	GEM	0,4	6%	0,0	9%	0,0	9%	0,2	9%
	PMG-83 A	GEM	GEM	0,0	4%	0,0	4%	0,0	6%	0,1	0%
	PMG-83 B	GEM	GEM	0,0	20%	0,0	19%	0,6	20%	0,6	19%
	PMG-94 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-94 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-95 A	GEM	GEM	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-95 B	GEM	GEM	0,0	38%	0,0	22%	0,6	15%	0,5	14%
	PMG-96 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-96 B	GEM	GEM	0,0	42%	0,0	36%	0,0	31%	0,0	22%
	PMG-97 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	PMG-97 B	GEM	GEM	0,0	6%	0,0	7%	0,8	6%	0,2	6%
PMG-98 A	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
PMG-98 B	GEM	GEM	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	

DATA		21-jul-14		22-jul-14		23-jul-14		24-jul-14		25-jul-14	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada; (GEM) Medição realizada com GEM 5000; maior ou igual 75%LEL											
Incubadora	PMG-88 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-88 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-89 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-89 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-90 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-90 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-91 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-91 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-92 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-92 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
Laranjinh ^a	PMG-93 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-93 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-99	Prédio Demolido									
PMG-100											
PMG-101											
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-103	0,0	0%			0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-104	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-105	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-106	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-107	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-108	0,8	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-109 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	Obstruído		GEM	GEM
	PMG-109 B	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%			GEM	GEM
	PMG-110 A	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
	PMG-110 B	0,0	0%	0,4	0%	0,0	9%	0,0	3%	GEM	GEM
	PMG-111 A	Obstruído		0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM
PMG-111 B	0,0			0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	
PMG-112 A	0,0			0%	0,0	0%	0,0	0%	GEM	GEM	

ANEXO III – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS GEM 5000 (JUL/14)

DATA		Semana 1: 24/06 a 27/06/2014								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-16 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-17 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-17 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-18 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-18 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-20 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-20 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-22 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-22 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-23 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-23 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-113 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-113 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0	0	79,0%	-0,08	
	PMG-114 B	11,0%	11,0%	8,4%	1,7%	0	0	78,9%	0,02	
PMG-115 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-115 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-14 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-21 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-21 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-15 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-15 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-13 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-13 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-19 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-19 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,2%	0	0	79,7%	-0,13	
	PMG-11 B	14,2%	17,1%	8,4%	2,6%	0	0	74,3%	0,22	
	PMG-12 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-12 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-24 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-24 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
I-3 Auditórios	PMG-25 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-25 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-26 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-26 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-27 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-27 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-28 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-28 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-29 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-29 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-44 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-44 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMG-45 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-45 B	-	-	-	-	-	-	-	-		

DATA		Semana 1: 24/06 a 27/06/2014								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-30 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	0	0	79,6%	-0,02	
	PMG-31 B	21,2%	42,0%	11,7%	4,7%	1	0	62,4%	0,09	
	PMG-32 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-32 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-33 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-33 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-34 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-34 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-35 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-35 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-36 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-36 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-37 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-37 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-38 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-38 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0	0	79,0%	-0,11	
	PMG-39 B	3,3%	5,2%	8,1%	12,7%	0	0	75,9%	0,04	
PMG-40 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-40 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-41 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-41 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-42 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0	0	79,3%	-0,04		
PMG-42 B	0,4%	0,4%	9,5%	8,7%	0	0	81,4%	-0,03		
PMG-43 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-43 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
Edifício I-4	PMG-63 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-63 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,3%	0	0	78,6%	0,03	
	PMG-64 B	4,0%	7,0%	4,2%	12,0%	0	0	79,8%	0,02	E
	PMG-65 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-65 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0	0	78,4%	0,07	
	PMG-66 B	0,0%	0,0%	12,7%	8,8%	0	0	78,5%	-0,09	
	PMG-67 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-67 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-68 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-68 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0	0	79,0%	-0,01	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	8,7%	11,0%	0	0	80,3%	-0,05	
	PMG-77 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-77 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-78 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-78 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-79 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-79 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMG-80 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-80 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-81 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-81 B	-	-	-	-	-	-	-	-		

DATA		Semana 1: 24/06 a 27/06/2014								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-46 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-47 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-47 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,0%	0	0	79,9%	0,04	
	PMG-48 B	12,1%	19,9%	3,9%	10,1%	0	0	73,9%	0,09	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	0	0	79,6%	0,08	
	PMG-49 B	1,9%	1,9%	11,9%	3,2%	0	0	83,0%	0,31	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	0,02	
	PMG-50 B	13,0%	17,2%	6,1%	14,4%	0	0	66,5%	0,15	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0	0	79,1%	0,04	
	PMG-51 B	11,9%	15,7%	3,7%	15,2%	0	0	69,2%	0,01	
	PMG-52 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-52 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,1%	0	0	79,8%	-0,12	
	PMG-53 B	1,7%	6,0%	2,5%	14,9%	0	0	80,9%	-0,13	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0	0	79,4%	-0,08	
	PMG-54 B	10,2%	17,2%	7,9%	2,7%	0	0	79,2%	0,17	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	-0,25	
	PMG-55 B	52,3%	52,3%	17,2%	2,9%	2	0	27,6%	0,17	
	PMG-56 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-56 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,8%	0	0	78,0%	-0,05	
	PMG-57 B	19,0%	19,0%	12,2%	2,9%	0	0	65,9%	-0,10	
PMG-58 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-58 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0	0	78,5%	-0,04		
PMG-59 B	7,2%	46,1%	4,8%	15,2%	0	0	72,8%	-0,06		
PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0	0	78,4%	0,06		
PMG-60 B	3,0%	3,0%	11,1%	1,7%	0	0	84,2%	0,17	E	
PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0	0	78,9%	-0,09		
PMG-61 B	12,1%	26,5%	6,1%	10,2%	0	0	71,6%	0,07		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,1%	22,1%	0	0	77,8%	0,07		
PMG-62 B	15,0%	15,0%	14,3%	3,2%	0	1	67,5%	0,21	E	

DATA		Semana 1: 24/06 a 27/06/2014								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	0	0	79,5%	-0,02	
	PMG-01 B	22,1%	32,2%	9,2%	3,4%	0	0	65,3%	-0,21	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0	0	79,2%	-0,01	
	PMG-02 B	27,0%	27,0%	7,4%	2,9%	0	0	62,7%	-0,27	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,2%	0	0	78,0%	0,02	
	PMG-03 B	35,0%	42,7%	12,8%	0,9%	0	0	51,3%	-0,05	
	PMG-04 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-04 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,2%	0	0	79,7%	0,02	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,1%	0	0	78,8%	-0,03	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0	0	79,7%	0,01	
	PMG-06 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	0	0	78,6%	0,07	A
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	0	0	79,6%	0,06	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	0	0	79,6%	-0,04	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0	0	79,4%	-0,06	
	PMG-08 B	2,3%	25,1%	9,7%	9,8%	0	0	78,2%	-0,05	
	PMG-09 A	0,0%	0,1%	13,8%	6,1%	0	0	80,1%	-1,34	
	PMG-09 B	4,4%	4,4%	15,6%	2,8%	0	0	77,2%	-0,78	
	PMG-10 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-10 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enfermaria	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0	0	78,8%	-0,04	
	PMG-84 B	1,6%	1,6%	10,4%	6,2%	0	0	81,8%	-0,03	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	2,9%	15,9%	0	0	81,2%	-0,16	
	PMG-85 B	0,5%	0,5%	10,5%	0,2%	0	0	88,8%	-0,20	
	PMG-86 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-86 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-87 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-87 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-70 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-70 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,0%	21,3%	0	0	78,7%	-0,08	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	2,6%	0,5%	0	0	96,9%	-0,02	
	PMG-72 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-72 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-73 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-73 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0	0	78,8%	-0,02		
PMG-74 B	1,3%	1,3%	0,4%	0,1%	4	0	98,3%	-0,48		
PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0	0	79,1%	-0,16		
PMG-75 B	0,0%	0,0%	4,6%	0,7%	0	0	94,7%	-0,17		
PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,2%	0	0	78,7%	-0,11		
PMG-76 B	0,0%	0,0%	3,4%	14,8%	0	0	81,8%	-0,05		

DATA		Semana 1: 24/06 a 27/06/2014								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
CAT	PMG-82 A	0,0%	0,0%	12,6%	6,1%	0	0	81,3%	-0,05	
	PMG-82 B	0,3%	0,3%	11,4%	8,1%	0	0	80,2%	-0,12	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	8,2%	11,0%	0	0	80,8%	-0,10	
	PMG-83 B	0,6%	0,6%	14,1%	4,1%	0	0	81,2%	-0,04	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0	0	78,8%	-0,04	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	18,0%	0,3%	0	0	81,6%	-0,03	
	PMG-95 A	1,6%	1,6%	7,2%	2,5%	0	0	88,7%	0,09	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	12,1%	3,7%	0	0	84,2%	-17,53	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0	0	79,3%	-0,04	
	PMG-96 B	2,9%	2,9%	9,2%	0,3%	0	0	87,6%	0,08	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	0	0	79,7%	0,01	
	PMG-97 B	4,9%	4,9%	14,8%	0,1%	3	0	80,1%	-0,03	
PMG-98 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-98 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
Incubadora	PMG-88 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-88 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-89 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-89 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-90 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-90 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-91 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-91 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-92 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-92 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ginásio Poliesportivo	PMG-93 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-93 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-105	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-106	Obstruído por andaime								
	PMG-107	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-108	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-109 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMG-109 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	-0,11	
	PMG-110 B	2,6%	2,6%	7,2%	2,0%	0	0	88,2%	0,07	
	PMG-111 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-111 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-112	-	-	-	-	-	-	-	-	

DATA		Semana 3: 07/07 a 11/07								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	8,7%	13,6%	0,0	0,0	77,7%	-0,20	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	11,5%	10,6%	0,0	0,0	77,9%	-0,11	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	5,5%	16,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,27	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	4,8%	16,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,14	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0,0	0,0	78,8%	-2,97	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	6,2%	13,8%	0,0	0,0	80,0%	-2,94	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,6%	0,0	0,0	78,1%	-0,06	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,2%	0,0	0,0	78,0%	0,07	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,5%	0,0	0,0	78,2%	-0,01	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	8,2%	16,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,2%	0,0	0,0	78,1%	-1,60	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	3,4%	18,8%	0,0	0,0	79,9%	-0,31	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	0,02	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	3,0%	18,1%	0,0	0,0	78,9%	-0,35	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,04	
	PMG-114 B	0,2%	4,3%	0,2%	21,2%	0,0	0,0	78,4%	0,27	
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,6%	0,0	0,0	78,3%	-0,03	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,6%	19,2%	0,0	0,0	78,2%	-0,06	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,14	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	6,5%	12,8%	0,0	0,0	80,7%	-0,11	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,08	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	5,7%	15,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,16	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,03	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	0,1%	21,8%	0,0	0,0	78,1%	0,05	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,7%	0,0	0,0	78,2%	0,02	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	17,0%	19,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,07	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,5%	0,0	0,0	77,8%	-0,17	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	2,0%	20,0%	0,0	0,0	77,6%	-0,15	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	3,0%	18,6%	0,0	0,0	78,4%	-0,15	
	PMG-11 B	4,1%	4,4%	11,6%	5,6%	2,0	0,0	78,7%	-0,09	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	8,8%	14,2%	0,0	0,0	77,0%	-0,15	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	8,5%	13,3%	0,0	0,0	78,2%	0,06	
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,5%	19,5%	0,0	0,0	78,0%	0,07	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	3,8%	18,2%	0,0	0,0	78,0%	-0,03	
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,8%	0,0	0,0	78,1%	0,01	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	4,7%	18,8%	0,0	0,0	76,5%	0,04	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,6%	0,0	0,0	78,2%	0,01	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	5,1%	17,2%	0,0	0,0	77,7%	0,02	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,01	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	3,8%	19,1%	0,0	0,0	77,1%	0,01	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,7%	0,0	0,0	78,1%	0,00	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	4,7%	18,9%	0,0	0,0	76,4%	-0,01	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,7%	0,0	0,0	78,1%	0,02	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	5,7%	17,3%	0,0	0,0	77,0%	0,04	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	0,03	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	4,7%	17,2%	0,0	0,0	78,1%	-0,01	
PMG-45 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0,0	0,0	78,4%	-0,01		
PMG-45 B	0,0%	0,0%	3,2%	19,7%	0,0	0,0	77,1%	0,02		

DATA		Semana 3: 07/07 a 11/07								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	0,03	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	10,8%	8,0%	0,0	0,0	81,2%	-0,07	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,11	
	PMG-31 B	1,6%	2,3%	13,5%	3,7%	0,0	0,0	81,2%	0,11	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,02	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	9,8%	9,9%	0,0	0,0	80,3%	-0,03	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	0,03	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	11,8%	6,4%	0,0	0,0	81,3%	-0,01	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,03	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	4,1%	16,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,02	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	0,09	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	3,6%	16,4%	0,0	0,0	79,5%	0,03	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,09	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	14,8%	2,9%	0,0	0,0	82,3%	-3,61	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	-0,08	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	4,3%	17,7%	0,0	0,0	78,7%	0,10	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	0,03	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,4%	0,0	0,0	78,8%	0,03	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,04	
	PMG-39 B	1,9%	2,1%	12,5%	4,5%	1,0	0,0	81,1%	0,01	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	0,01	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,02	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,3%	0,0	0,0	78,6%	0,05	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,01	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	2,5%	18,1%	0,0	0,0	79,4%	0,06	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	14,6%	1,6%	0,0	0,0	83,8%	-0,04	
PMG-43 A	0,0%	0,0%	3,1%	18,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,61		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	0,1%	21,3%	0,0	0,0	78,6%	0,04		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,04	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	3,8%	16,4%	0,0	0,0	79,8%	0,03	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,3%	0,0	0,0	78,6%	0,08	
	PMG-64 B	2,3%	7,4%	1,5%	18,2%	0,0	0,0	78,0%	0,03	
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,3%	0,0	0,0	78,6%	0,03	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	3,7%	16,7%	0,0	0,0	79,6%	0,11	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,01	
	PMG-66 B	3,5%	0,0%	10,9%	11,4%	0,0	0,0	74,2%	0,00	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,2%	0,0	0,0	78,7%	0,01	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	3,0%	16,8%	0,0	0,0	80,2%	0,01	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0,0	0,0	78,7%	0,06	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	0,0	0,0	78,8%	0,08	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	0,12	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	7,4%	13,3%	0,0	0,0	79,3%	0,02	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,04	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	4,4%	15,4%	0,0	0,0	79,7%	-0,02	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,01	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	4,3%	16,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,08	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	0,08	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,01		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,2%	0,0	0,0	79,5%	0,02		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	10,0%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,03		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	2,1%	17,9%	0,0	0,0	80,0%	-0,02		

DATA		Semana 3: 07/07 a 11/07								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,06	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	9,9%	7,5%	0,0	0,0	82,6%	-0,08	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	0,02	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	8,6%	11,1%	0,0	0,0	80,3%	0,09	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,09	
	PMG-48 B	28,2%	31,5%	5,9%	5,0%	0,0	0,0	60,9%	-0,20	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,11	
	PMG-49 B	1,0%	8,7%	1,1%	19,6%	0,0	0,0	78,3%	0,05	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	-0,04	
	PMG-50 B	13,3%	39,9%	7,8%	11,7%	0,0	8,0	67,2%	0,03	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	0,04	
	PMG-51 B	28,5%	29,3%	8,8%	3,0%	0,0	0,0	59,7%	-0,07	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,07	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	-0,01	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,18	
	PMG-53 B	8,5%	13,9%	6,4%	8,8%	0,0	1,0	76,3%	-0,07	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,14	
	PMG-54 B	8,4%	26,7%	8,4%	0,9%	0,0	0,0	82,3%	-0,05	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,01	
	PMG-55 B	59,0%	59,0%	19,0%	1,8%	3,0	0,0	20,2%	0,07	
	PMG-56 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-56 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	0,01	
	PMG-57 B	17,6%	18,3%	11,9%	4,9%	0,0	0,0	65,6%	0,04	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,03	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	6,8%	11,4%	0,0	0,0	81,8%	0,05	
	PMG-59 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-59 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMG-60 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-60 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-61 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-61 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,07		
PMG-62 B	20,5%	26,4%	10,5%	7,1%	0,0	0,0	61,9%	-0,01		

DATA		Semana 3: 07/07 a 11/07									
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.	
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água											
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	0,09		
	PMG-01 B	2,0%	2,3%	11,2%	8,4%	0,0	2,0	78,2%	0,10		
	PMG-02 O	0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0,0	0,0	78,4%	0,00		
	PMG-02 B	2,1%	2,7%	11,2%	4,3%	3,0	0,0	83,3%	-0,11		
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,04		
	PMG-03 B	18,1%	40,5%	1,7%	17,1%	0,0	0,0	63,1%	0,00		
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,3%	0,0	0,0	78,1%	-0,01		
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	0,02		
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	0,02		
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,10	A	
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	0,06		
	PMG-06 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,88	A	
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	0,07		
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	1,62	A	
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,03		
	PMG-08 B	3,7%	17,6%	11,7%	5,7%	0,0	1,0	78,9%	-0,08		
	PMG-09 A	2,9%	3,1%	14,1%	4,9%	0,0	0,0	78,1%	-2,12		
	PMG-09 B	8,8%	8,8%	16,2%	1,8%	1,0	0,0	73,2%	-1,15		
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	2,2%	17,7%	0,0	0,0	80,1%	-0,02		
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	0,1%	21,8%	0,0	0,0	78,1%	-0,04		
PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,4%	0,0	0,0	78,3%	0,03			
PMG-84 B	1,0%	1,3%	7,2%	11,6%	0,0	0,0	80,2%	-0,04			
PMG-85 A	0,2%	0,2%	1,9%	18,0%	0,0	0,0	79,9%	-0,05			
PMG-85 B	2,8%	2,8%	2,9%	15,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,23			
PMG-86 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,4%	0,0	0,0	79,8%	-0,01			
PMG-86 B	0,0%	0,0%	2,6%	15,4%	0,0	0,0	82,0%	0,08			
PMG-87 A	0,0%	0,0%	1,8%	9,5%	0,0	0,0	88,7%	0,12			
PMG-87 B	0,0%	0,0%	3,4%	12,5%	0,0	0,0	84,1%	0,03			
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,60		
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,9%	17,5%	0,0	0,0	81,6%	-0,05		
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,0%	21,6%	0,0	0,0	78,4%	-0,10		
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	3,6%	4,4%	0,0	0,0	92,0%	-0,01		
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,6%	0,0	0,0	78,3%	-0,14		
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,2%	18,3%	0,0	0,0	80,5%	-0,21		
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	0,05		
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,7%	17,6%	0,0	0,0	81,7%	-0,06		
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	0,05		
	PMG-74 B	0,3%	0,3%	0,5%	0,3%	3,0	0,0	98,9%	-0,20		
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,24		
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	4,4%	0,2%	0,0	0,0	95,4%	-0,14		
PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,14			
PMG-76 B	0,0%	0,0%	2,3%	17,1%	0,0	0,0	80,6%	0,02			

DATA		Semana 3: 07/07 a 11/07									
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.	
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água											
CAT	PMG-82 A	0,0%	0,0%	8,3%	11,8%	0,0	0,0	79,9%	-0,04		
	PMG-82 B	0,6%	0,8%	13,9%	5,6%	0,0	0,0	79,9%	0,01		
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	5,9%	14,3%	0,0	0,0	79,8%	0,02		
	PMG-83 B	0,2%	0,2%	12,2%	6,7%	0,0	0,0	80,9%	0,06		
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-1,42		
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	18,3%	0,2%	0,0	0,0	81,5%	-0,49		
	PMG-95 A	1,3%	1,3%	5,8%	6,9%	0,0	0,0	86,0%	-0,06		
	PMG-95 B	6,0%	6,1%	13,2%	0,6%	0,0	0,0	80,2%	-1,10		
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,13		
	PMG-96 B	2,3%	2,3%	9,4%	0,8%	0,0	0,0	87,5%	0,06		
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	0,02		
	PMG-97 B	3,8%	3,8%	15,1%	0,1%	3,0	0,0	81,0%	-0,02		
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,03		
PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,3%	20,1%	0,0	0,0	78,6%	0,03			
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0,0	0,0	78,4%	-0,03		
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,03		
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,06		
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,1%	18,5%	0,0	0,0	78,4%	0,03		
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,30		
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	1,7%	20,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,09		
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	0,10		
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	2,7%	19,5%	0,0	0,0	77,8%	-0,05		
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0,0	0,0	78,4%	0,02		
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	3,2%	18,5%	0,0	0,0	78,3%	-0,11		
PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,39			
PMG-93 B	0,0%	0,0%	4,0%	17,7%	0,0	0,0	78,3%	0,03			
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,2%	21,6%	0,0	0,0	78,2%	0,02		
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	-0,01		
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,7%	21,2%	0,0	0,0	78,1%	0,01		
	PMG-105	0,0%	0,0%	4,8%	15,7%	0,0	0,0	79,5%	0,01		
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,3%	21,7%	0,0	0,0	78,0%	-0,39		
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0,0	0,0	78,4%	0,07		
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,1%	21,2%	0,0	0,0	78,7%	0,05		
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,6%	0,0	0,0	78,3%	0,04		
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,1%	21,7%	0,0	0,0	78,2%	0,09		
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,8%	0,0	0,0	78,1%	0,03		
	PMG-110 B	8,1%	8,4%	2,1%	14,6%	0,0	0,0	75,2%	0,05		
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,07		
PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,5%	0,0	0,0	78,2%	-0,14	A		
PMG-112	0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0,0	0,0	78,4%	-0,01			

DATA		Semana 4: 14/07 a 18/07									
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.	
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água											
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	7,1%	14,7%	0,0	0,0	78,2%	-0,02		
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	9,1%	12,3%	0,0	0,0	77,8%	0,07		
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	6,7%	13,2%	0,0	0,0	80,1%	-0,01		
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	7,9%	11,8%	0,0	0,0	80,3%	-0,05		
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	0,09		
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	6,8%	12,7%	0,0	0,0	80,5%	-0,03		
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	0,04		
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,01		
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	0,00		
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	8,4%	11,8%	0,0	0,0	79,8%	-0,06		
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,04		
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	0,03		
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,09		
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	2,8%	17,6%	0,0	0,0	79,6%	0,20		
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	0,01		
	PMG-114 B	12,6%	12,6%	7,9%	13,2%	0,0	0,0	66,4%	-0,31	A	
PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,01			
PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,9%	18,0%	0,0	0,0	79,1%	-0,07			
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	11,9%	4,1%	0,0	0,0	84,0%	0,03		
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	6,0%	12,4%	0,0	0,0	81,4%	0,02		
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	2,9%	17,5%	0,0	0,0	79,6%	-0,01		
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	6,0%	14,2%	0,0	0,0	79,8%	0,00		
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	0,09		
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,13		
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,3%	0,0	0,0	79,4%	0,11		
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	3,7%	16,8%	0,0	0,0	79,5%	-0,09		
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,06		
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	0,0	78,9%	0,01		
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,02		
	PMG-11 B	5,1%	5,1%	15,2%	0,1%	2,0	0,0	79,6%	-0,07		
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	7,6%	12,3%	0,0	0,0	80,1%	0,01		
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	9,5%	10,3%	0,0	0,0	80,2%	-0,02		
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,7%	0,0	0,0	79,7%	-0,02		
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	3,5%	16,7%	0,0	0,0	79,8%	0,04		
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,01		
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	3,9%	16,8%	0,0	0,0	79,3%	0,04		
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,07		
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	3,2%	16,7%	0,0	0,0	80,3%	0,01		
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	3,7%	12,8%	0,0	0,0	83,5%	0,00		
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	12,5%	2,8%	0,0	0,0	84,7%	0,01		
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,8%	16,0%	0,0	0,0	81,2%	-0,03		
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	11,3%	6,2%	0,0	0,0	82,5%	0,04		
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,9%	-0,06		
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,9%	16,6%	0,0	0,0	79,5%	0,11		
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	3,3%	15,7%	0,0	0,0	80,8%	-0,09		
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	4,2%	14,6%	0,0	0,0	81,2%	-0,10		
PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,4%	0,0	0,0	79,3%	0,02			
PMG-45 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,3%	0,0	0,0	79,8%	0,01			

DATA		Semana 4: 14/07 a 18/07								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,06	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	11,3%	6,7%	0,0	0,0	82,0%	-0,01	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,02	
	PMG-31 B	2,8%	2,8%	15,9%	0,2%	0,0	0,0	81,1%	0,04	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	0,01	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	8,9%	10,8%	0,0	0,0	80,3%	0,07	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	0,0	0,0	79,6%	-0,01	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	14,0%	4,0%	0,0	0,0	82,0%	-0,03	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,11	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	2,8%	18,0%	0,0	0,0	79,2%	0,04	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	0,0	0,0	79,6%	-0,06	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	4,1%	16,4%	0,0	0,0	79,5%	0,02	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,03	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	14,1%	3,2%	0,0	0,0	82,7%	-0,02	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0,0	0,0	79,7%	0,01	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	4,0%	17,1%	0,0	0,0	78,9%	0,07	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	0,06	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	2,1%	18,9%	0,0	0,0	79,0%	0,05	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,03	
	PMG-39 B	2,1%	2,4%	15,3%	0,1%	1,0	0,0	82,5%	0,01	
PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,2%	0,0	0,0	79,7%	0,02		
PMG-40 B	0,0%	0,0%	17,0%	20,1%	0,0	0,0	78,2%	-0,01		
PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	0,00		
PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,02		
PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,2%	15,2%	0,0	0,0	81,1%	-0,02		
PMG-42 B	0,1%	1,7%	15,2%	0,1%	0,0	0,0	84,6%	0,04		
PMG-43 A	0,0%	0,0%	2,9%	17,6%	0,0	0,0	79,5%	0,04		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,02		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	0,00	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	5,0%	13,7%	0,0	0,0	81,3%	0,03	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	0,02	
	PMG-64 B	11,1%	19,1%	5,5%	9,8%	0,0	0,0	73,6%	-0,42	E
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	0,09	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	6,3%	13,6%	0,0	0,0	80,1%	0,08	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	0,03	
	PMG-66 B	0,0%	0,0%	10,3%	13,9%	0,0	0,0	75,8%	0,04	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,07	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	6,2%	13,7%	0,0	0,0	80,1%	0,03	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,06	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0,0	0,0	78,6%	0,03	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,2%	0,0	0,0	78,7%	0,01	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	10,0%	10,7%	0,0	0,0	79,3%	-0,10	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	0,20	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	5,9%	12,5%	0,0	0,0	81,6%	0,00	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,0%	21,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,03	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	6,1%	15,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,07	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	0,03	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	0,0	0,0	78,5%	0,03	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,3%	0,0	0,0	78,6%	0,01		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,0%	0,0	0,0	78,9%	0,02		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,02		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,03		

DATA		Semana 4: 14/07 a 18/07								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,09	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	8,2%	10,5%	0,0	0,0	81,3%	-0,01	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	-0,10	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	7,9%	11,8%	0,0	0,0	80,3%	0,03	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,06	
	PMG-48 B	20,1%	26,2%	4,8%	8,5%	0,0	0,0	66,6%	-0,04	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	0,01	
	PMG-49 B	11,2%	11,6%	11,7%	2,7%	0,0	0,0	74,4%	-0,20	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	-0,09	
	PMG-50 B	25,4%	29,5%	12,0%	3,0%	0,0	0,0	59,6%	0,03	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,16	
	PMG-51 B	23,4%	26,1%	7,2%	6,3%	0,0	0,0	63,1%	0,03	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,5%	0,0	0,0	78,4%	0,04	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,02	
	PMG-53 A	0,2%	0,2%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,02	
	PMG-53 B	21,6%	21,7%	9,9%	0,4%	0,0	0,0	68,0%	-0,14	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,10	
	PMG-54 B	19,2%	19,3%	7,5%	8,0%	0,0	0,0	65,3%	-0,01	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	0,03	
	PMG-55 B	31,2%	34,7%	10,4%	10,4%	1,0	0,0	48,0%	0,05	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,05	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	4,5%	14,3%	0,0	0,0	81,2%	-1,37	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,03	
	PMG-57 B	18,7%	18,7%	14,0%	1,4%	0,0	0,0	65,9%	0,00	
PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,01		
PMG-58 B	0,0%	0,0%	7,0%	11,6%	0,0	0,0	81,4%	0,00		
PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,04		
PMG-59 B	8,1%	39,4%	5,0%	16,3%	0,0	2,0	70,6%	-0,01		
PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,52		
PMG-60 B	14,9%	14,9%	10,1%	0,6%	0,0	0,0	74,4%	0,05		
PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	0,03		
PMG-61 B	14,1%	14,1%	12,4%	0,2%	1,0	0,0	73,3%	0,07		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,03		
PMG-62 B	24,8%	25,0%	15,0%	0,9%	0,0	0,0	59,3%	0,05		

DATA		Semana 4: 14/07 a 18/07								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,08	
	PMG-01 B	0,5%	0,5%	13,6%	4,4%	0,0	0,0	81,5%	-0,06	
	PMG-02 O	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	-0,04	
	PMG-02 B	0,7%	0,7%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,07	A
	PMG-03 A	0,0%	0,1%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,26	
	PMG-03 B	38,1%	70,1%	4,1%	10,7%	0,0	0,0	47,1%	0,10	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,04	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,05	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,4%	0,02	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,11	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	0,06	
	PMG-06 B	0,0%	0,0%	0,2%	21,8%	0,0	0,0	78,0%	-0,03	A
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,7%	0,0	0,0	78,1%	0,01	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,2%	21,7%	0,0	0,0	78,1%	-0,21	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,0%	0,0	0,0	79,7%	0,01	
	PMG-08 B	5,2%	6,1%	11,8%	5,1%	0,0	0,0	77,9%	0,02	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	10,2%	8,8%	0,0	0,0	81,1%	0,00	
	PMG-09 B	0,3%	0,3%	14,4%	2,3%	0,0	0,0	83,0%	-1,23	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	2,2%	17,2%	0,0	0,0	80,6%	-0,07	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	6,2%	11,9%	0,0	0,0	81,9%	-0,05	
PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	0,07		
PMG-84 B	1,8%	2,2%	13,2%	2,9%	0,0	0,0	82,1%	0,09		
PMG-85 A	0,0%	0,0%	5,7%	10,7%	0,0	0,0	83,6%	-1,83		
PMG-85 B	3,3%	3,3%	9,9%	0,0%	0,0	0,0	86,8%	-1,55		
PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,0%	0,0	0,0	80,0%	-1,03		
PMG-86 B	0,0%	0,0%	2,5%	16,2%	0,0	0,0	81,4%	-0,02		
PMG-87 A	0,0%	0,0%	2,9%	7,7%	0,0	0,0	89,4%	0,00		
PMG-87 B	0,0%	0,0%	6,4%	8,6%	0,0	0,0	85,0%	0,03		
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	0,05	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,6%	18,6%	0,0	0,0	80,8%	-0,02	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,0%	20,5%	0,0	0,0	79,5%	0,00	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	3,3%	0,7%	0,0	0,0	96,0%	-0,02	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,19	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,1%	17,3%	0,0	0,0	81,6%	-0,09	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	0,02	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,2%	0,0	0,0	80,2%	0,05	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0,0	0,0	79,7%	-0,05	
	PMG-74 B	0,5%	0,5%	0,5%	0,2%	2,0	0,0	98,8%	0,09	
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,09	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	5,0%	0,4%	0,0	0,0	94,6%	-0,07	
PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,04		
PMG-76 B	0,0%	0,0%	2,0%	17,1%	0,0	0,0	80,9%	-0,03		

DATA		Semana 4: 14/07 a 18/07									
POÇOS		CH ₄	Pico CH ₄	CO ₂	O ₂	H ₂ S	CO	BAL	Pressão	OBS.	
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)	(mbar)		
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água											
CAT	PMG-82	A	0,0%	0,0%	9,7%	10,1%	0,0	0,0	80,2%	-0,01	
	PMG-82	B	0,1%	0,1%	18,5%	0,2%	0,0	0,0	81,3%	-0,03	
	PMG-83	A	0,0%	0,0%	5,5%	14,9%	0,0	0,0	79,6%	-0,06	
	PMG-83	B	0,1%	0,1%	16,5%	1,5%	0,0	0,0	81,9%	0,03	
	PMG-94	A	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,02	
	PMG-94	B	0,0%	0,0%	18,0%	0,5%	0,0	0,0	81,5%	-0,03	
	PMG-95	A	4,0%	4,0%	8,3%	0,3%	0,0	0,0	87,4%	0,01	
	PMG-95	B	4,2%	4,2%	11,9%	2,4%	0,0	0,0	81,5%	0,08	
	PMG-96	A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	0,02	
	PMG-96	B	1,8%	1,8%	9,9%	0,0%	0,0	0,0	88,3%	0,01	
	PMG-97	A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,05	
	PMG-97	B	3,2%	3,2%	15,2%	0,0%	3,0	0,0	81,6%	-0,20	
	PMG-98	A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,03	
	PMG-98	B	0,0%	0,0%	1,2%	20,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,03	
Incubadora	PMG-88	A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	0,00	
	PMG-88	B	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	0,03	
	PMG-89	A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,13	
	PMG-89	B	0,0%	0,0%	3,3%	18,7%	0,0	0,0	78,0%	0,04	
	PMG-90	A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,09	
	PMG-90	B	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,11	
	PMG-91	A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,05	
	PMG-91	B	0,0%	0,0%	2,4%	18,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,05	
	PMG-92	A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	0,01	
	PMG-92	B	0,0%	0,0%	2,5%	18,4%	0,0	0,0	79,1%	0,07	
	PMG-93	A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
PMG-93	B	0,0%	0,0%	3,0%	17,8%	0,0	0,0	79,3%	0,01		
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	0,01	
	PMG-103		0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,02	
	PMG-104		0,0%	0,0%	0,2%	21,4%	0,0	0,0	78,4%	0,05	
	PMG-105		0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	0,02	
	PMG-106		0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,2%	-0,01	
	PMG-107		0,0%	0,0%	6,2%	12,9%	0,0	0,0	80,9%	-0,03	
	PMG-108		0,0%	0,0%	2,1%	18,6%	0,0	0,0	79,3%	0,07	
	PMG-109	A	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,01	
	PMG-109	B	0,0%	0,0%	4,9%	16,2%	0,0	0,0	78,9%	0,02	
	PMG-110	A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	0,02	
	PMG-110	B	3,2%	3,2%	4,2%	15,7%	0,0	0,0	76,9%	-0,04	
	PMG-111	A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	0,01	
	PMG-111	B	0,0%	0,0%	2,7%	18,2%	0,0	0,0	79,1%	0,02	
PMG-112		0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,03		

DATA		Semana 5: 21/07/2014 a 25/07/2014								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	7,0%	14,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,03	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	9,2%	12,7%	0,0	0,0	77,1%	0,04	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	6,2%	13,7%	0,0	0,0	80,1%	-0,04	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	7,8%	11,0%	0,0	0,0	80,2%	-0,02	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	0,04	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	6,4%	12,0%	0,0	0,0	80,6%	-0,09	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	0,0	0,0	79,5%	0,01	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,1%	0,0	0,0	79,0%	-0,02	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	0,02	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	8,3%	11,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,07	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,4%	0,05	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	0,02	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,04	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	3,0%	17,0%	0,0	0,0	80,0%	0,06	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,13	
	PMG-114 B	0,0%	2,6%	0,4%	20,0%	0,0	0,0	79,6%	-0,14	
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,02	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,1%	0,0	0,0	79,2%	0,03	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	10,9%	3,1%	0,0	0,0	82,0%	0,02	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	6,1%	12,7%	0,0	0,0	81,2%	0,02	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	2,6%	17,4%	0,0	0,0	80,0%	-0,04	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	6,8%	12,7%	0,0	0,0	80,5%	0,09	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-1,00	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	0,0	78,9%	0,63	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	0,0	0,0	79,2%	0,07	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	3,2%	16,0%	0,0	0,0	79,8%	-0,08	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	0,00	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,01	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,1%	0,0	0,0	79,9%	-0,21	
	PMG-11 B	4,1%	4,1%	15,3%	0,1%	1,0	0,0	80,5%	0,02	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	7,0%	12,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,04	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	9,1%	10,0%	0,0	0,0	79,9%	0,02	
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	1,5%	18,0%	0,0	0,0	79,5%	0,01	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	3,4%	16,6%	0,0	0,0	79,0%	0,03	
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,04	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	3,4%	16,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,02	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	0,0%	20,7%	0,0	0,0	79,3%	-0,03	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	10,8%	7,5%	0,0	0,0	81,8%	0,02	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	0,07	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	4,7%	15,2%	0,0	0,0	80,1%	-0,11	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,8%	18,6%	0,0	0,0	78,6%	0,02	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	11,5%	6,3%	0,0	0,0	82,2%	-0,05	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	0,02	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,9%	17,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,01	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	3,6%	16,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,01	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	4,3%	15,7%	0,0	0,0	80,0%	0,02	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,1%	0,0	0,0	78,1%	0,06	
PMG-45 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,5%	0,0	0,0	78,5%	-0,04		

DATA		Semana 5: 21/07/2014 a 25/07/2014								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,02	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	10,9%	8,6%	0,0	0,0	80,5%	-0,01	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,9%	0,0	0,0	79,6%	0,05	
	PMG-31 B	2,1%	2,1%	16,1%	0,1%	0,0	0,0	81,7%	0,09	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	0,01	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	8,8%	9,8%	0,0	0,0	81,4%	0,05	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,06	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	15,1%	3,2%	0,0	0,0	81,7%	-0,02	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	0,01	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	3,0%	17,2%	0,0	0,0	79,8%	-0,04	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,02	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	3,8%	15,8%	0,0	0,0	80,4%	0,02	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	0,03	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	15,4%	2,5%	0,0	0,0	82,1%	0,09	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,11	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	4,3%	16,5%	0,0	0,0	79,2%	0,01	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	0,00	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,3%	0,0	0,0	79,3%	0,03	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,10	
	PMG-39 B	1,8%	1,9%	15,2%	0,1%	1,0	0,0	82,9%	-0,06	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,2%	0,0	0,0	79,7%	0,02	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,9%	20,2%	0,0	0,0	77,9%	-0,01	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	0,03	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	0,01	
PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,3%	16,0%	0,0	0,0	80,7%	-0,02		
PMG-42 B	0,0%	0,0%	15,4%	0,1%	0,0	0,0	84,5%	-0,13	A	
PMG-43 A	0,0%	0,0%	3,1%	17,1%	0,0	0,0	79,8%	0,02		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,2%	0,0	0,0	79,5%	-0,01		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	0,04	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	5,0%	15,6%	0,0	0,0	79,4%	0,01	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
	PMG-64 B	9,5%	15,4%	5,0%	10,9%	0,0	0,0	74,6%	-0,05	
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,29	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	5,9%	14,3%	0,0	0,0	79,8%	-0,02	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,05	
	PMG-66 B	0,0%	0,0%	10,9%	11,5%	0,0	0,0	77,6%	-0,04	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,06	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	6,0%	13,1%	0,0	0,0	80,9%	0,02	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	-0,03	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,20	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,12	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	12,4%	7,1%	0,0	0,0	80,5%	-0,04	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,03	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	6,0%	13,2%	0,0	0,0	80,8%	-0,02	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,2%	0,0	0,0	79,7%	0,01	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	7,2%	14,7%	0,0	0,0	78,1%	-0,02	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	0,02	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,04	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	0,01		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,4%	0,0	0,0	79,4%	0,03		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,01		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,1%	0,0	0,0	79,8%	0,04		

DATA		Semana 5: 21/07/2014 a 25/07/2014								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	0,03	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	10,7%	6,3%	0,0	0,0	82,0%	0,04	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	0,01	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	10,3%	8,5%	0,0	0,0	81,2%	0,08	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,6%	0,0	0,0	79,4%	0,02	
	PMG-48 B	29,4%	29,9%	7,6%	1,7%	0,0	0,0	61,3%	0,14	E
	PMG-49 O	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	0,08	
	PMG-49 B	6,3%	6,4%	9,2%	6,5%	0,0	0,0	78,0%	-0,14	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,09	
	PMG-50 B	9,9%	35,5%	7,1%	12,7%	0,0	0,0	70,3%	0,11	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	0,05	
	PMG-51 B	29,3%	29,9%	9,8%	0,4%	0,0	0,0	60,5%	0,05	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,8%	0,02	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,01	
	PMG-53 A	0,2%	0,2%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,24	
	PMG-53 B	23,4%	23,0%	10,2%	0,4%	0,0	0,0	66,4%	-0,24	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	0,02	
	PMG-54 B	4,7%	23,1%	8,3%	0,8%	0,0	0,0	86,2%	-0,06	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,08	
	PMG-55 B	61,0%	61,0%	19,8%	0,3%	3,0	0,0	18,9%	0,00	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,04	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	4,2%	15,0%	0,0	0,0	80,8%	0,18	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,02	
	PMG-57 B	18,9%	18,9%	14,5%	0,3%	0,0	0,0	66,3%	0,11	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,01	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	8,0%	10,0%	0,0	0,0	82,0%	-0,02	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,13	
	PMG-59 B	9,8%	34,9%	6,1%	15,2%	0,0	0,0	68,9%	-0,03	
PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,09		
PMG-60 B	12,5%	12,5%	10,2%	0,7%	0,0	0,0	76,6%	0,10	E	
PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,20		
PMG-61 B	11,6%	11,6%	12,1%	0,3%	1,0	0,0	76,0%	0,04		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,3%	0,0	0,0	78,6%	0,03		
PMG-62 B	21,5%	22,1%	14,5%	1,7%	0,0	0,0	62,3%	0,26	E	

DATA		Semana 5: 21/07/2014 a 25/07/2014									
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.	
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água											
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,01	
	PMG-01	B	1,0%	1,1%	16,1%	1,2%	0,0	0,0	81,7%	0,02	
	PMG-02	O	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,28	
	PMG-02	B	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	1,62	A
	PMG-03	A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,23	
	PMG-03	B	82,6%	82,6%	8,3%	0,4%	0,0	0,0	8,7%	-0,14	E
	PMG-04	A	0,0%	0,1%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	0,01	
	PMG-04	B	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,04	
	PMG-05	A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0,0	0,0	79,7%	0,01	
	PMG-05	B	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,22	A
	PMG-06	A	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	0,02	
	PMG-06	B	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,17	A
	PMG-07	A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,12	
	PMG-07	B	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,34	A
	PMG-08	A	0,0%	0,0%	0,3%	20,0%	0,0	0,0	79,7%	-0,02	
	PMG-08	B	2,6%	21,1%	10,7%	7,8%	0,0	0,0	79,0%	0,01	
	PMG-09	A	0,0%	0,0%	9,2%	10,2%	0,0	0,0	80,6%	-2,29	
	PMG-09	B	0,0%	0,0%	15,6%	0,8%	0,0	0,0	83,6%	-1,36	
	PMG-10	A	0,0%	0,0%	2,3%	17,2%	0,0	0,0	80,5%	0,00	
	PMG-10	B	0,0%	0,0%	7,1%	11,0%	0,0	0,0	81,9%	0,00	
	PMG-84	A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
	PMG-84	B	1,0%	1,3%	12,5%	3,6%	0,0	0,0	82,9%	-0,05	
	PMG-85	A	0,0%	0,0%	5,2%	11,4%	0,0	0,0	83,4%	-1,09	
	PMG-85	B	0,6%	0,6%	9,9%	0,0%	0,0	0,0	89,5%	-0,84	
	PMG-86	A	0,0%	0,0%	0,3%	0,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,08	
	PMG-86	B	0,0%	0,0%	2,1%	16,0%	0,0	0,0	81,9%	0,05	
PMG-87	A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0,0	0,0	79,7%	-0,09		
PMG-87	B	0,0%	0,0%	6,0%	8,0%	0,0	0,0	85,0%	0,08		
Enfermaria	PMG-70	A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,09	
	PMG-70	B	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
	PMG-71	A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,05	
	PMG-71	B	0,0%	0,0%	3,5%	0,5%	0,0	0,0	96,0%	-0,09	
	PMG-72	A	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,07	
	PMG-72	B	0,0%	0,0%	1,5%	17,0%	0,0	0,0	81,5%	0,08	
	PMG-73	A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,7%	-0,03	
	PMG-73	B	0,0%	0,0%	0,8%	19,3%	0,0	0,0	79,9%	0,04	
	PMG-74	A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,01	
	PMG-74	B	0,4%	0,6%	0,4%	0,3%	1,0	0,0	98,9%	0,09	
	PMG-75	A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,07	
	PMG-75	B	0,0%	0,0%	5,2%	0,3%	0,0	0,0	94,5%	-0,05	
	PMG-76	A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,05	
	PMG-76	B	0,0%	0,0%	2,1%	17,1%	0,0	0,0	80,8%	-0,04	

DATA		Semana 5: 21/07/2014 a 25/07/2014									
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.	
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%: maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água											
CAT	PMG-82 A	0,3%	0,4%	15,1%	4,4%	0,0	0,0	80,2%	-0,20		
	PMG-82 B	0,6%	0,6%	18,7%	0,2%	0,0	0,0	80,5%	-0,14		
	PMG-83 A	0,3%	0,3%	11,4%	7,1%	0,0	0,0	81,2%	-1,05		
	PMG-83 B	1,5%	1,6%	16,7%	0,8%	0,0	0,0	81,0%	-0,07		
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	0,00		
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	13,1%	5,2%	0,0	0,0	81,7%	-0,03		
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	8,6%	8,3%	0,0	0,0	83,1%	-0,11		
	PMG-95 B	2,5%	2,6%	11,2%	3,2%	0,0	0,0	83,1%	0,04		
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	0,2%	16,8%	0,0	0,0	83,0%	-0,23		
	PMG-96 B	2,4%	2,4%	9,6%	0,1%	0,0	0,0	87,9%	0,08		
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	0,07		
	PMG-97 B	0,4%	0,5%	15,5%	0,1%	3,0	0,0	84,0%	-0,14		
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,10		
PMG-98 B	0,0%	0,0%	2,5%	18,3%	0,0	0,0	79,3%	0,14			
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,04		
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0,0	0,0	79,5%	0,02		
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,17		
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,4%	17,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,09		
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0,0	0,0	79,7%	-0,12		
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	0,0	0,0	79,0%	0,01		
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	-0,01		
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	2,5%	18,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,04		
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	0,03		
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,2%	0,0	0,0	78,4%	0,04		
PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,01			
PMG-93 B	0,0%	0,0%	2,0%	17,0%	0,0	0,0	81,0%	0,02			
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	0,02		
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,01		
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,02		
	PMG-105	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,01		
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,03		
	PMG-107	0,0%	0,0%	5,8%	13,2%	0,0	0,0	81,0%	0,00		
	PMG-108	0,0%	0,0%	2,5%	17,9%	0,0	0,0	79,6%	0,02		
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,03		
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	4,8%	16,3%	0,0	0,0	78,9%	0,07		
	PMG-110 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PMG-110 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-111 A	-	-	-	-	-	-	-	-			
PMG-111 B	-	-	-	-	-	-	-	-			
PMG-112	-	-	-	-	-	-	-	-			

ANEXO IV – TABELAS DE MEDIÇÕES NA INFRA-ESTRUTURA MX6
(JUL/14)

DATA		23/06/2014		24/06/2014		25/06/2014		26/06/2014		27/06/2014	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		17	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		16	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		14	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		15	-	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,2	0%
		18	-	0,2	0%	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%
		19	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		20	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		13	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		25	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		22	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		21	-	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%
		32	-	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		30	-	0,0	0%	0,0	0%	1,3	0%	0,7	0%
		31	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		28	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		26	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		24	-	0,0	0%	1,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	27	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	23	-	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		05	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		04	-	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%
		03	-	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%
		09	-	0,9	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		08	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%
		07	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		06	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	02	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
I-3 Auditórios	Ralos	160	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		159	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		162	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		165	-	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%
		164	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		176	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		177	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		174	-	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%
	171	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
I-3 Biblioteca	Ralos	148	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		149	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%
		150	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		147	-	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		139	-	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
		140	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		141	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		151	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		145	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		144	-	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
		143	-	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%
	142	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	146	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	

DATA		23/06/2014		24/06/2014		25/06/2014		26/06/2014		27/06/2014	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	Ralos	95	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	97	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	99	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	106	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	96	-	-	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	1,0	0%
	104	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	307	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	122	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%
	111	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	117	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	100	-	-	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%
	101	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	105	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	91	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	102	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	88	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,8	0%
	108	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	107	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	94	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	92	-	-	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%
	90	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	89	-	-	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	87	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	123	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,1	0%
	121	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	120	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	119	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	114	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	113	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	112	-	-	0,8	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	109	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	110	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	36	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,8	0%	0,0	0%
	53	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	69	-	-	0,0	0%	1,2	0%	0,0	0%	0,0	0%
	70	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	71	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	67	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	66	-	-	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%
	64	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	65	-	-	0,0	0%	0,0	0%	1,3	0%	0,0	0%
	63	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	62	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	56	-	-	1,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	60	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	58	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	55	-	-	0,0	0%	1,2	0%	0,0	0%	0,0	0%
	54	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	57	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	42	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	44	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	43	-	-	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%
	41	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	38	-	-	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	32	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%
	61	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	37	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	45	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%
	46	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
40	-	-	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
47	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
48	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
49	-	-	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	
50	-	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,8	0%	

DATA		23/06/2014		24/06/2014		25/06/2014		26/06/2014		27/06/2014	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Bloco inicial	Ralos	74	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		75	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		76	-	0,2	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%
		77	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		78	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		79	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		80	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%
		81	-	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		82	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		83	-	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%
		84	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	85	-	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	86	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
Enfermaria	Ralos	124	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%
		125	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		126	-	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		127	-	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%
CAT	Ralos	136	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		137	-	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		138	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,8	0%
P3	Ralos	187	-	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%
		186	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Incubadora	Ralos	132	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		133	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		134	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%
		135	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Caixas	Enf	53	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Enf	55	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	40	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	38	-	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	24	-	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%
	Lab	15	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	13	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	28	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	33	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	37	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	16	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	18	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	21	-	0,8	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%
	Lab	39	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	59	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	57	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	60	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	67	-	0,0	0%	0,0	0%	0,8	0%	0,0	0%
	Bib.	58	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Aud	72	-	1,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Aud	73	-	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	
Aud	74	-	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	

DATA		14/07/2014		15/07/2014		16/07/2014		17/07/2014		18/07/2014		
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		17	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		16	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		14	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		15	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		18	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		19	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		20	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		13	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		25	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		22	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		21	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		32	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		30	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		31	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		28	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		26	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		24	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	27	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	23	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		05	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		04	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		03	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		09	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		08	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		07	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		06	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	02	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
I-3 Auditórios	Ralos	160	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		159	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		162	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		165	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		164	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		176	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		177	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	174	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	171	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
I-3 Biblioteca	Ralos	148	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		149	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		150	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		147	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		139	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		140	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		141	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		151	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		145	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		144	0,8	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		143	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	142	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	146	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	

DATA		14/07/2014		15/07/2014		16/07/2014		17/07/2014		18/07/2014		
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Edifício I-4	Ralos	95	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	97	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	99	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	106	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	96	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	104	0,3	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	
	307	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	122	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	111	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	117	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	100	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	101	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	
	105	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	91	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	102	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	88	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	108	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	107	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	94	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	92	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	90	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	89	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	
	87	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	123	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	121	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	120	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	119	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	114	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	113	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	112	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
109	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
110	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	36	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	53	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	69	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	70	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	71	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	67	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	66	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	64	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	65	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	63	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	62	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	56	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	60	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	58	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	55	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	54	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	57	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	42	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	44	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	
	43	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	41	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	
	38	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	32	0,0	0%	0,0	0%	0,8	0%	0,0	0%	0,1	0%	
	61	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	37	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	45	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	46	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
40	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
47	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
48	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
49	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
50	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		

DATA		14/07/2014		15/07/2014		16/07/2014		17/07/2014		18/07/2014		
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Bloco inicial	Ralos	74	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		75	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		76	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		77	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		78	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%
		79	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		80	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		81	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%
		82	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		83	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		84	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	85	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	86	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%
		125	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		126	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		127	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%
CAT	Ralos	136	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		137	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		138	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
P3	Ralos	187	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
		186	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Incubadora	Ralos	132	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		133	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		134	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		135	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Caixas	Enf	53	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Enf	55	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	40	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	38	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	24	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	15	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	13	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%
	Lab	28	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	33	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	37	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
	Lab	16	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	18	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%
	Lab	21	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	39	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	59	0,0	0%	0,7	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	57	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	60	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%
	Bib.	67	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	58	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Aud	72	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Aud	73	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
Aud	74	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	

DATA		21/07/2014		22/07/2014		23/07/2014		24/07/2014		25/07/2014		
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		17	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		16	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		14	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,1	0%
		15	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		18	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		19	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
		20	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		13	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		25	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%
		22	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%
		21	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		32	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
		30	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		31	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		28	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		26	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		24	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	27	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	23	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%
		05	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		04	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		03	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		09	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		08	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		07	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		06	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%
	02	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
I-3 Auditórios	Ralos	160	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		159	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		162	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		165	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		164	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%
		176	0,0	0%	0,1	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%
		177	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		174	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	171	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
I-3 Biblioteca	Ralos	148	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		149	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		150	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%
		147	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,8	0%
		139	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		140	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%
		141	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		151	0,6	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		145	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		144	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		143	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	142	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	146	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	

DATA		21/07/2014		22/07/2014		23/07/2014		24/07/2014		25/07/2014		
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Edifício I-4	Ralos	95	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	97	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	99	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	106	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	96	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,6	0%	
	104	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	307	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	122	0,0	0%	0,3	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	111	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	117	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	100	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	
	101	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	105	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	91	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	102	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	88	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	108	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	107	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	94	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	92	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	
	90	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	89	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	87	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	123	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	121	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	120	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
119	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
114	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
113	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
112	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
109	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
110	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	36	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	53	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	69	0,0	0%	0,0	0%	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	70	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	71	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	
	67	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	66	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	64	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	65	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	63	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	62	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	56	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	
	60	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	58	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	55	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	54	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	57	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	42	0,0	0%	0,3	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	44	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	
	43	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	41	0,4	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	38	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	32	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	61	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	
	37	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
45	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
46	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
40	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
47	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
48	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%		
49	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		
50	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%		

DATA		21/07/2014		22/07/2014		23/07/2014		24/07/2014		25/07/2014		
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Bloco inicial	Ralos	74	0,3	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%	
		75	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		76	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		77	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		78	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		79	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		80	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
		81	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%
		82	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		83	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		84	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	85	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
	86	0,0	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		125	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		126	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		127	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%
CAT	Ralos	136	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		137	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		138	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%
P3	Ralos	187	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		186	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Incubadora	Ralos	132	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%
		133	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		134	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
		135	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Caixas	Enf	53	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Enf	55	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	40	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	38	0,2	0%	0,0	0%	0,2	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	24	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%
	Lab	15	0,0	0%	0,5	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,5	0%
	Lab	13	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	28	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	33	0,7	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	37	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	16	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,3	0%	0,0	0%
	Lab	18	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	21	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Lab	39	0,1	0%	0,3	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	59	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	57	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	60	0,0	0%	0,0	0%	0,4	0%	0,0	0%	0,3	0%
	Bib.	67	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Bib.	58	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%
	Aud	72	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Aud	73	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	
Aud	74	0,0	0%	0,1	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	

**ANEXO V – ANOTAÇÕES DE RESTRIÇÃO DE FLUXO E PRESENÇA DE
ÁGUA (ABR - JUN/14)**



SEMANA		08 a 11/04/14	14 a 17/04/14	22 a 25/04/14	28 a 30/04/14	05 a 08/05/14	12 a 16/05/14	19 a 23/05/14	26 a 30/05/14	02 a 06/06/14	09 a 13/06/14	16 a 20/06/14
POÇOS		Obs.	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.	Obs.
Edifício I-1	PMG-114 A											
	PMG-114 B		Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água		Presença de Água				
Edifício I-2	PMG-12 A											
	PMG-12 B		Presença de Água									
Edifício I-4	PMG-64 A											
	PMG-64 B	Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água		Presença de Água	Restrição de Fluxo	Presença de Água	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	
	PMG-65 A											
	PMG-65 B	Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água		Presença de Água			Presença de Água			
	PMG-66 A											
	PMG-66 B		Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água							
	PMG-68 A											
	PMG-68 B		Presença de Água						Presença de Água			
	PMG-77 A											
	PMG-77 B		Presença de Água									
	PMG-80 A											
	PMG-80 B		Presença de Água									
	PMG-81 A											
	PMG-81 B		Presença de Água									
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A					Presença de Água						
	PMG-46 B					Presença de Água						
	PMG-48 A											
	PMG-48 B			Restrição de Fluxo		Restrição de Fluxo			Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo
	PMG-49 A											
	PMG-49 B					Restrição de Fluxo		Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo
	PMG-51 A											
	PMG-51 B			Presença de Água								
	PMG-60 A											
	PMG-60 B					Restrição de Fluxo				Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-62 A											
	PMG-62 B					Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo		Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo
	PMG-01 A											
	PMG-01 B		Presença de Água			Presença de Água	Presença de Água					
	PMG-02 A	Restrição de Fluxo	Presença de Água									
	PMG-02 B		Presença de Água		Presença de Água		Presença de Água			Presença de Água	Presença de Água	
	PMG-03 A											
	PMG-03 B				Presença de Água	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo			Restrição de Fluxo	
	PMG-05 A											
	PMG-05 B				Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água		Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água	
	PMG-06 A											
	PMG-06 B	Restrição de Fluxo	Presença de Água		Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água
	PMG-07 A											
	PMG-07 B					Presença de Água		Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água	Presença de Água	
PMG-08	A											
	B				Presença de Água	Presença de Água						
PMG-09	A											
	B				Presença de Água							
ENF	PMG-74 A											
	PMG-74 B		Presença de Água									
CAT	PMG-95 A											
	PMG-95 B			Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo			Restrição de Fluxo	Restrição de Fluxo	
Ginásio	PMG-107					Restrição de Fluxo						
	PMG-111 A											
	PMG-111 B					Presença de Água		Presença de Água	Presença de Água			

ANEXO VI – GRÁFICOS DE EVOLUÇÃO CH₄ E PRESSÃO (ABR - JUL/14)

EDIFÍCIO I-1

Quantidade total de Poços:	17 Pares	sendo 9 na Parte 1 e 8 na Parte 2
Período de Medição:	08 de Abril a 25 de Julho de 2014	
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	2 Pares	PMG-114 Parte 1 PMG-11 Parte 2

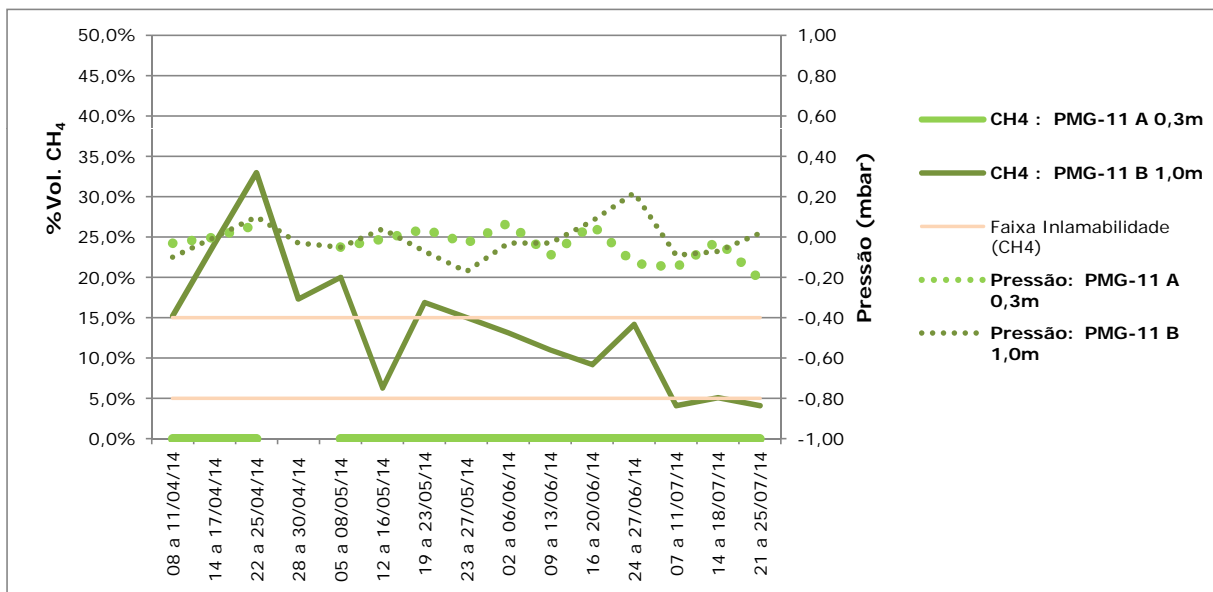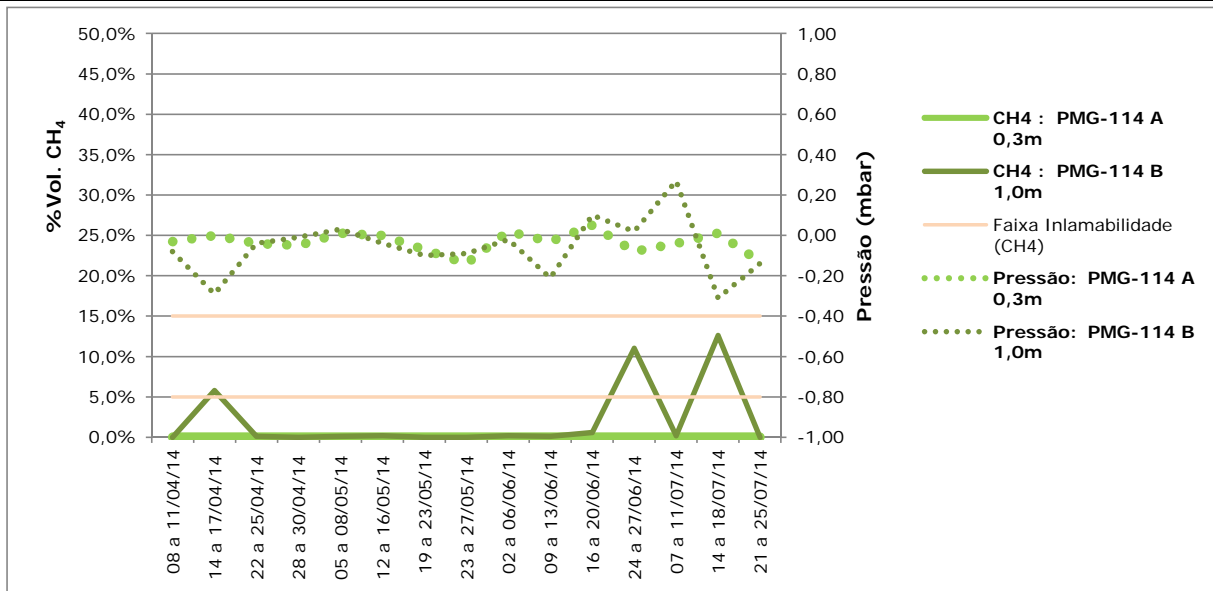Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)





EDIFÍCIO I-3

Quantidade total de Poços: 21 Pares sendo 7 nos Auditórios e 14 na Biblioteca

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 2 Pares
 PMG-31 Biblioteca
 PMG-39 Biblioteca

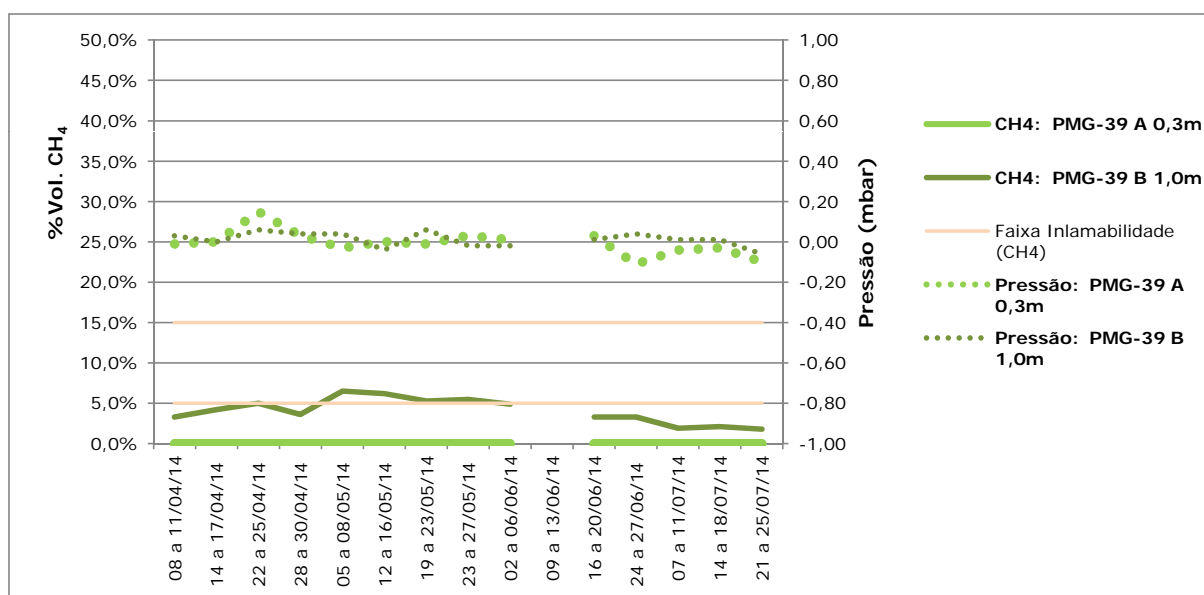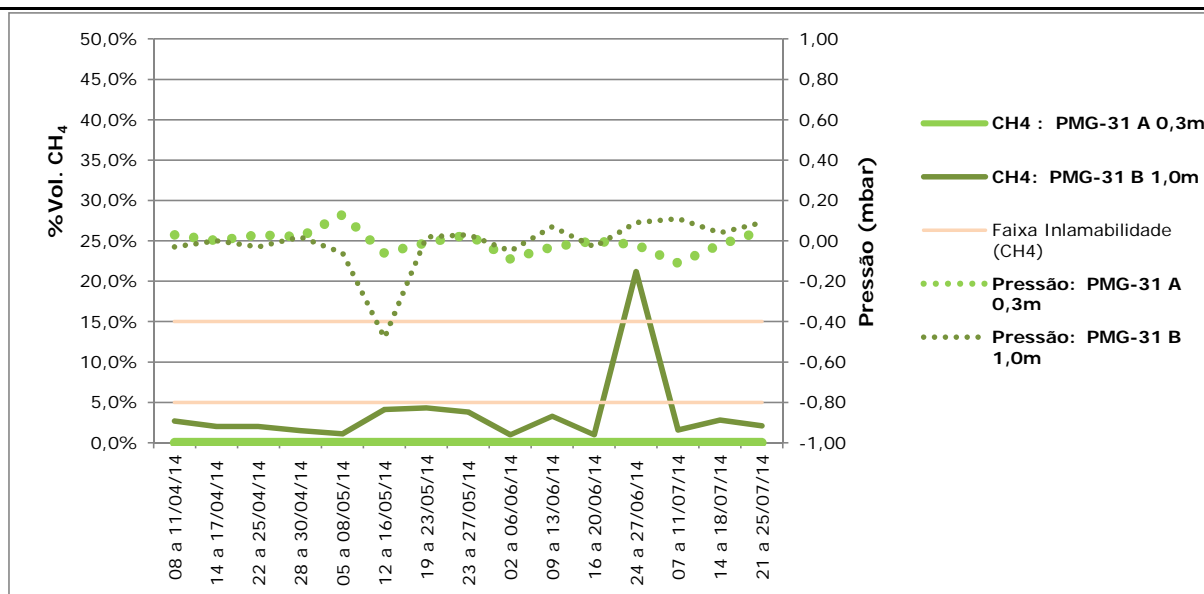Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



CONJUNTO LABORATORIAL



Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 12 Pares

PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61
PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62

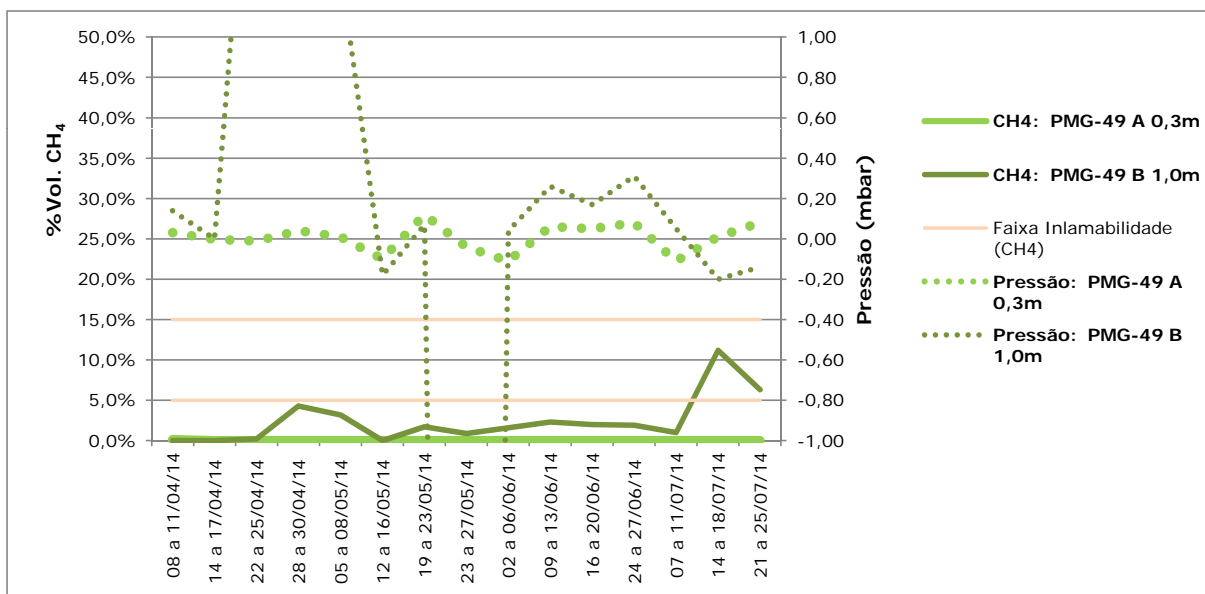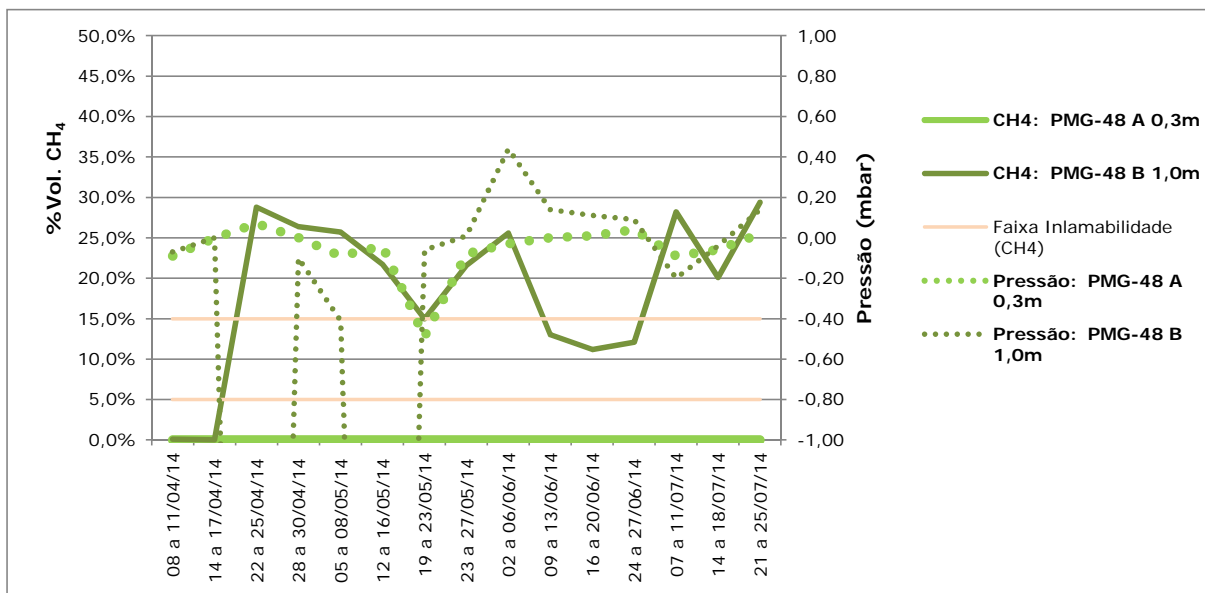Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



CONJUNTO LABORATORIAL



Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 12 Pares

PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61
PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62

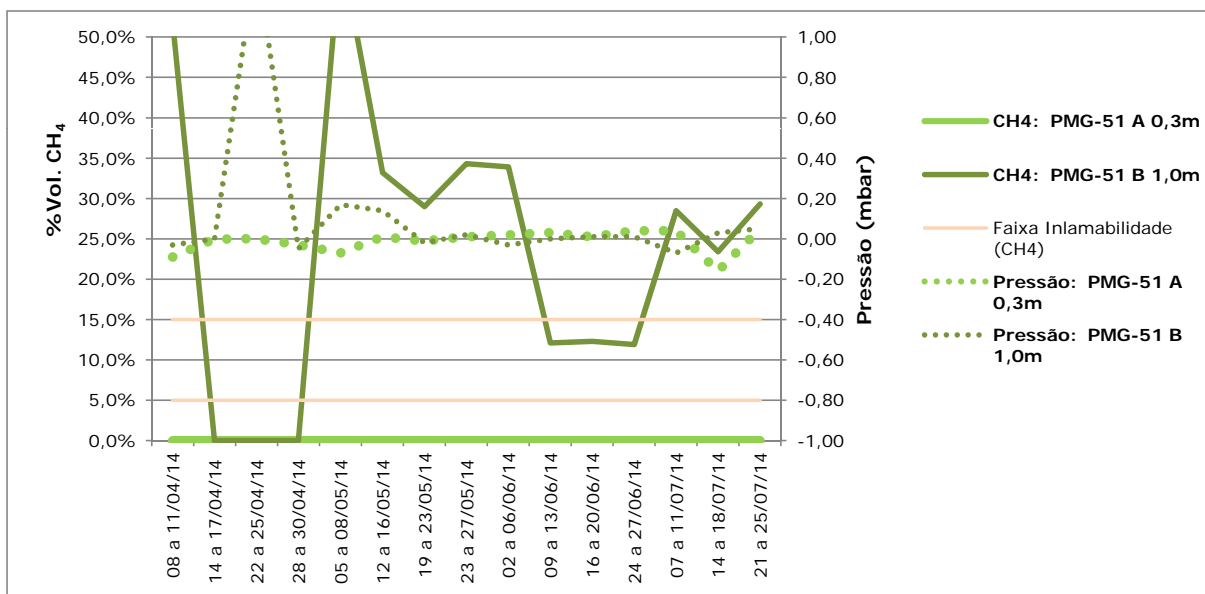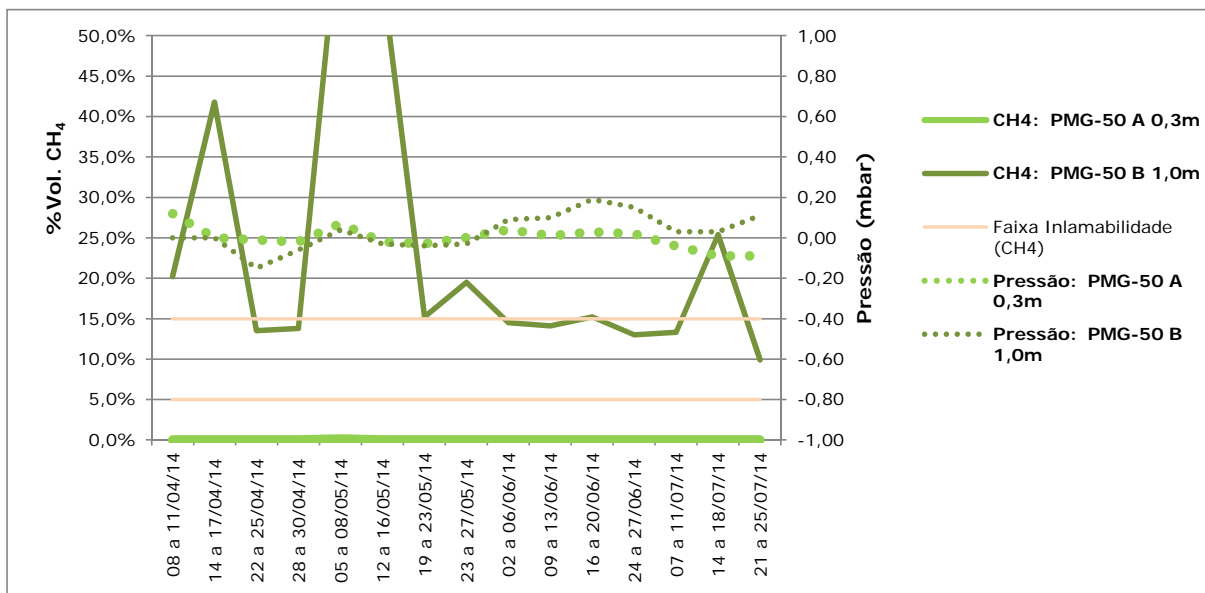Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



CONJUNTO LABORATORIAL



Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 12 Pares

PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61
PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62

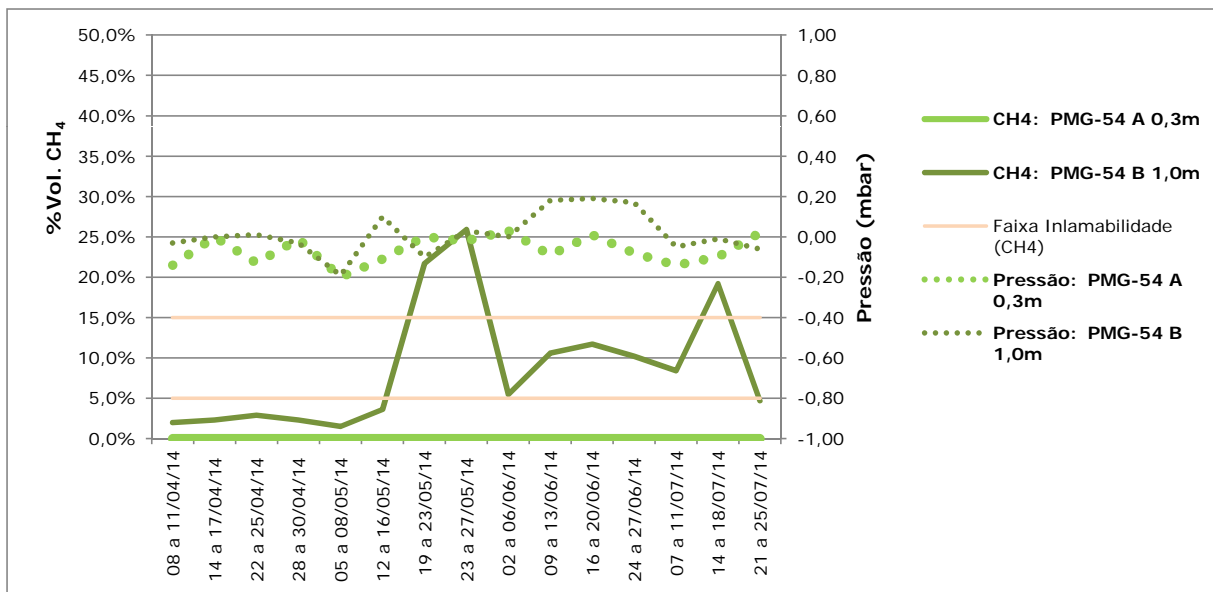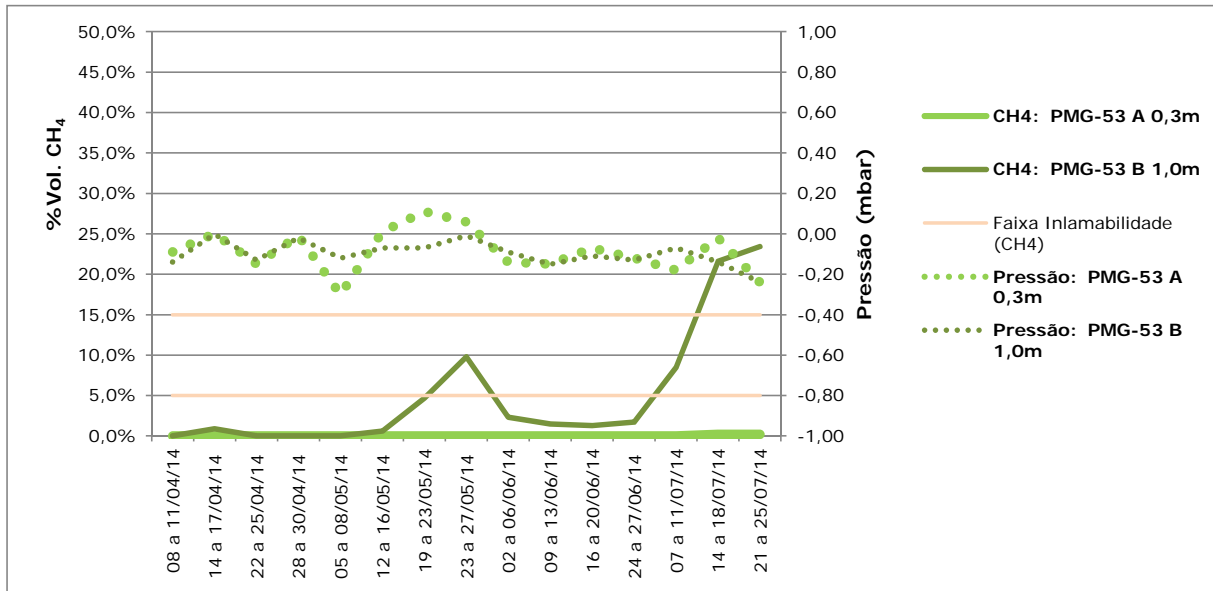Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



CONJUNTO LABORATORIAL



Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 12 Pares

PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61
PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62

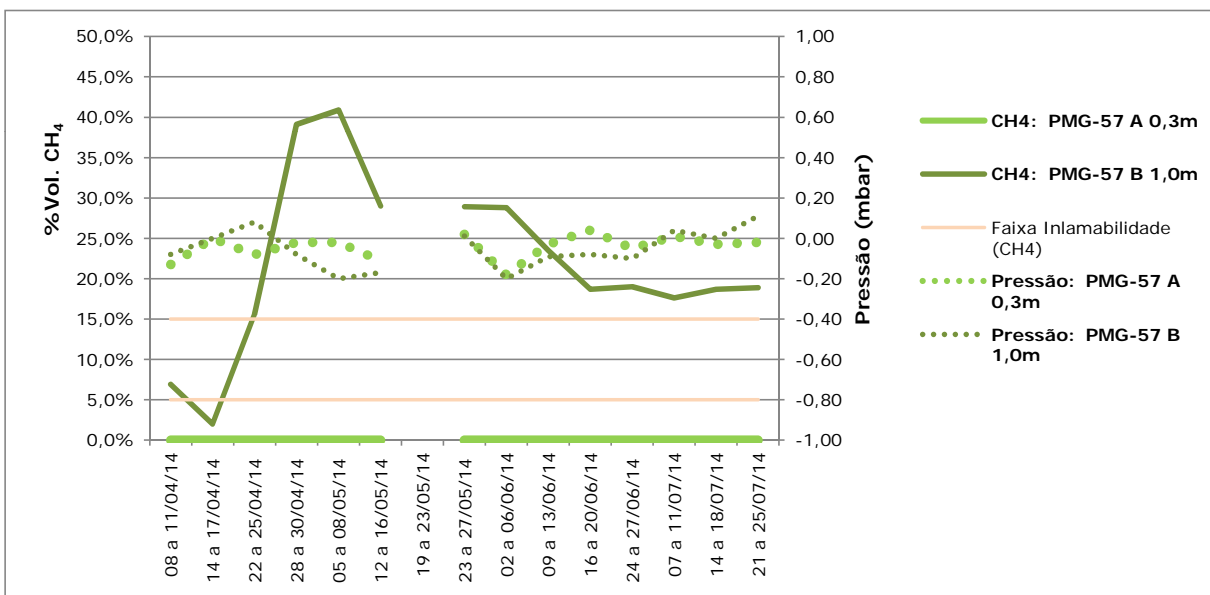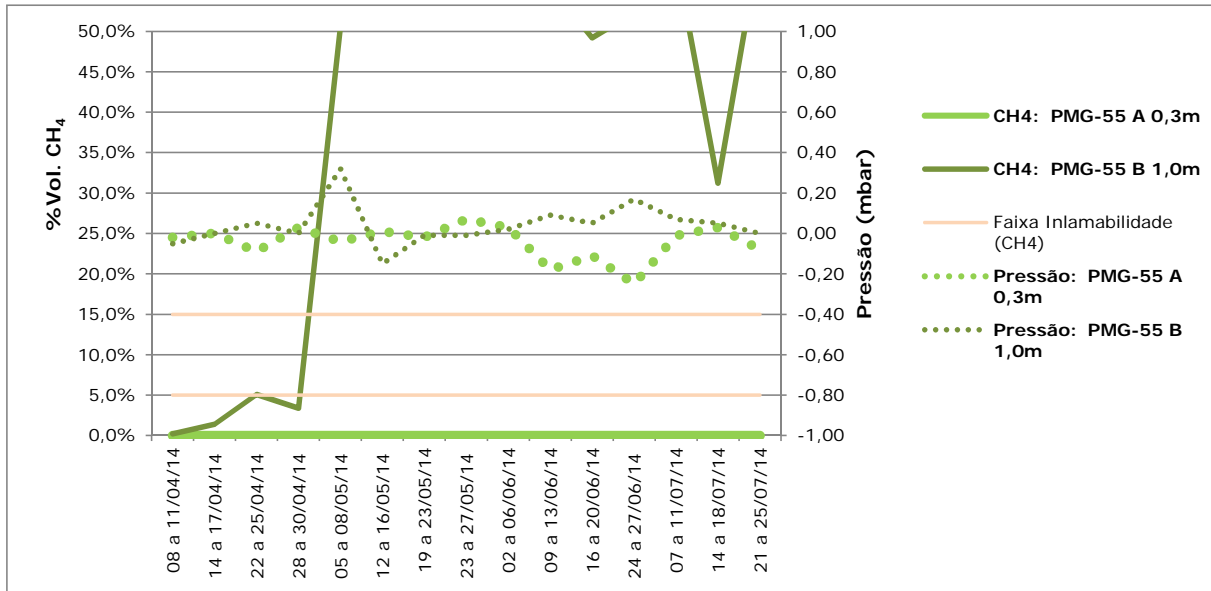Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



CONJUNTO LABORATORIAL



Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 12 Pares

PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61
PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62

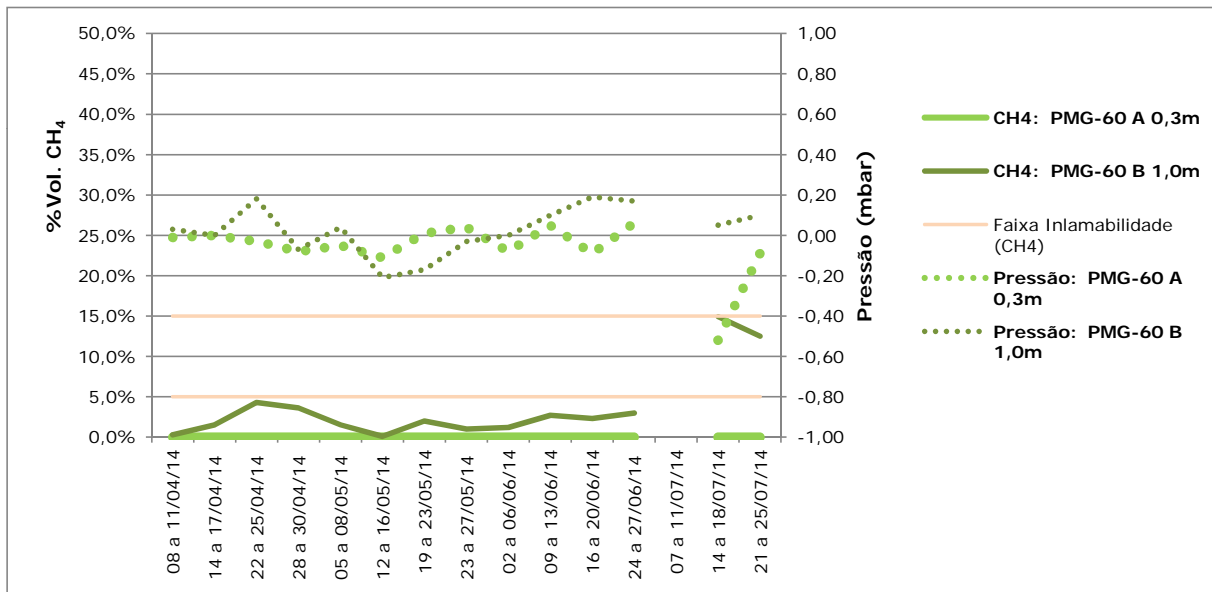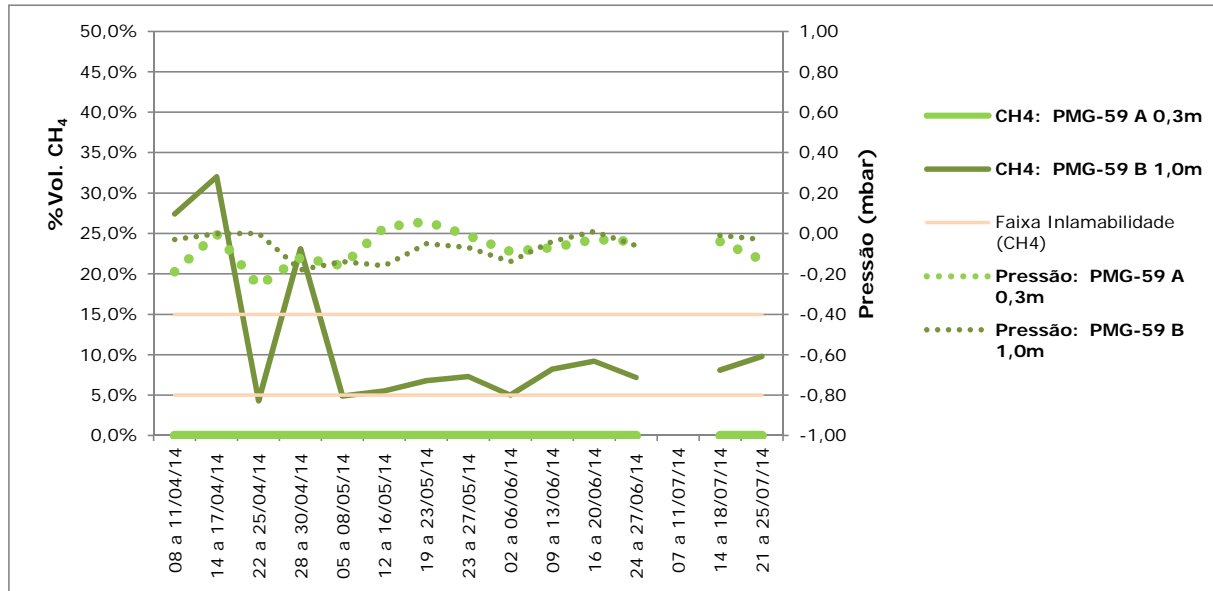Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



CONJUNTO LABORATORIAL



Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 12 Pares

PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61
PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62

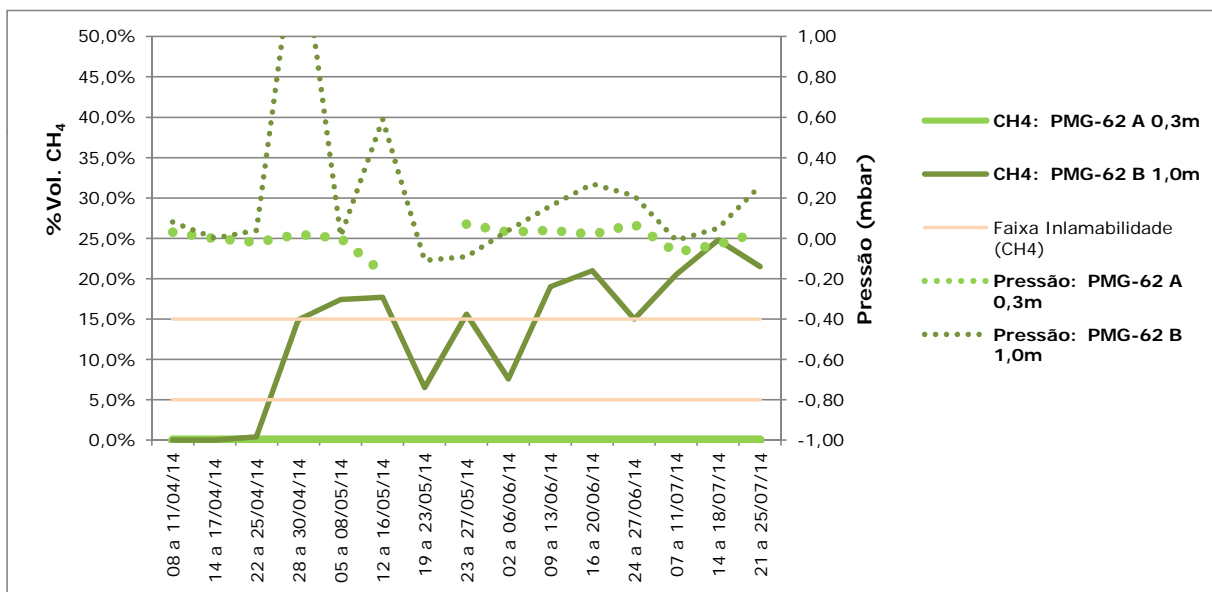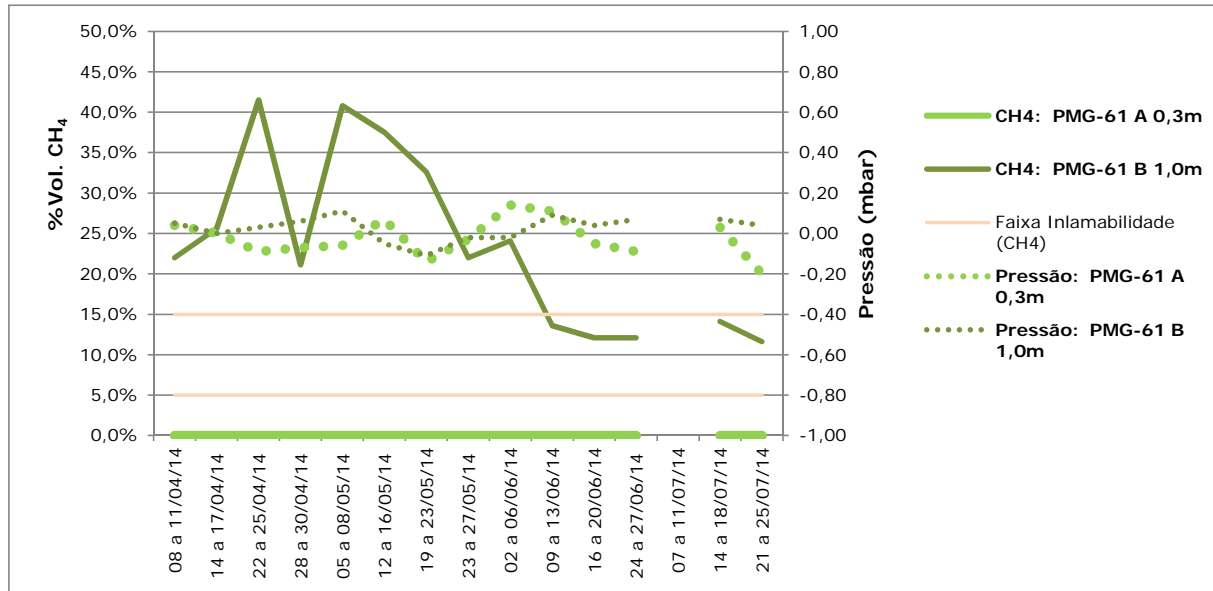Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)



Quantidade total de Poços: 14 Pares

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 10 Pares



PMG-01	PMG-03	PMG-06	PMG-08	PMG-84
PMG-02	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85

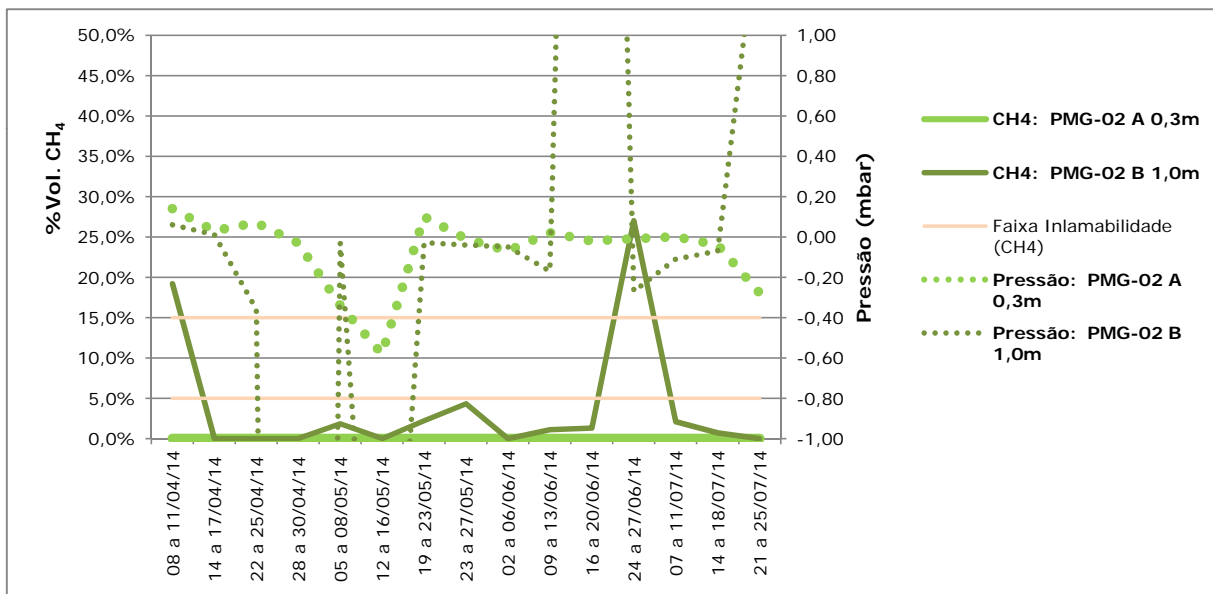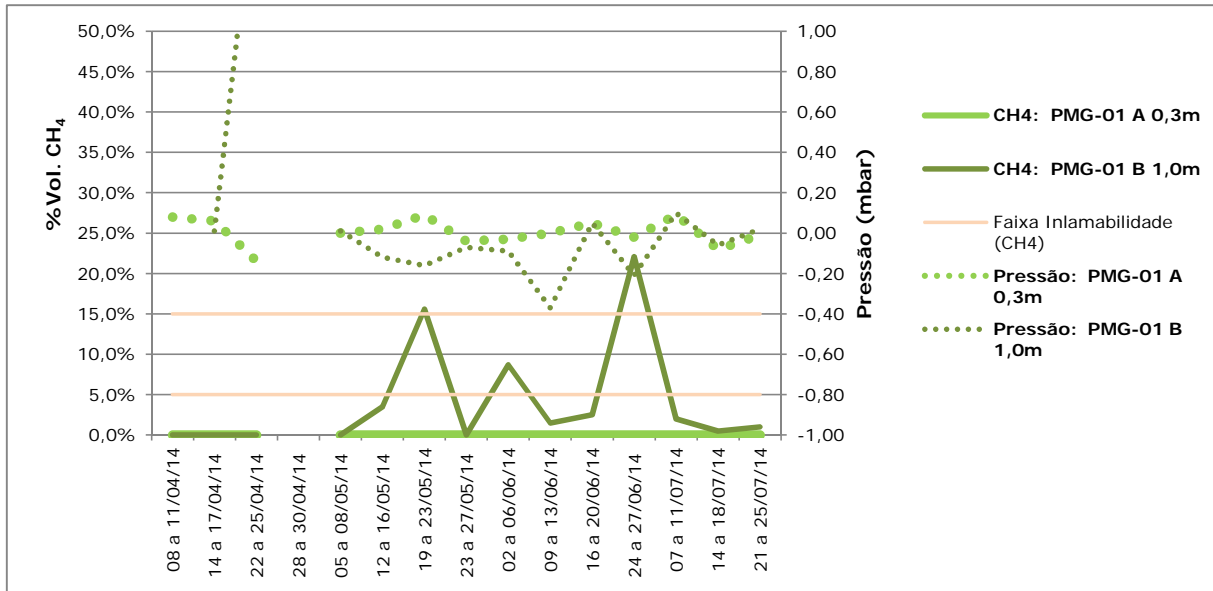Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)





BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:	14 Pares					
Período de Medição:	08 de Abril a 25 de Julho de 2014					
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	10 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-06	PMG-08	PMG-84
		PMG-02	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)					

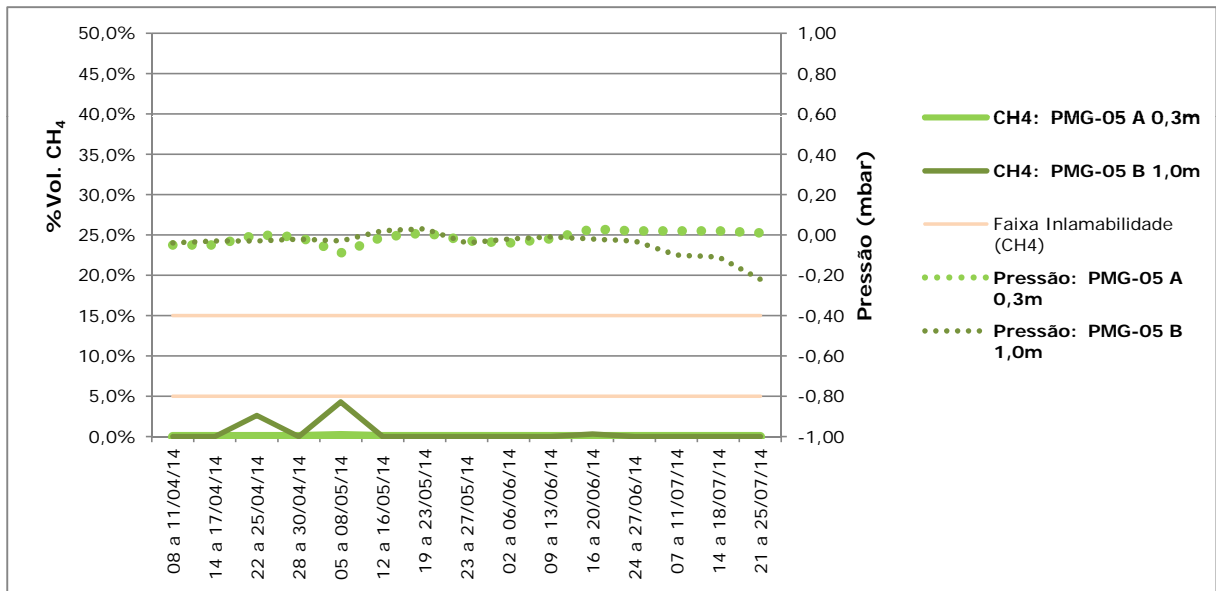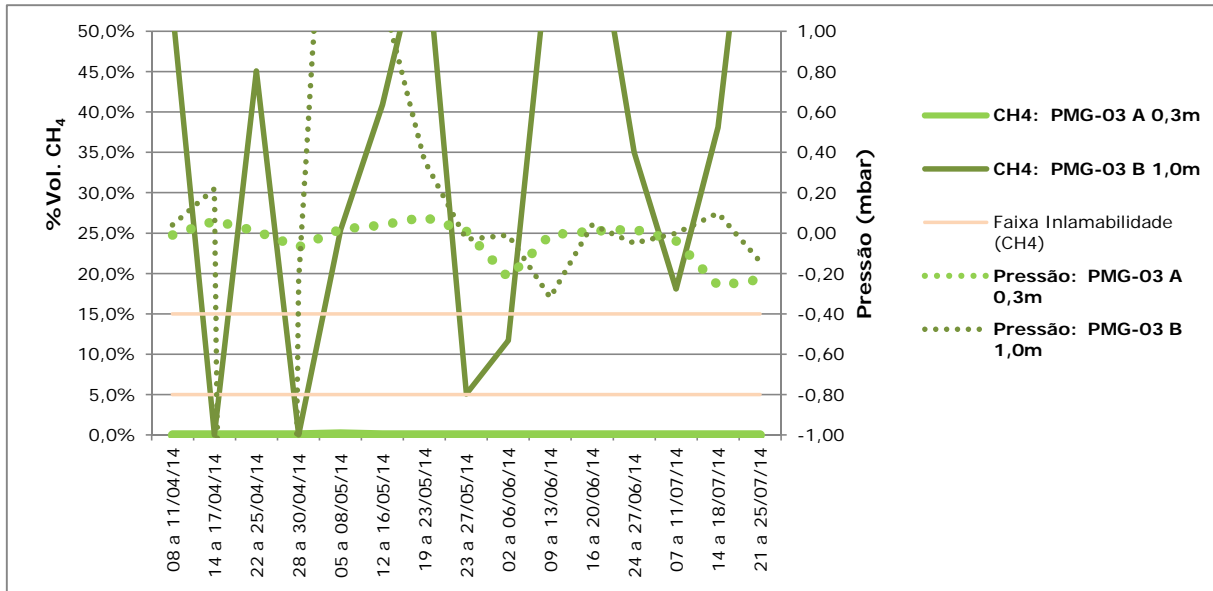

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:	14 Pares					
Período de Medição:	08 de Abril a 25 de Julho de 2014					
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	10 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-06	PMG-08	PMG-84
		PMG-02	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)					

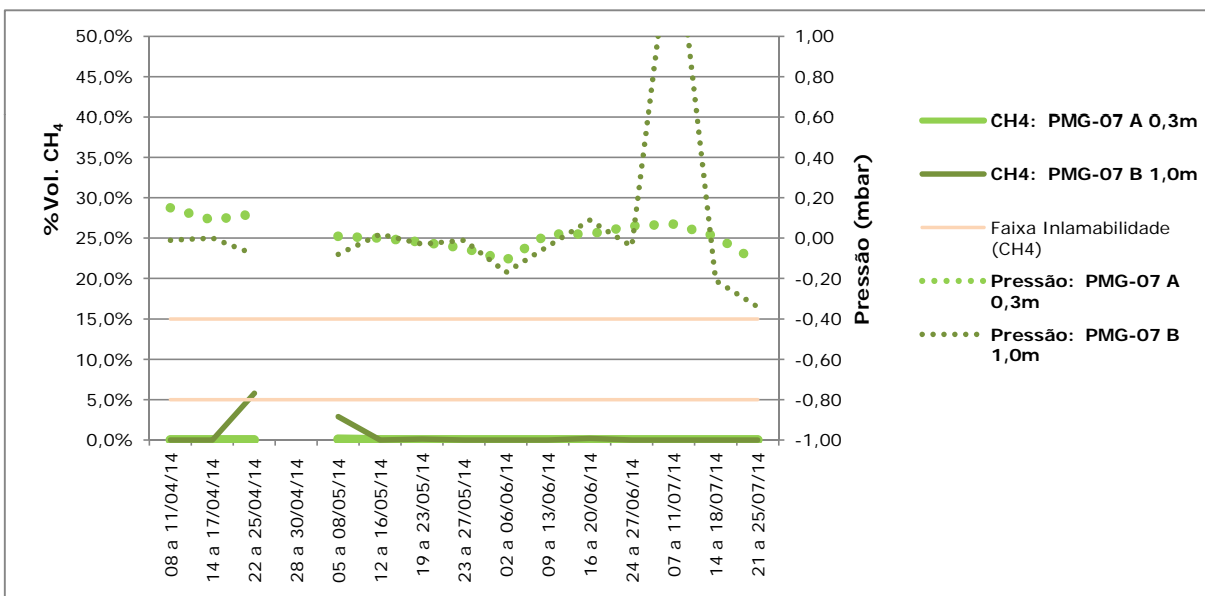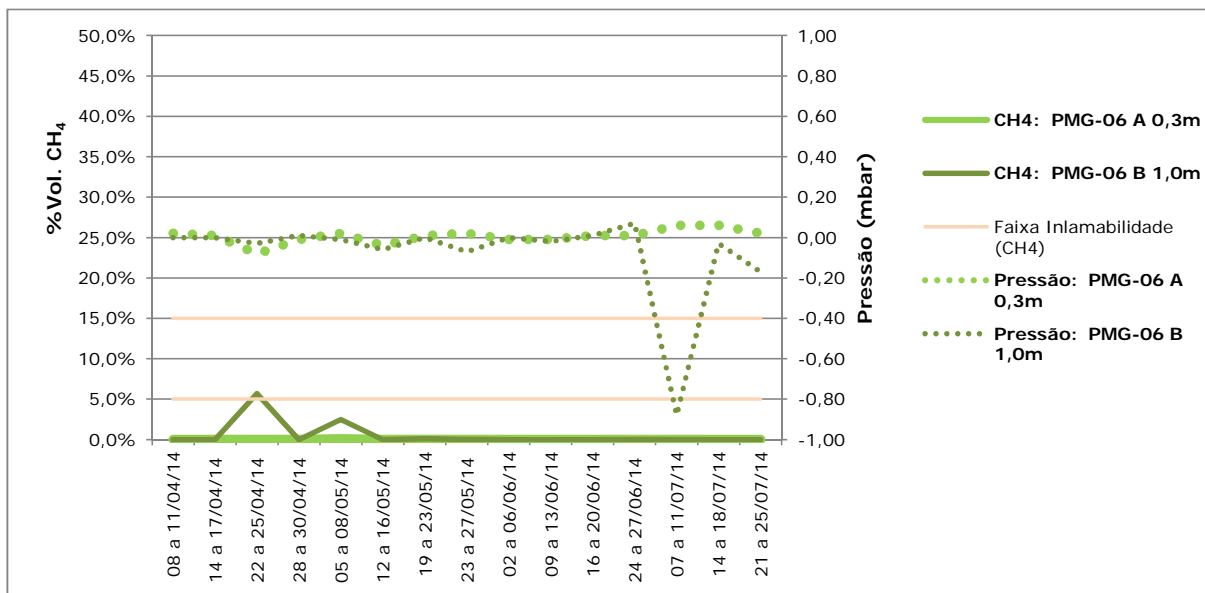

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)



Quantidade total de Poços: 14 Pares

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 10 Pares



PMG-01	PMG-03	PMG-06	PMG-08	PMG-84
PMG-02	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85

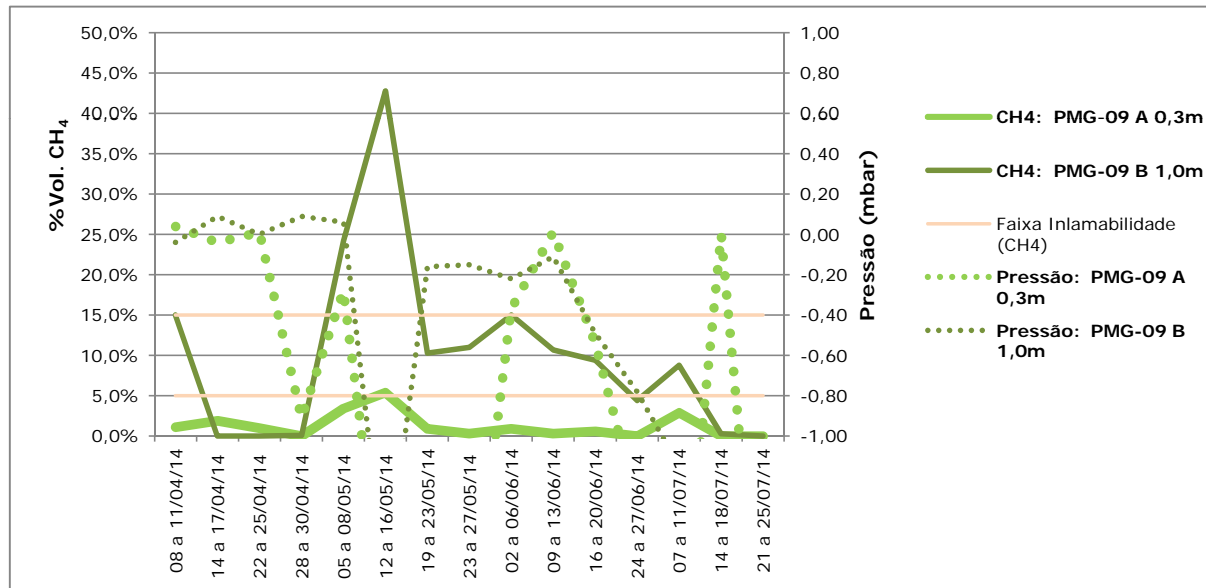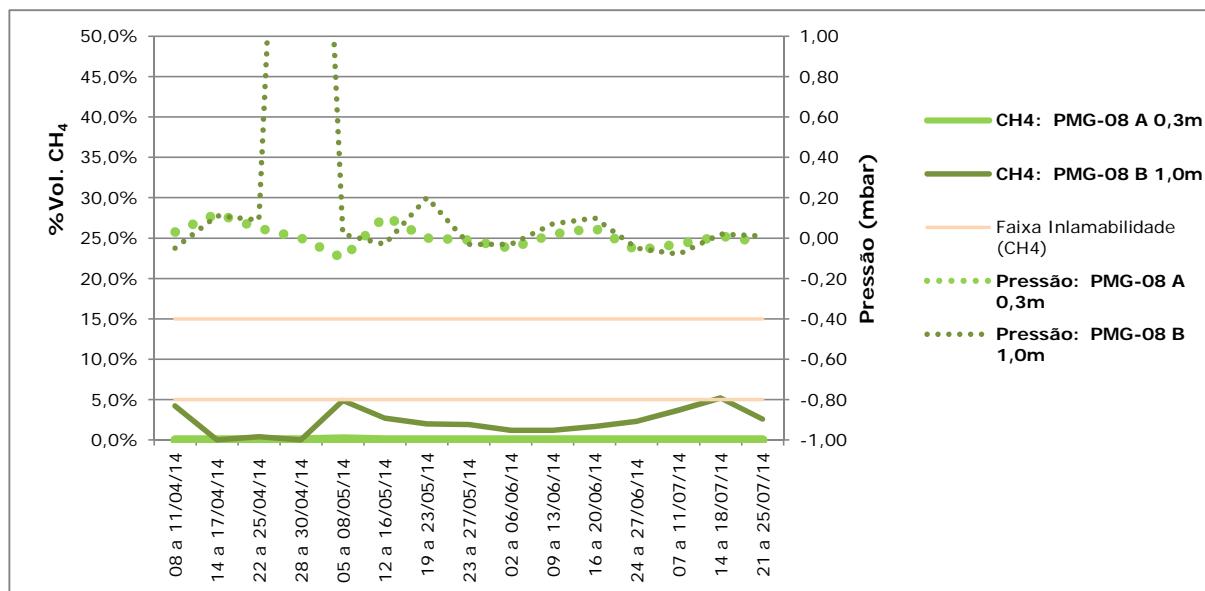Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)



Quantidade total de Poços:	14 Pares					
Período de Medição:	08 de Abril a 25 de Julho de 2014					
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	10 Pares	PMG-01	PMG-03	PMG-06	PMG-08	PMG-84
		PMG-02	PMG-05	PMG-07	PMG-09	PMG-85
Observações:	As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)					

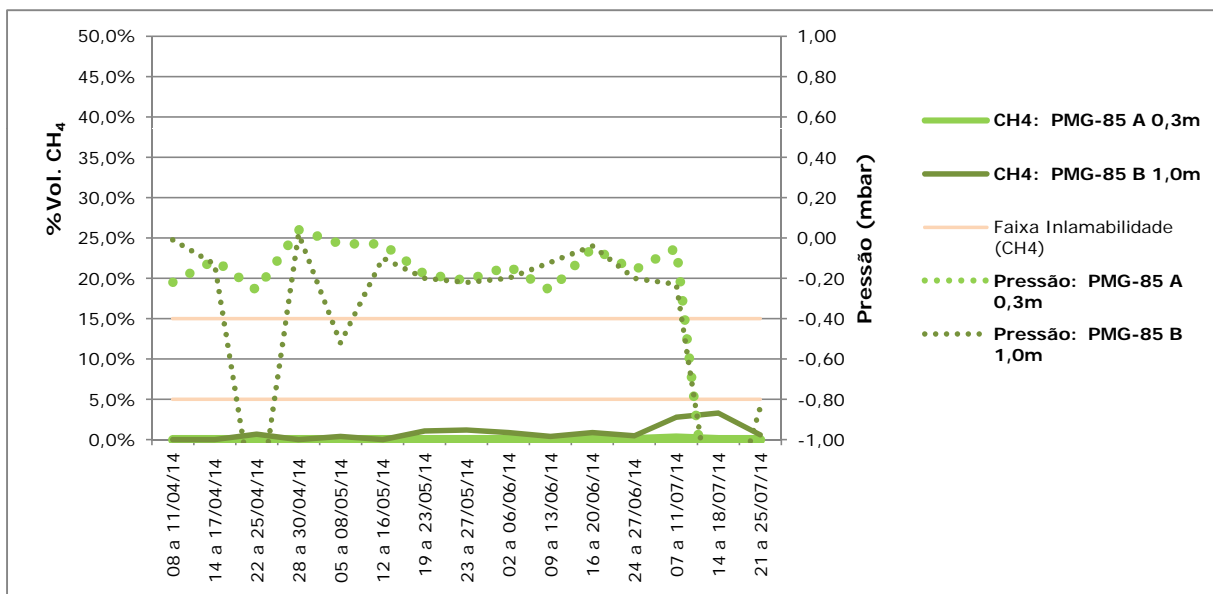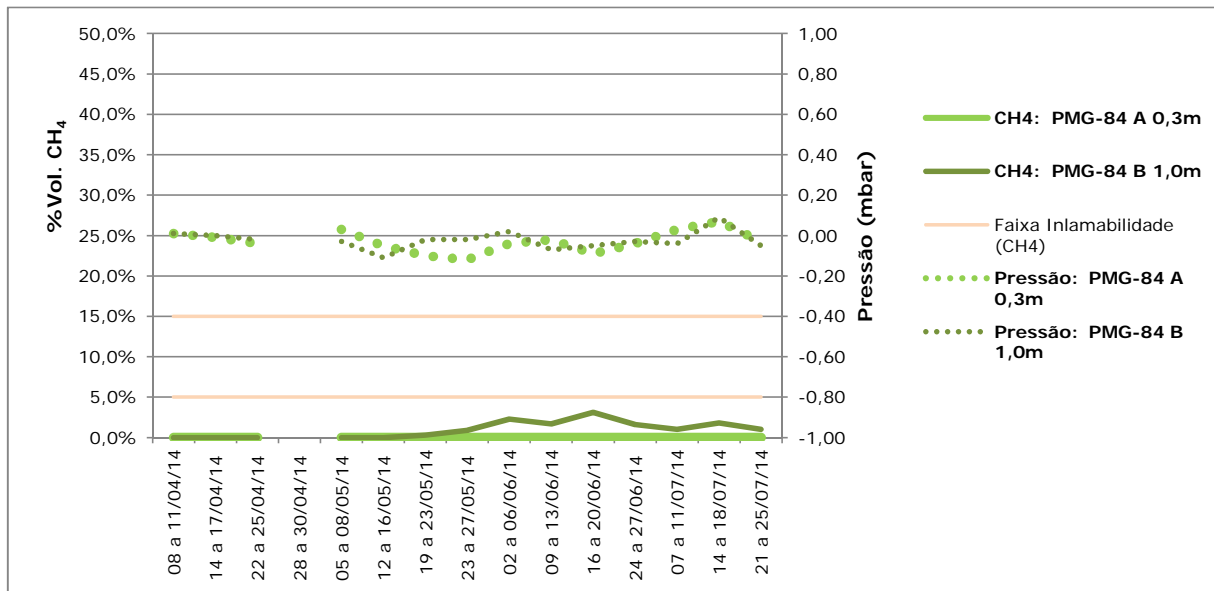

EDIFÍCIO I-4

Quantidade total de Poços:	12 Pares	
Período de Medição:	08 de Abril a 25 de Julho de 2014	
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	4 Pares	PMG-64 PMG-69 PMG-66 PMG-77

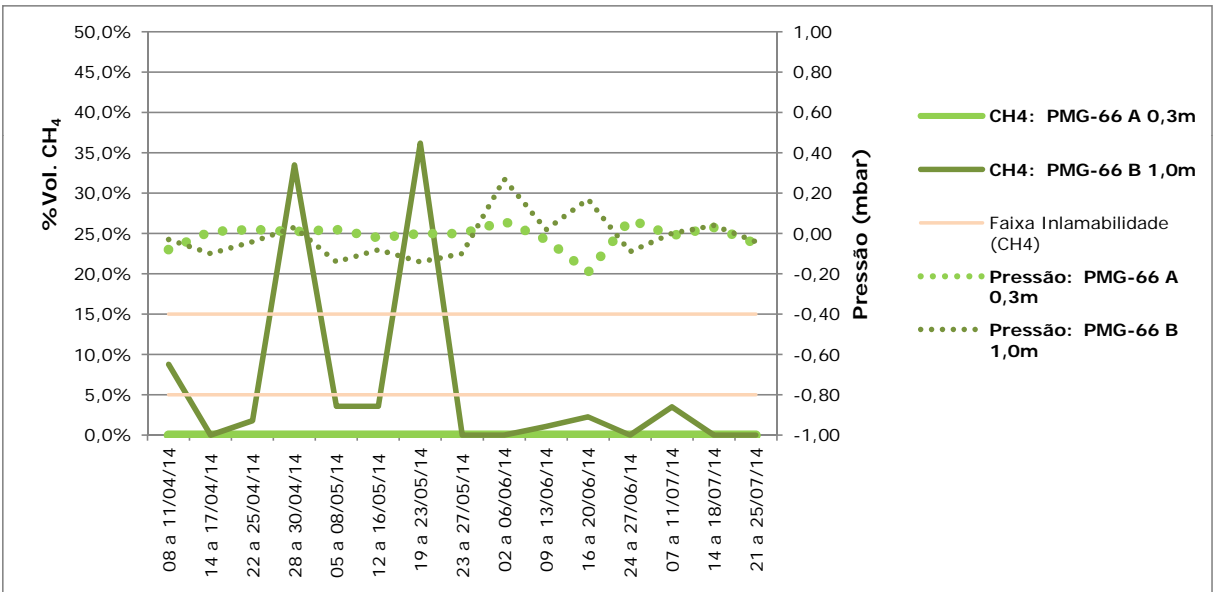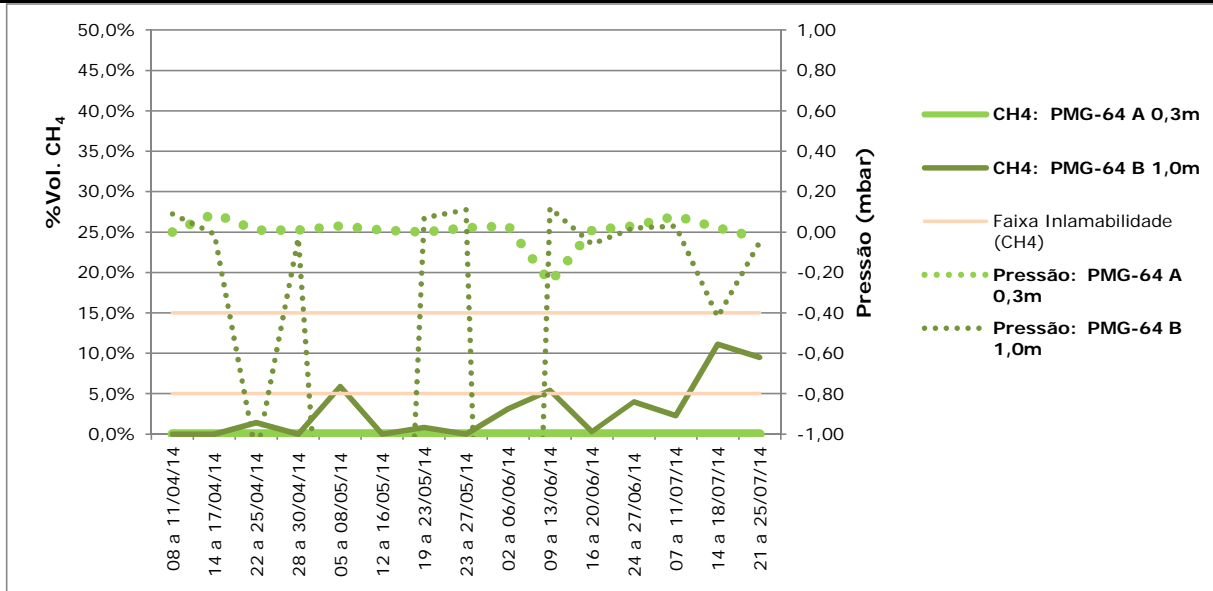Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)





EDIFÍCIO I-4

Quantidade total de Poços: 12 Pares

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 4 Pares PMG-64 PMG-69
PMG-66 PMG-77

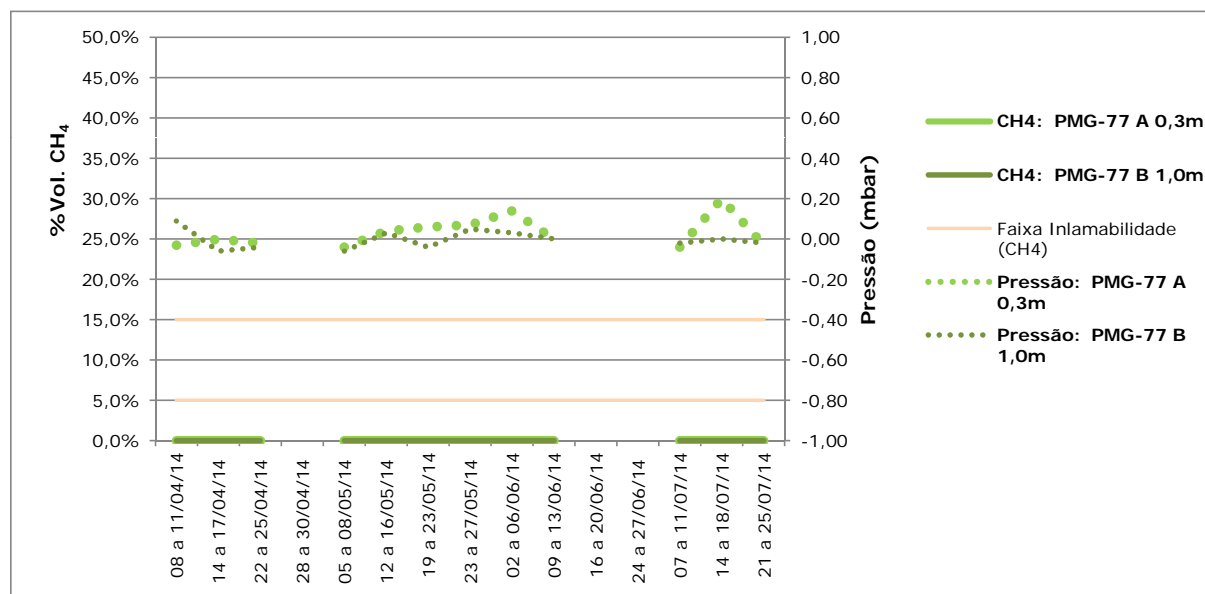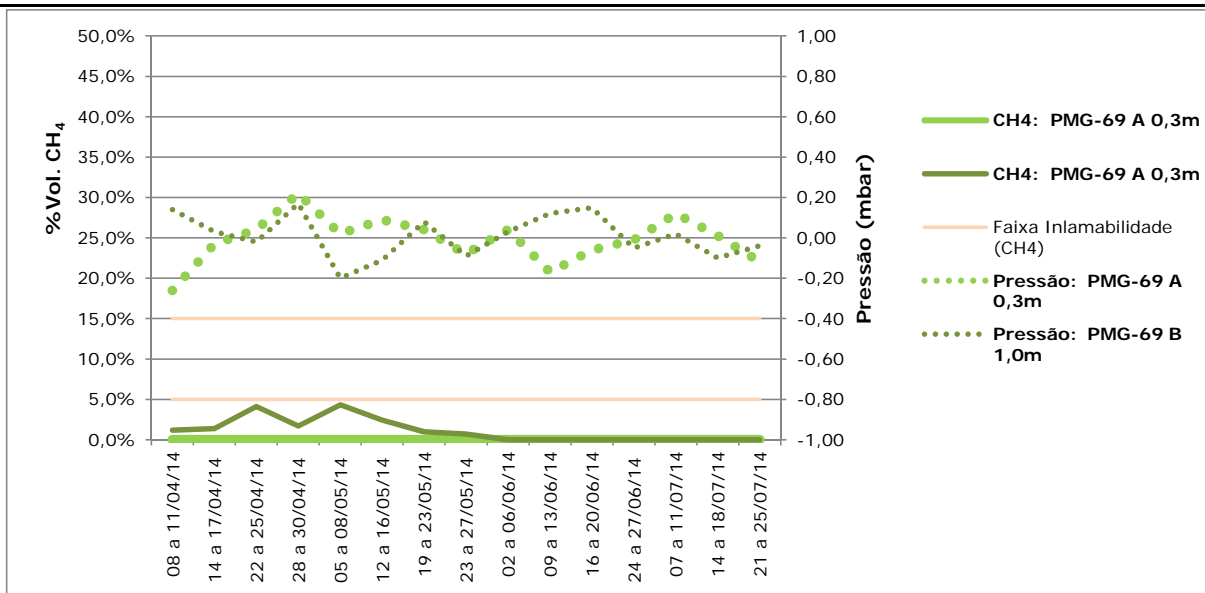Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)





ENFERMARIA

Quantidade total de Poços: 7 Pares

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 3 Pares PMG-72 PMG-75
PMG-74

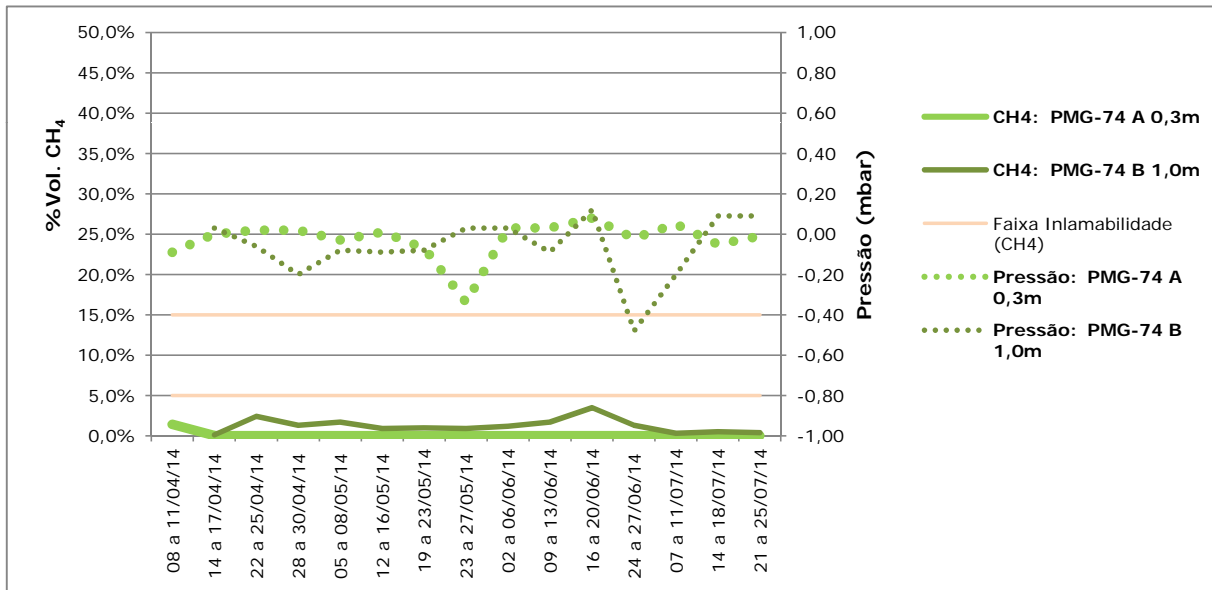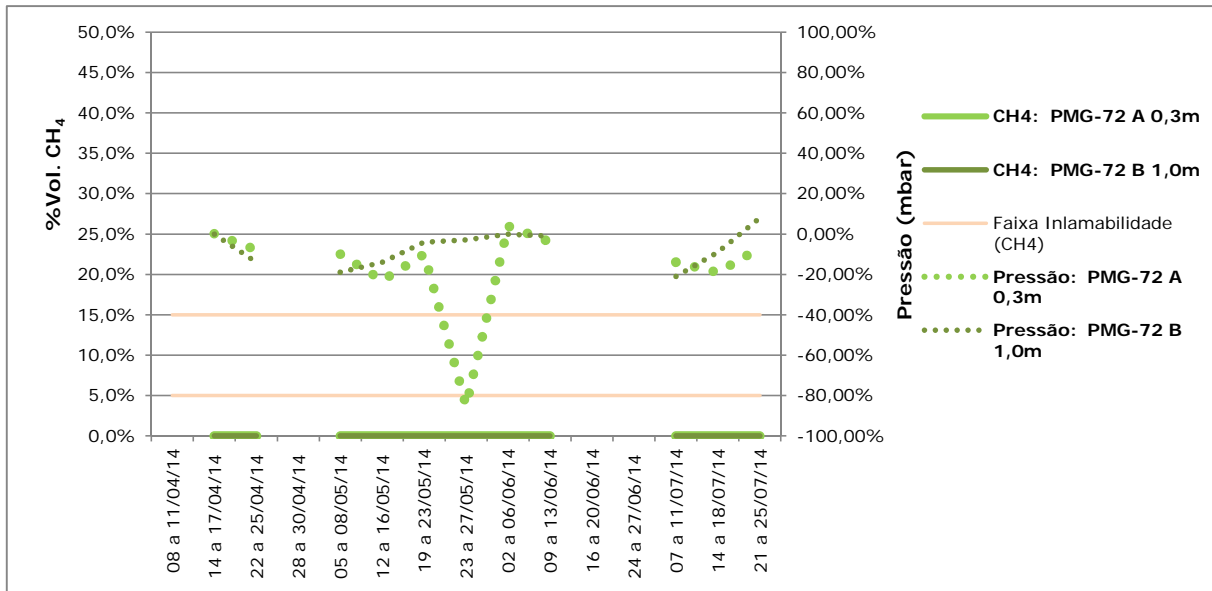Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)




ENFERMARIA

Quantidade total de Poços: 7 Pares

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 3 Pares PMG-72 PMG-75
PMG-74

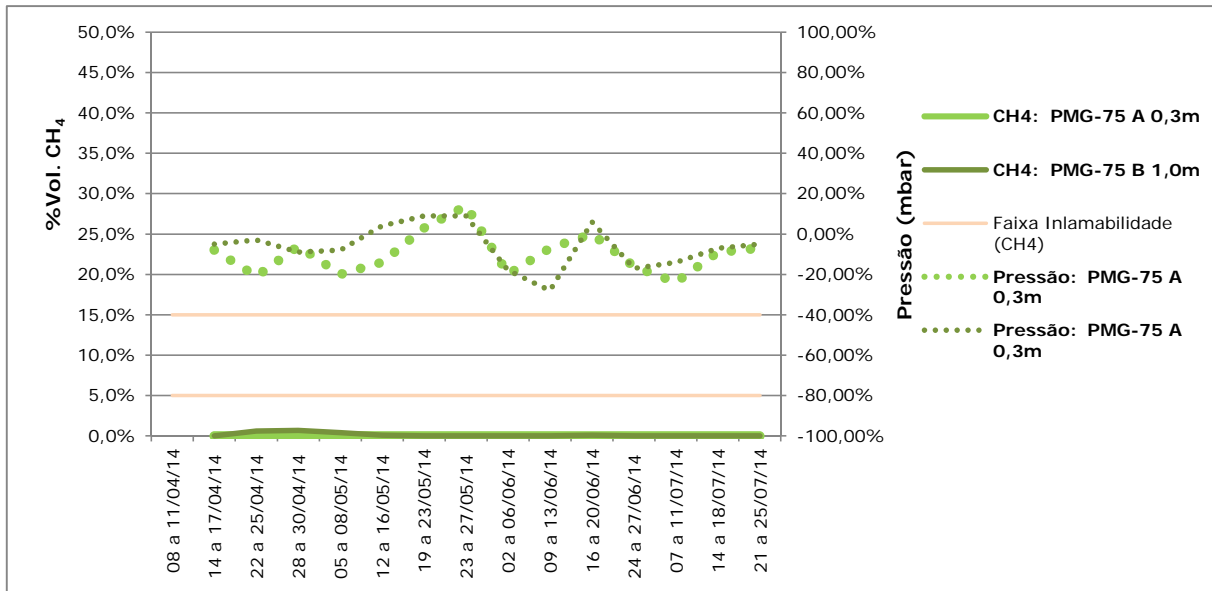Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



INCUBADORA

Quantidade total de Poços: 6 Pares

6 Pares

Período de Medição:

08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

6 Pares

PMG-82

PMG-94

PMG-96

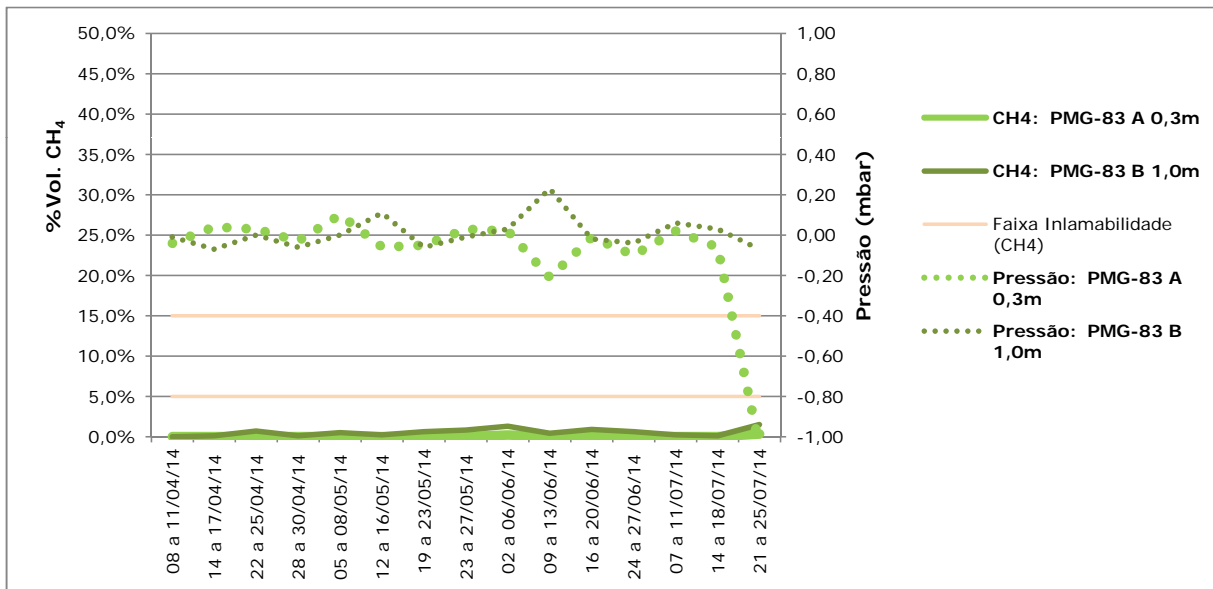
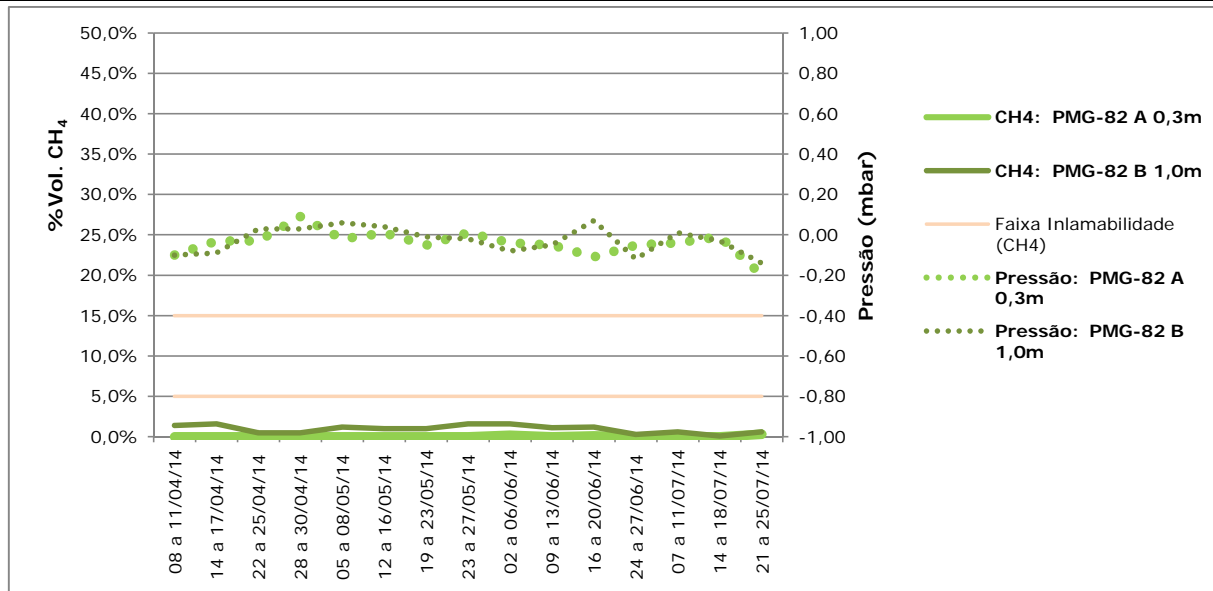
PMG-83

PMG-95

PMG-97

Observações:

As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



INCUBADORA

Quantidade total de Poços: 6 Pares

6 Pares

Período de Medição:

08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

6 Pares

PMG-82

PMG-94

PMG-96

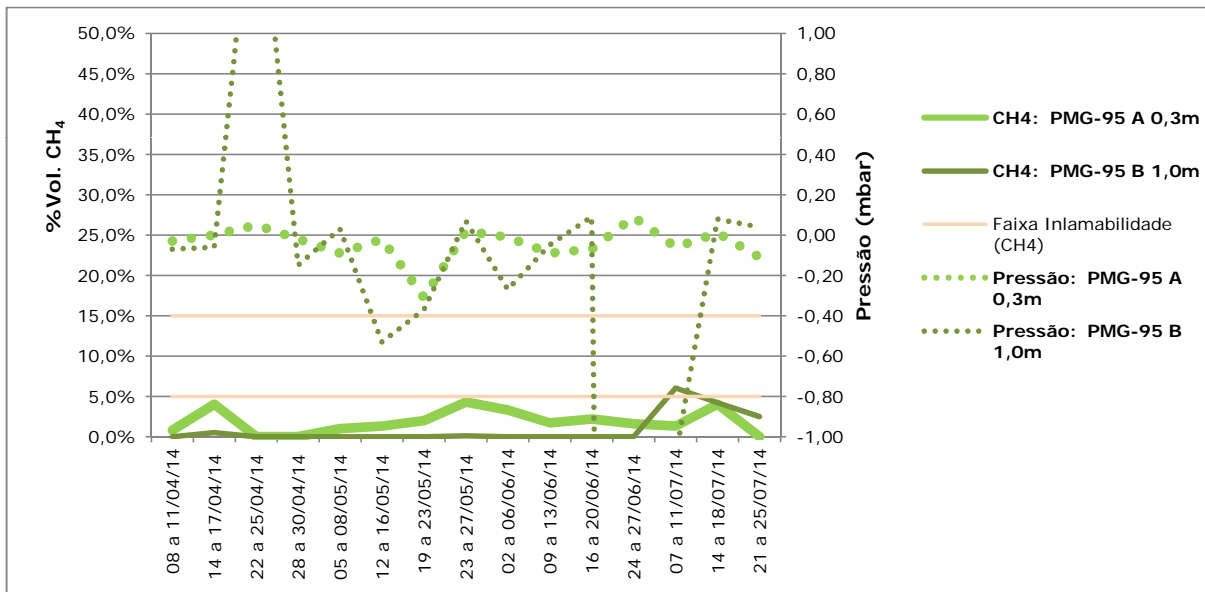
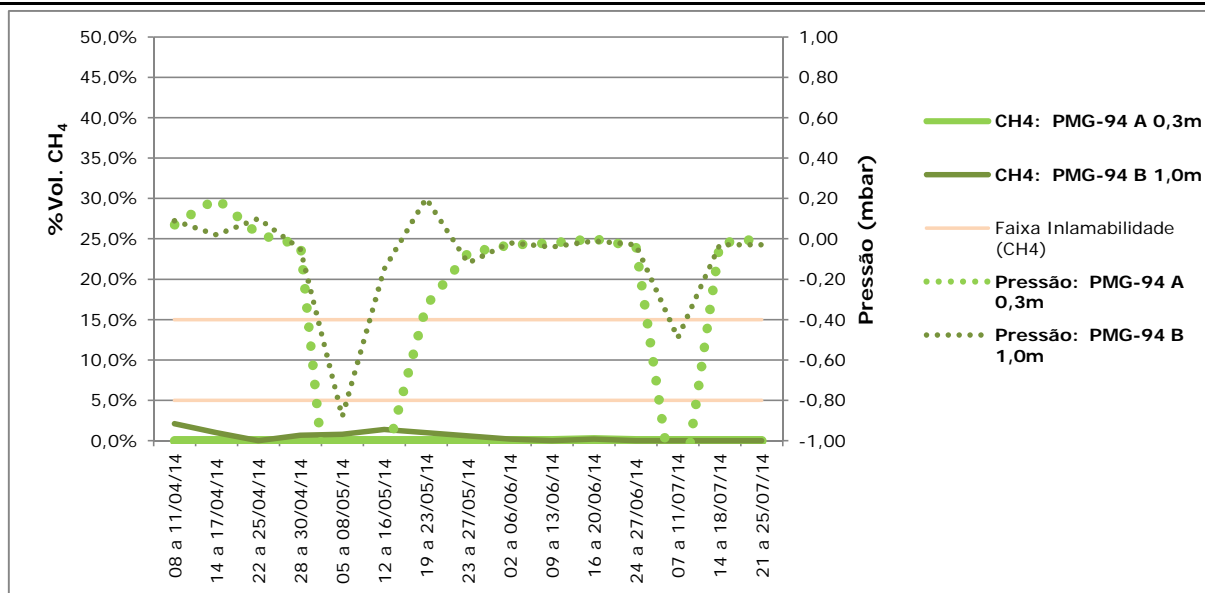
PMG-83

PMG-95

PMG-97

Observações:

As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



INCUBADORA

Quantidade total de Poços: 6 Pares

6 Pares

Período de Medição:

08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

6 Pares

PMG-82

PMG-94

PMG-96

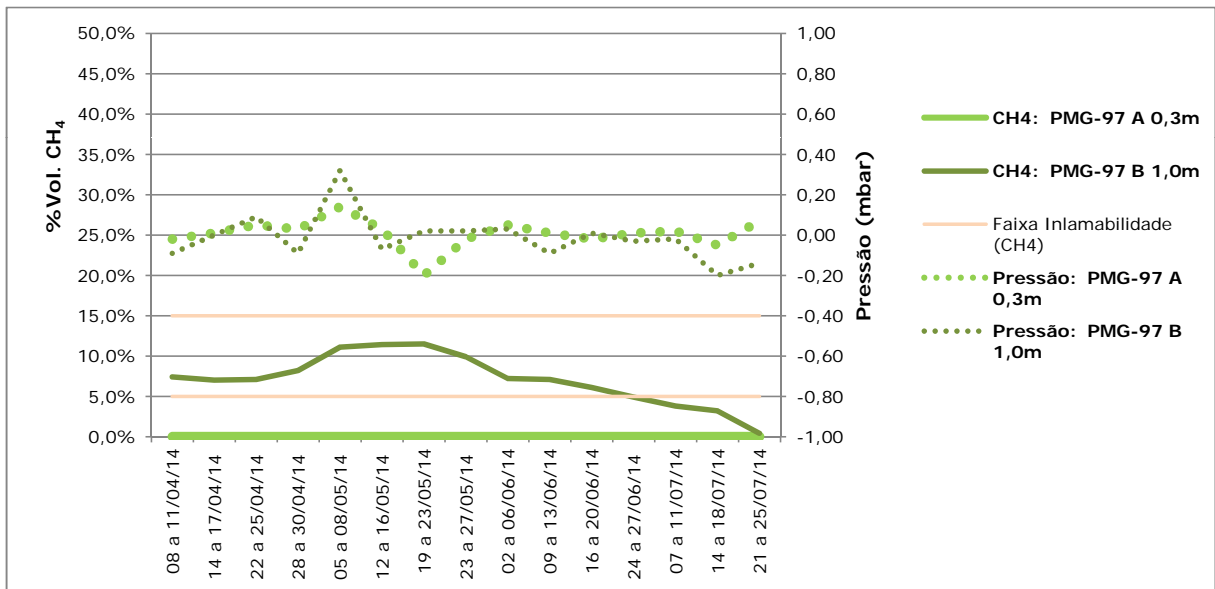
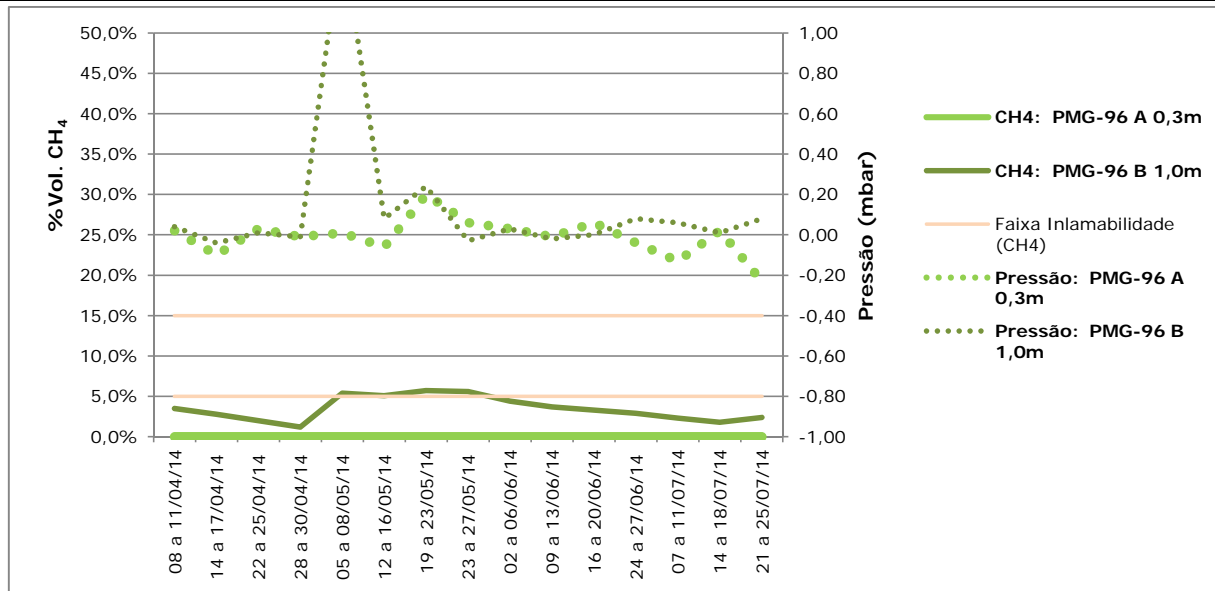
PMG-83

PMG-95

PMG-97

Observações:

As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)




GINÁSIO POLIESPORTIVO

Quantidade total de Poços: 11 Pares

Período de Medição: 08 de Abril a 25 de Julho de 2014

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 1 Par PMG-110

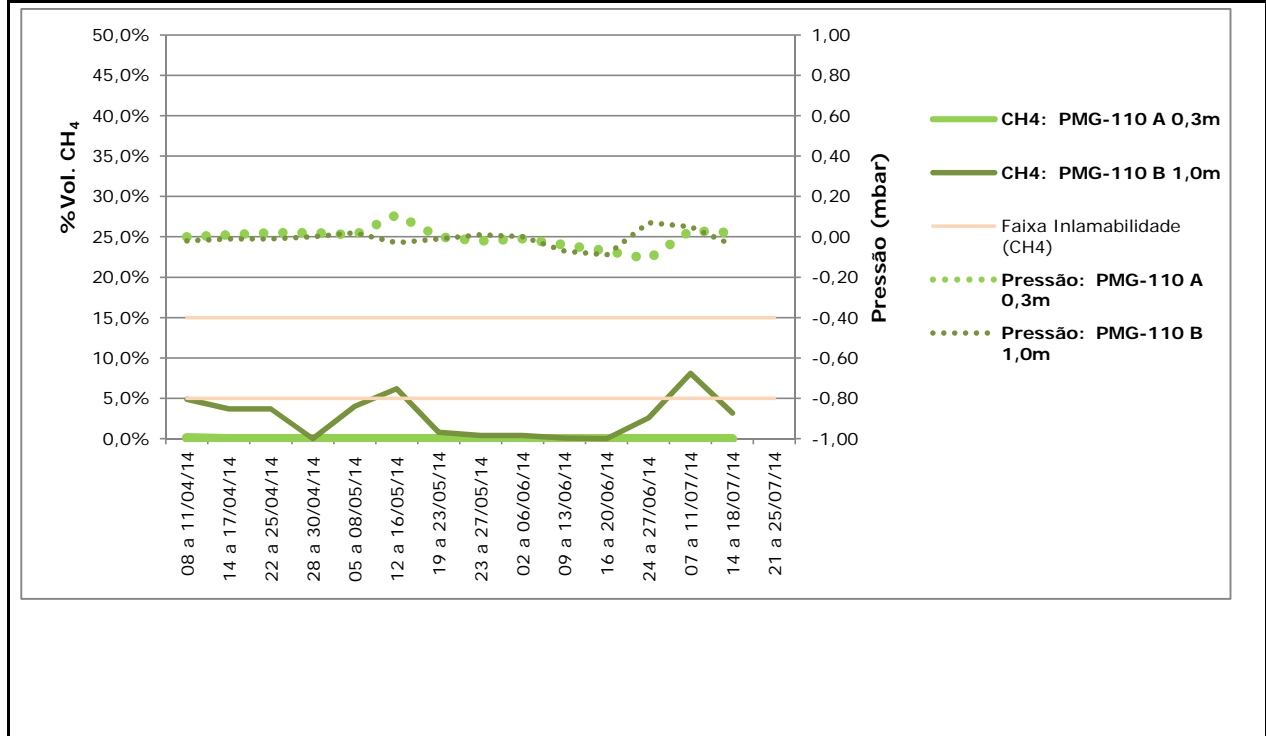Observações: As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



LARANJINHA

Quantidade total de Poços: 3 Pares

Período de Medição: Prédio Demolido

Área reservada para observações ou dados adicionais.
